



# COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

## PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI  
10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19  
AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO  
DI COHOUSING A PADOVA


**IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.350.000,00**

N° Progetto  Data <b>Novembre 2018</b>	CUP  LLPP EDP 2019/034	Elaborato  <b>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>	
CSP/CSE  Ing. Pierangelo Salvadego	Rup  Arch. Stefano Benvegnu'	Capo Settore  Ing. Massimo Benvenuti	

PRIMO SEMESTRE LAVORI

anno																																				
me	1						2						3						4						5						6					
settimana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
giorno																																				

N.	FASE	Durata presunta fase (gg)	Personale presunto (u)	u/gg
1	APPRESTAMENTI DI CANTIERE: Allestimento	7	5	35
2	PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI	12	4	48
3	SCAVI E MOVIMENTI TERRA	14	5	70
4	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, SVELLIMENTI	19	6	114
5	SOTTOFONDO ISOLANTE PIANO TERRA	2	4	8
6	PLATEA DI FONDAZIONE PORZIONE NUOVO FABBRICATO	4	4	16
7	STRUTTURE IN ELEVAZIONE NUOVO FABBRICATO	5	4	20
8	MURATURA PERIMETRALE NUOVO FABBRICATO	5	4	20
9	SOLAIO DI COPERTURA IN LEGNO PADIGLIONE	7	4	28
10	DIVISORI INTERNI IN LATERIZIO	6	4	24
11	ISOLAMENTI SU SUPERFICI ORIZZONTALI E SOTTOTETTO	2	3	6
12	IMPERMEABILIZZAZIONI	3	4	12
13	OPERE DA LATTONIERE	2	3	6
14	IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO GREZZO	13	4	52
15	IMPIANTI ELETTRICI GREZZO	14	4	56
16	POSA MANTO DI COPERTURA	6	3	18
17	ISOLAMENTI SU SUPERFICI VERTICALI INTERNE	3	3	9
18	ISOLAMENTO PERIMETRALE ESTERNO	3	4	12
19	STRUTTURE IN ACCIAIO	4	4	16
20	OPERE DA FABBRO	3	3	9
21	OPERE A SECCO IN GESSO RIVESTITO	4	4	16
22	REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI E MASSETTI	5	5	25
23	RESTAURI E TRATTAMENTI POSA SOGLIE E DAVANZALI	9	5	45
24	DAVANZALI	2	3	6
25	ASSISTENZE MURARIE	17	3	51
26	INTONACI INTERNI	10	3	30
27	POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	23	4	92
28	TINTEGGIATURE ESTERNE	10	4	40
29	TINTEGGIATURE INTERNE	15	4	60
30	SERRAMENTI PERIMETRALI ESTERNI	6	5	30
31	SERRAMENTI INTERNI	6	5	30
32	FINITURA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO	12	4	48
33	FINITURA IMPIANTI ELETTRICI	14	4	56
34	SOTTOSERVIZI	25	3	75
35	RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA	13	3	39
36	FOGNATURE	10	3	30
37	PAVIMENTAZIONI PERIMENTRALI ESTERNE	27	4	108
38	OPERE DA GIARDINIERE	10	6	60
39	ARREDI ESTERNI	2	3	6
40	APPRESTAMENTI DI CANTIERE: Smobilizzo	6	3	18

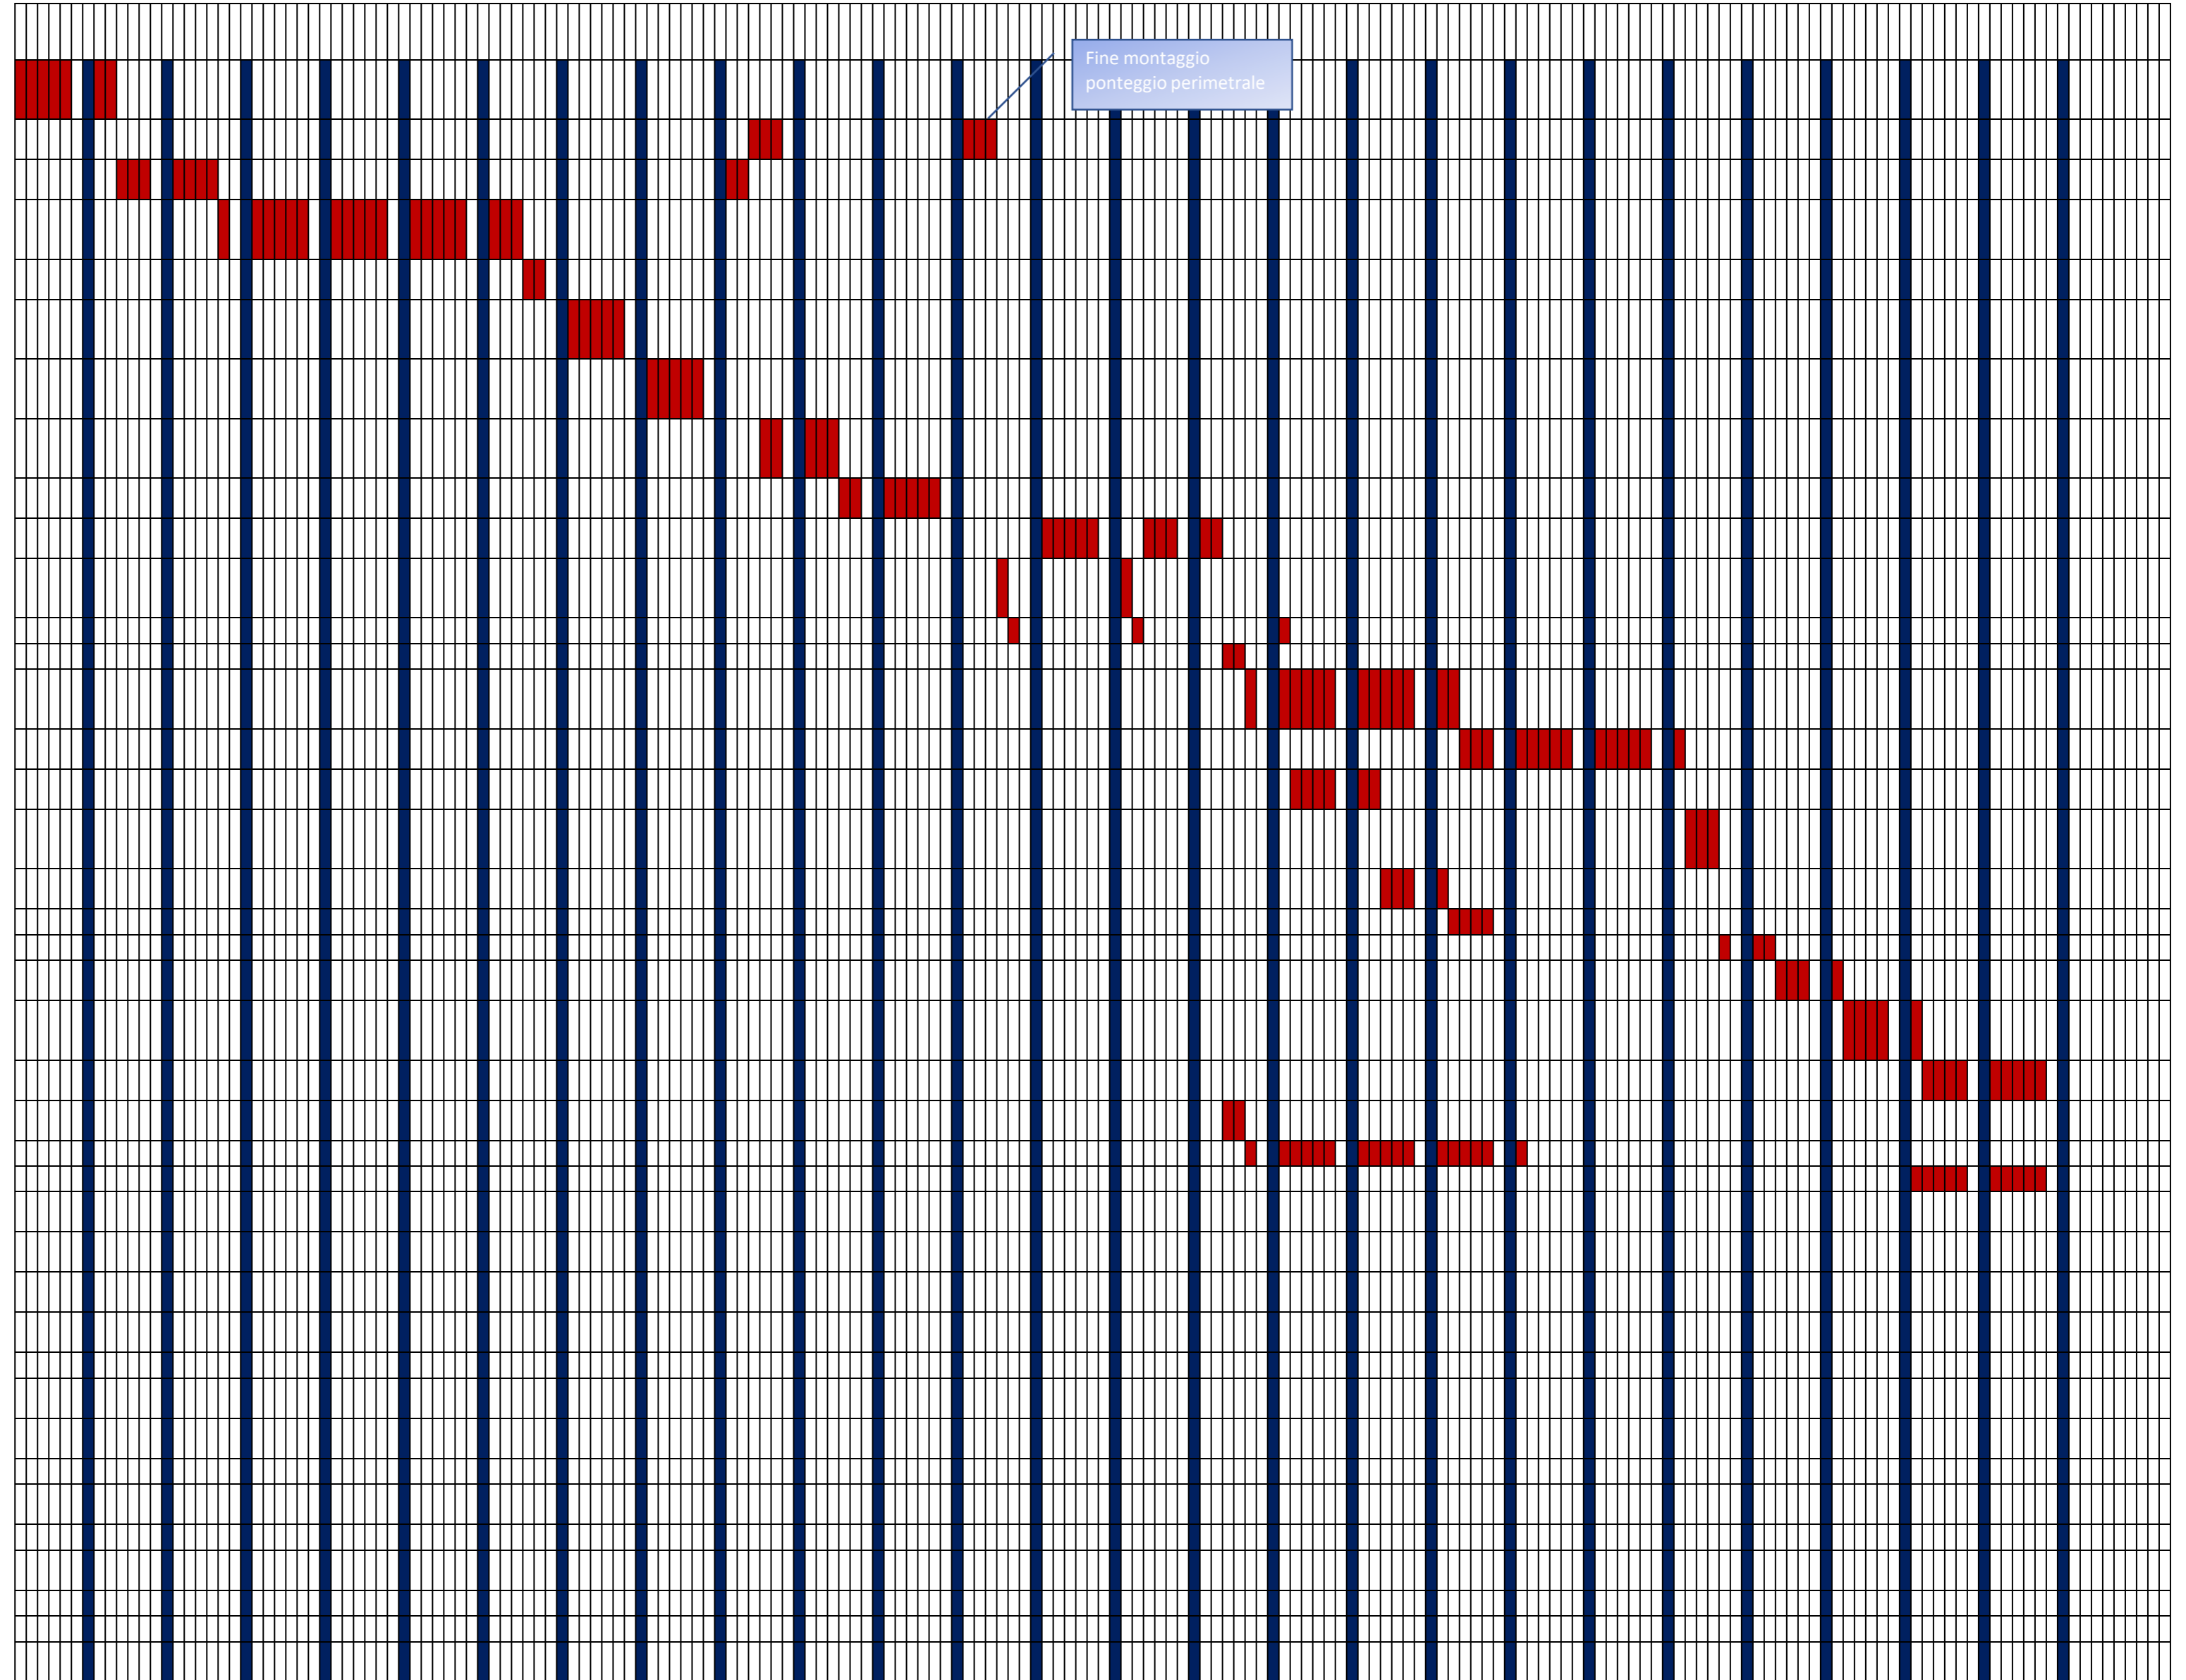

	360	1444
--	-----	------

DOMENICA


Sovrapposizione spaziale: Interno/esterno

Sovrapposizione spaziale: Interno/intern

SECONDO SEMESTRE LAVORI

anno																																								
mese	7							8							9							10							11						12					
settimana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52														
giorno																																								

N.	FASE	Durata presunta fase (gg)	Personale presunto (u)	u/gg
1	APPRESTAMENTI DI CANTIERE: Allestimento	7	5	35
2	PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI	12	4	48
3	SCAVI E MOVIMENTI TERRA	14	5	70
4	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, SVELLIMENTI	19	6	114
5	SOTTOFONDO ISOLANTE PIANO TERRA	2	4	8
6	PLATEA DI FONDAZIONE PORZIONE NUOVO FABBRICATO	4	4	16
7	STRUTTURE IN ELEVAZIONE NUOVO FABBRICATO	5	4	20
8	MURATURA PERIMETRALE NUOVO FABBRICATO	5	4	20
9	SOLAIO DI COPERTURA IN LEGNO PADIGLIONE	7	4	28
10	DIVISORI INTERNI IN LATERIZIO	6	4	24
11	ISOLAMENTI SU SUPERFICI ORIZZONTALI E SOTTOTETTO	2	3	6
12	IMPERMEABILIZZAZIONI	3	4	12
13	OPERE DA LATTONIERE	2	3	6
14	IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO GREZZO	13	4	52
15	IMPIANTI ELETTRICI GREZZO	14	4	56
16	POSA MANTO DI COPERTURA	6	3	18
17	ISOLAMENTI SU SUPERFICI VERTICALI INTERNE	3	3	9
18	ISOLAMENTO PERIMETRALE ESTERNO	3	4	12
19	STRUTTURE IN ACCIAIO	4	4	16
20	OPERE DA FABBRO	3	3	9
21	OPERE A SECCO IN GESSO RIVESTITO	4	4	16
22	REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI E MASSETTI	5	5	25
23	RESTAURI E TRATTAMENTI	9	5	45
24	POSA SOGLIE E DAVANZALI	2	3	6
25	ASSISTENZE MURARIE	17	3	51
26	INTONACI INTERNI	10	3	30
27	POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	23	4	92
28	TINTEGGIATURE ESTERNE	10	4	40
29	TINTEGGIATURE INTERNE	15	4	60
30	SERRAMENTI PERIMETRALI ESTERNI	6	5	30
31	SERRAMENTI INTERNI	6	5	30
32	FINITURA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO	12	4	48
33	FINITURA IMPIANTI ELETTRICI	14	4	56
34	SOTTOSERVIZI	25	3	75
35	RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA	13	3	39
36	FOGNATURE	10	3	30
37	PAVIMENTAZIONI PERIMENTRALI ESTERNE	27	4	108
38	OPERE DA GIARDINIERE	10	6	60
39	ARREDI ESTERNI	2	3	6
40	APPRESTAMENTI DI CANTIERE: Smobilizzo	6	3	18
		360		1444

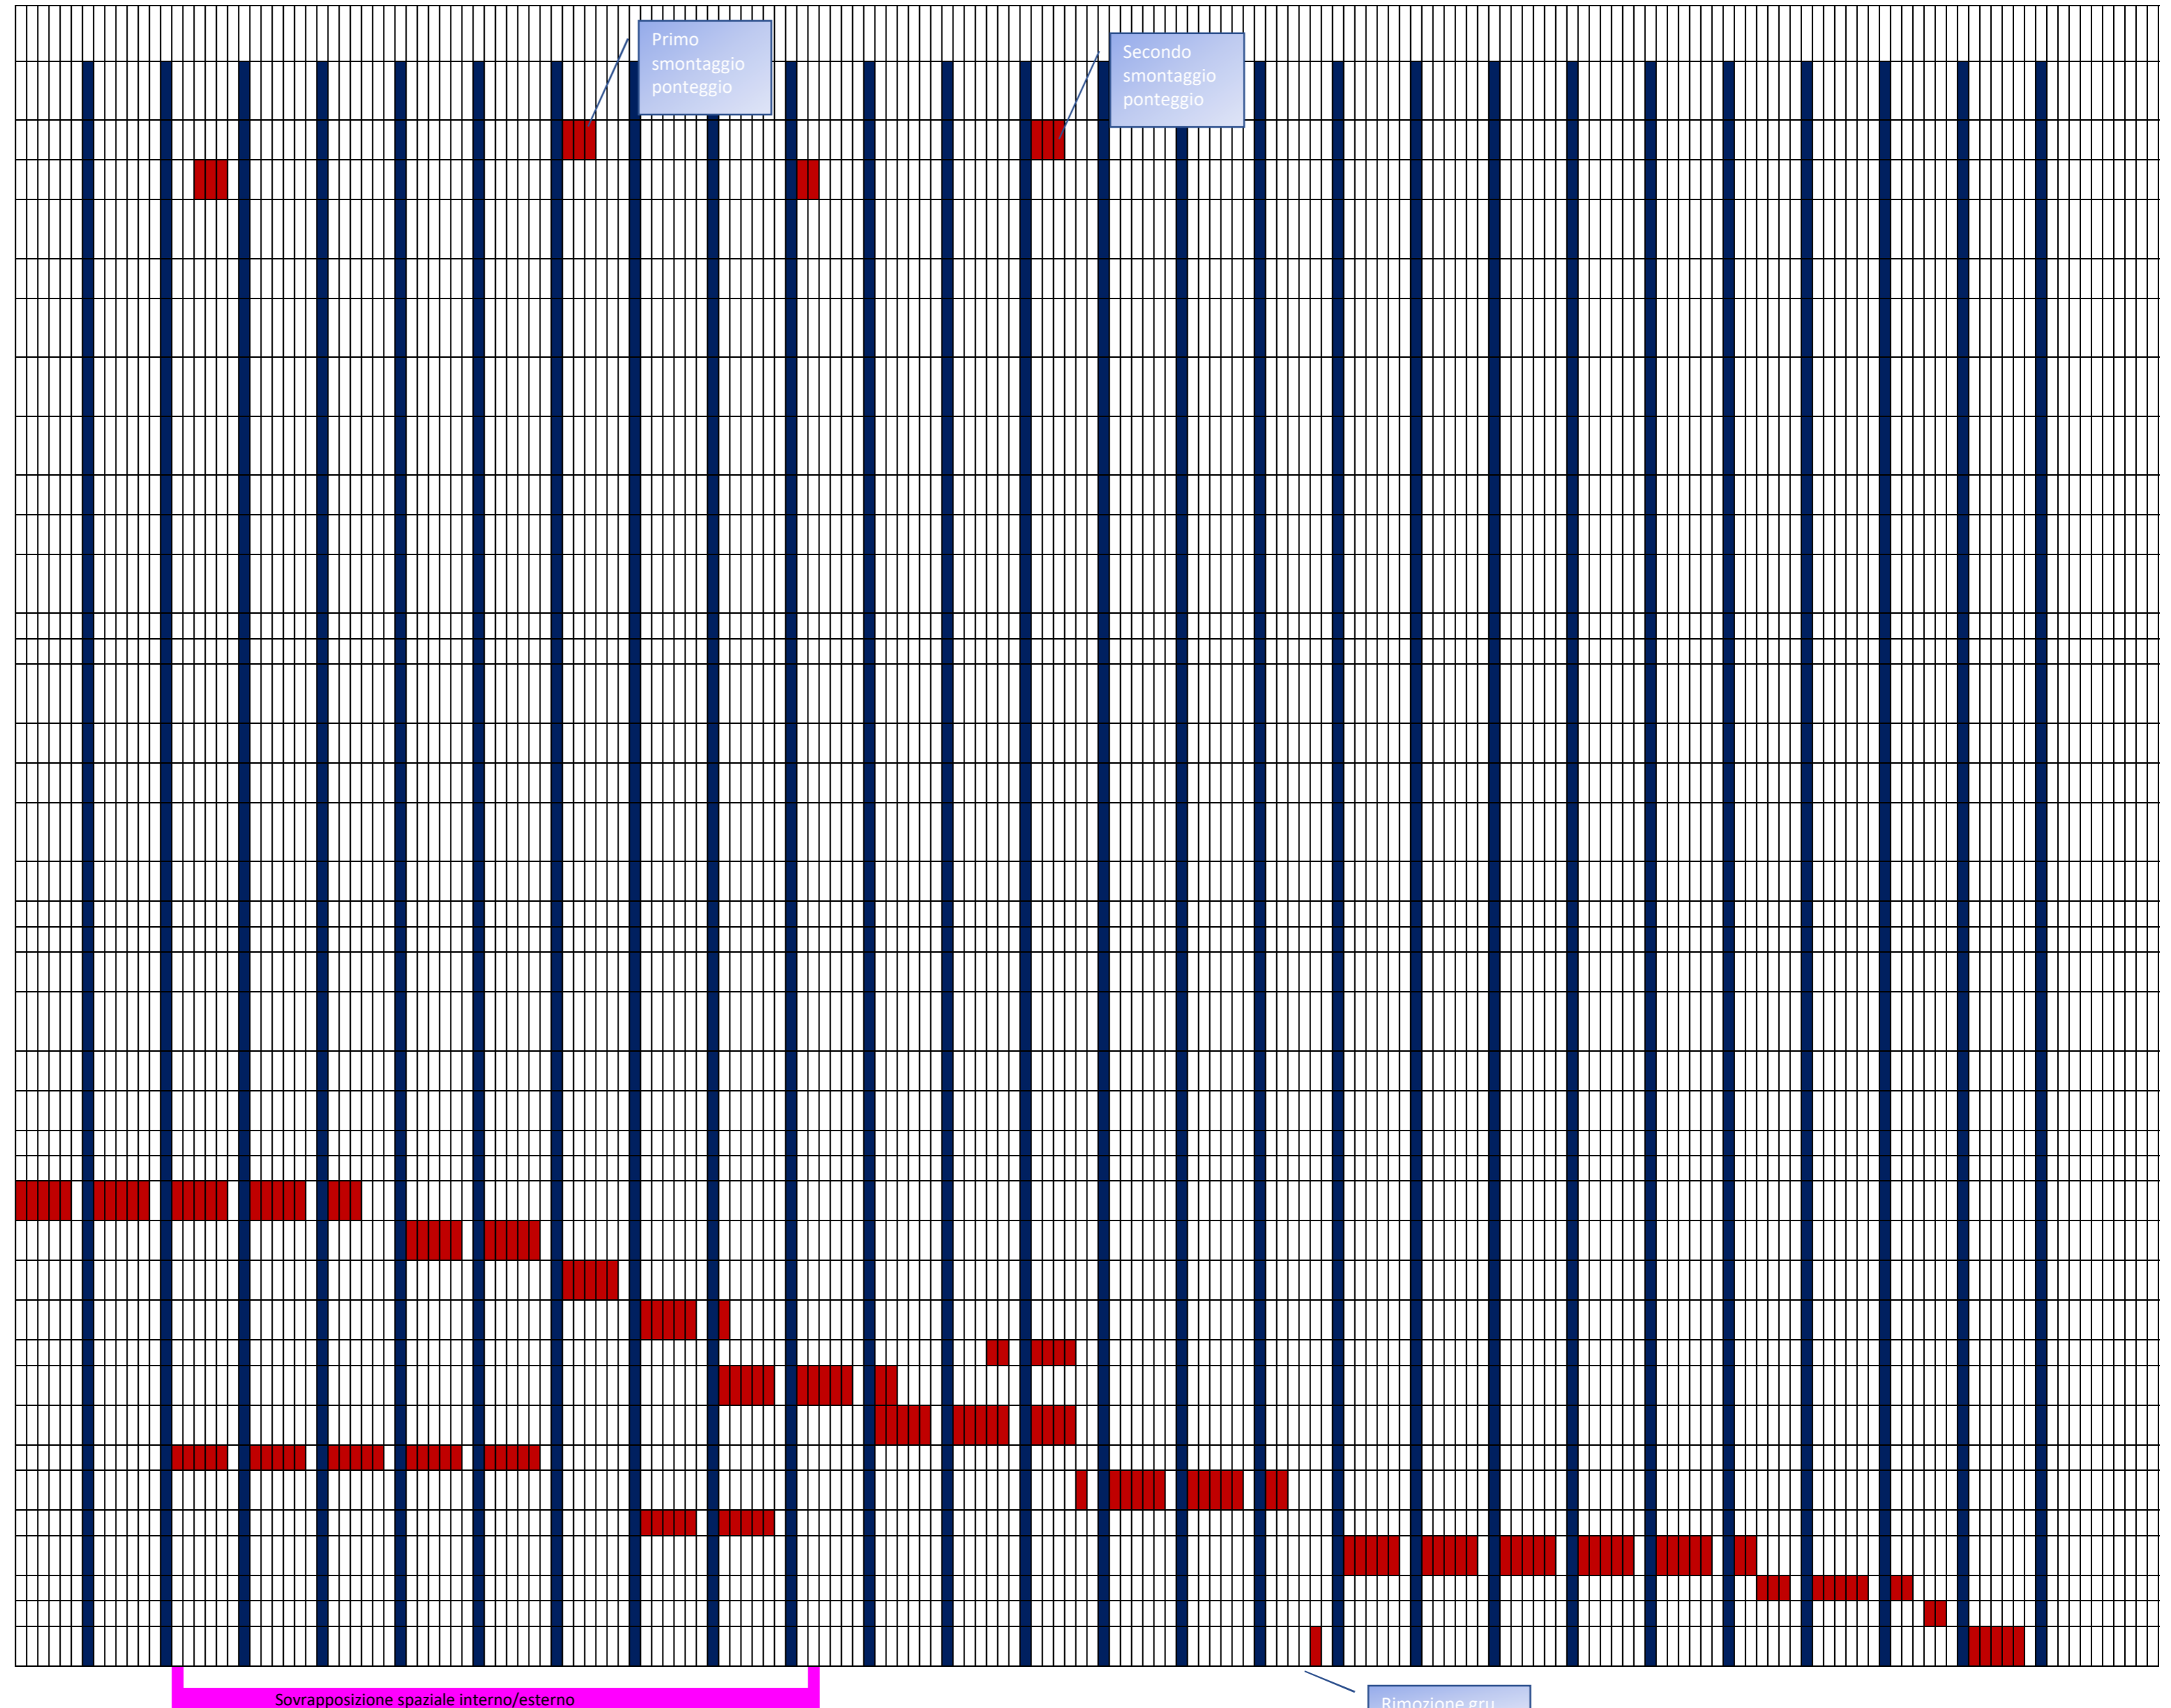

DOMENICA
