Comune di Padova

Allegato n. 2 al DUP 2025 - 2027

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

AL 09/06/2024

INDICE

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI al 09/06/2024

Allegato del DUP 2025 - 2027

	Pag.
Premessa	3
1. RISORSE FINANZIARIE	5
Entrate correnti	7
Spese correnti	9
Spese correnti per Missione	11
Spese correnti per Programma	15
Entrate da investimenti	20
Spese per investimenti	21
2. LAVORI PUBBLICI	26
Opere finanziate nell'ambito del PNRR	27
Opere finanziate nell'anno 2023 e precedenti	35
Opere finanziate nell'anno 2024	38
Schede per il monitoraggio delle opere pubbliche	40

PREMESSA

Il principio contabile applicato alla programmazione afferma che l'elaborazione del Documento Unico di Programmazione da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno, presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi e pertanto raccomanda di presentare, contestualmente al DUP, anche l'esito di tale controllo.

Questa operazione viene effettuata nel Comune di Padova mediante l'applicazione di quanto previsto dal proprio Regolamento sui Controlli Interni, vale a dire la verifica di: obiettivi, reperimento e impiego delle risorse programmate e realizzazione delle opere pubbliche.

Nelle pagine successive, pertanto, vengono riportati i risultati di detta verifica in termini di:
- grado di raggiungimento degli obiettivi di performance relativi al 2024;
- grado di utilizzo delle risorse finanziarie stanziate con il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- stato di realizzazione dei lavori pubblici finanziati;

La data di riferimento è il **09 giugno 2024**, concomitante con quella per la verifica degli equilibri di bilancio.

Riguardo al monitoraggio degli obiettivi programmati, la verifica sul loro andamento è stata effettuata attraverso il sistema del controllo di gestione vigente.
Questo sistema, stabilito dal Regolamento sui Controlli Interni citato in precedenza, "fotografa" in un preciso momento lo stato di realizzo degli obiettivi assegnati ad ogni Settore dell'Ente con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO – Sottosezione Performance), approvato con delibera G.C. n. 48 del 30/01/2024. Essi consistono nella declinazione di indirizzi e obiettivi, secondo questo schema:

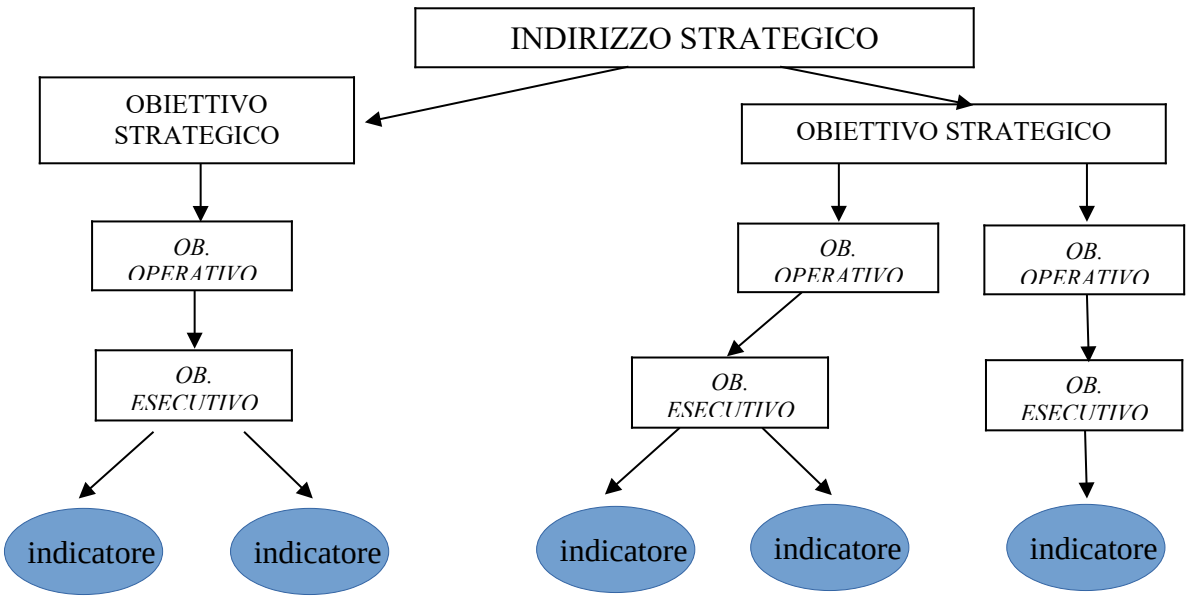

Ciascun obiettivo operativo è collegato ad un obiettivo esecutivo, che viene misurato da un indicatore, che esprime, secondo l'unità di misura più appropriata, un valore idoneo a dimostrare il suo stato di realizzo rispetto al valore atteso determinato a preventivo.

Con il DUP – Sezione Operativa 2024-2026 sono stati individuati complessivamente 148 obiettivi operativi, dai quali discendono 219 obiettivi esecutivi assegnati alle strutture organizzative con il PIAO – Sottosezione Performance 2024-2026, misurati da 427 indicatori di risultato e da 202 indicatori statistici.

Al report del 09 giugno 2024, i programmi risultano realizzati complessivamente per il 50,87%, calcolato sul raggiungimento degli obiettivi esecutivi.
Questo risultato comprende:

% di risultato	**<20**	**da 20 a 39,99**	**da 40 a 59,99**	**da 60 a 79,99**	**da 80 a 99,99**	**100%**
N° obiettivi esecutivi	96	16	28	22	14	43

Si rileva che questo risultato è misurato da:
- n. 135 indicatori che hanno un valore atteso fissato per la seconda parte dell'anno e che quindi nel report di giugno registrano un valore di raggiungimento pari a zero;
- n. 57 indicatori che hanno già completamente raggiunto il valore atteso;
- i restanti 235 indicatori corrispondono a obiettivi che sono in corso di realizzazione.

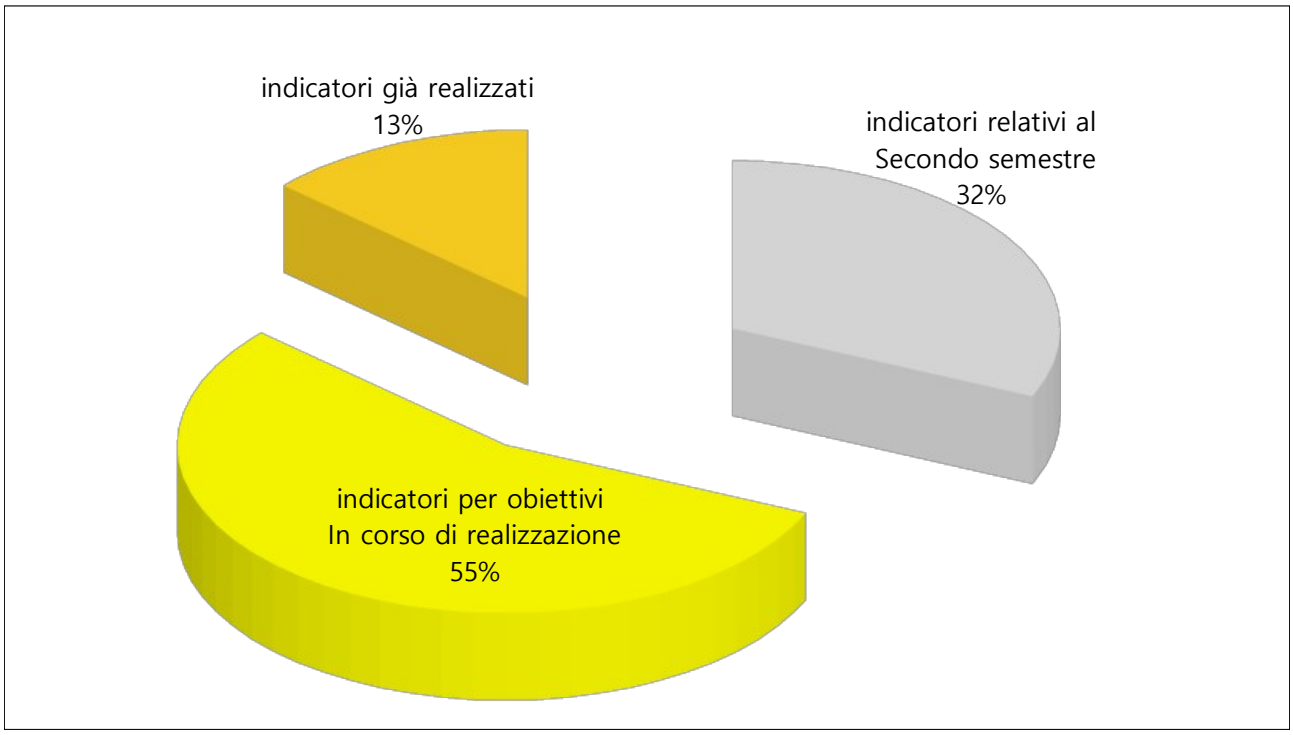

GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'analisi "fotografa" il grado di realizzo delle entrate e delle spese al 09/06/2024, effettuata ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio. Per le entrate, l'analisi non considera il fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese esigibili nel 2024 e, per le spese, le prenotazioni di spesa e la quota di fondo pluriennale vincolato che finanzia le spese esigibili negli anni futuri. L'esame rappresenta la situazione seguente:

- dalla data di approvazione del bilancio, gli stanziamenti previsti per il 2024, sono aumentati sia per le entrate correnti che per le spese correnti, rispettivamente del 2,4% e del 15,3%. La previsione di entrate per investimenti è aumentata del 19,8%, per le spese d'investimento è aumentata del 62%. Ciò è dovuto, da un lato alle operazioni legate al Rendiconto 2023 di riaccertamento dei residui e conseguente reimputazione di impegni 2023 al 2024 in base al principio di competenza finanziaria potenziata, dall'altro all'incremento nei documenti di programmazione di opere pubbliche a seguito della previsione di nuovi finanziamenti pubblici e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione.
- le **entrate correnti** risultano complessivamente accertate per il 40%: le tributarie per il 24,2%, i trasferimenti correnti per il 49,4%, mentre le extratributarie per il 69,2%. Gli accertamenti correnti provengono per il 35% dalle entrate tributarie, per il 42% dalle entrate extratributarie e per il restante 23% dai trasferimenti. In complesso la situazione corrente al 09/06/2024 denota un'autonomia finanziaria del 77%.
- le **spese correnti** sono complessivamente impegnate per il 44,8%, costituito per il 59,6% da acquisto di beni e servizi e per il 24,2% dal costo del personale. Le spese "libere", vale a dire non direttamente vincolate ad una specifica entrata, sono state impegnate per il 47,7%, mentre quelle vincolate per il 41,8%. Vengono considerate "vincolate", oltre a quelle collegate ad una specifica entrata, anche le spese impegnate negli anni precedenti e "reimputate" al 2024 in quanto esigibili in corso d'anno. Le spese finanziate con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, invece, sono considerate prive di vincolo. Tra le spese libere gli impegni più consistenti riguardano i programmi relativi al sociale (27,5%), ai servizi generali di funzionamento (27,2%), all'istruzione (12,5%), alla tutela della sicurezza (11,5%) e alla mobilità (6,6%). Tra quelle a carattere vincolato, il 26% è stato destinato al sociale. Il 22,3% è costituito dal servizio di raccolta/smaltimento rifiuti seguito dal servizio mobilità e trasporti con il 21,1%.
- le **entrate in conto capitale** accertate sono il 40% della previsione assestata ed ammontano a € 112.585.701,87, di cui il 93% provenienti da contributi pubblici.
- le **spese per investimenti** registrano impegni per € 176.131.969,75 (pari al 47% della previsione assestata), la maggior parte dei quali destinati per oltre il 60% alle opere pubbliche; inoltre, la maggior parte delle somme impegnate (il 54,4%) proviene da somme impegnate negli anni precedenti e reimputate al 2024, in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata.

Nelle pagine seguenti vengono riportati grafici e tabelle che evidenziano lo stato di attuazione dei programmi sotto l'aspetto finanziario, alla data del 09/06/2024.

TRIENNIO 2024 - 2025 – 2026
SITUAZIONE AL 09/06/2024

ENTRATE CORRENTI (tit. 1°, 2°, 3°)								
2024			2025			2026		
previsione assestata	accertato	%	previsione assestata	accertato	%	previsione assestata	accertato	%
311.630.486,40	123.540.328,29	39,64	303.413.557,24	3.797.607,62	1,25	298.818.743,78	37.218,50	0,01

SPESE CORRENTI (tit. 1°)								
2024			2025			2026		
previsione assestata	impegnato	%	previsione assestata	impegnato	%	previsione assestata	impegnato	%
351.175.188,50	157.427.021,87	44,83	298.490.376,25	13.094.765,65	4,39	292.998.124,82	1.651.993,86	0,56

ENTRATE C/INVESTIMENTI (tit. 4°, 5°, 6°)								
2024			2025			2026		
previsione assestata	accertato	%	previsione assestata	accertato	%	previsione assestata	accertato	%
278.774.650,58	112.585.701,87	40,39	164.527.573,43	8.680.424,39	5,28	121.568.415,69	260.786,49	0,21

SPESE PER INVESTIMENTI (tit. 2°, 3°)								
2024			2025			2026		
previsione assestata	impegnato	%	previsione assestata	impegnato	%	previsione assestata	impegnato	%
375.050.735,30	176.131.969,75	46,96	167.962.067,81	6.991.877,60	4,16	127.671.553,19	43.200,00	0,03

Per la parte ENTRATE non è compreso il fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili nel 2024
Per la parte SPESE non sono compresi le prenotazioni di spesa ed il fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili negli anni futuri

Entrate correnti (TITOLI 1°, 2°, 3°) al 09/06/2024

	Descrizione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertamenti	*% accertato*
E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati	161.202.354,00	161.672.354,00	25.372.679,57	*15,69*
E.1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	16.045.300,00	18.092.513,28	18.091.977,72	*100,00*
TOTALE TITOLO 1°		**177.247.654,00**	**179.764.867,28**	**43.464.657,29**	***24,18***
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	46.636.596,12	51.009.041,23	27.393.780,29	53,70
E.2.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	15.000,00	15.000,00	899,97	6,00
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	2.515.000,00	2.515.000,00	160.752,89	6,39
E.2.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.795.000,00	2.815.000,00	362.537,58	12,88
E.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	186.250,00	327.572,65	96.685,40	29,52
TOTALE TITOLO 2°		**52.147.846,12**	**56.681.613,88**	**28.014.656,13**	***49,42***
E.3.01.01	Vendita di beni	420.000,00	420.000,00	215.671,34	51,35
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	17.044.250,00	17.139.250,00	8.701.623,06	50,77
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.182.711,00	16.277.711,00	8.308.616,76	51,04
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	29.869.824,00	29.869.824,00	32.353.091,17	108,31
E.3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	20.000,00	20.000,00	-	-
E.3.03.03	Altri interessi attivi	51.000,00	51.000,00	54.600,51	107,06
E.3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-
E.3.05.01	Indennizzi di assicurazione	120.000,00	125.000,00	34.482,39	27,59
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	2.245.620,24	2.257.620,24	1.182.614,80	52,38
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	3.523.600,00	3.523.600,00	1.210.314,84	34,35
TOTALE TITOLO 3°		**74.977.005,24**	**75.184.005,24**	**52.061.014,87**	***69,24***
TOTALE ENTRATE CORRENTI		**304.372.505,36**	**311.630.486,40**	**123.540.328,29**	***39,64***

Escluso fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili nel 2024

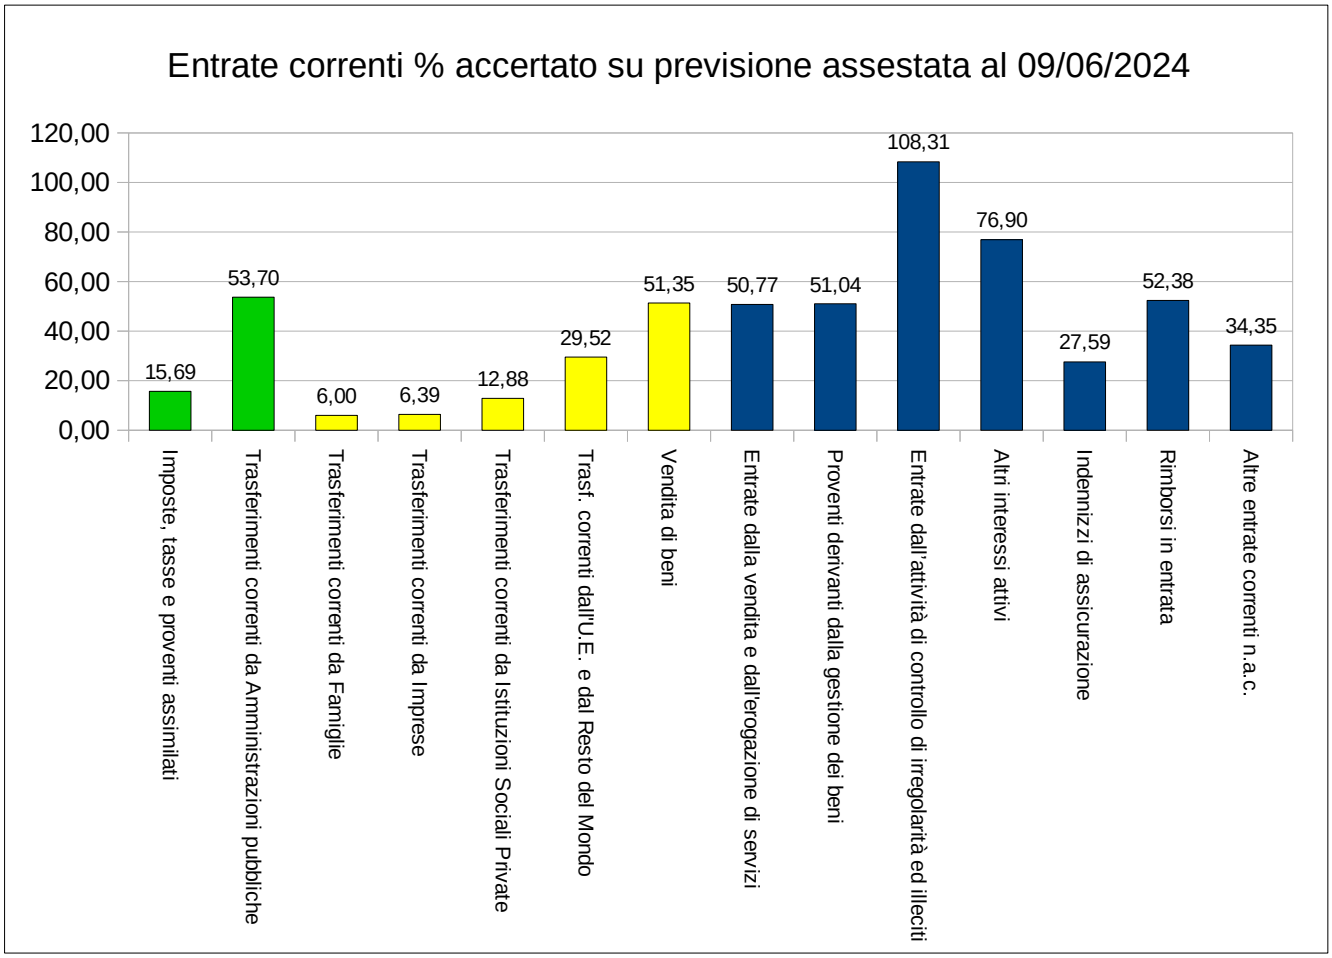
Entrate correnti % accertato su previsione assestata al 09/06/2024
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
15,69
53,70
6,00
6,39
12,88
29,52
51,35
50,77
51,04
108,31
76,90
27,59
52,38
34,35
Imposte, tasse e proventi assimilati
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Famiglie
Trasferimenti correnti da Imprese
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Trasf. correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo
Vendita di beni
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Entrate dall'attività di controllo di irregolarità ed illeciti
Altri interessi attivi
Indennizzi di assicurazione
Rimborsi in entrata
Altre entrate correnti n.a.c.

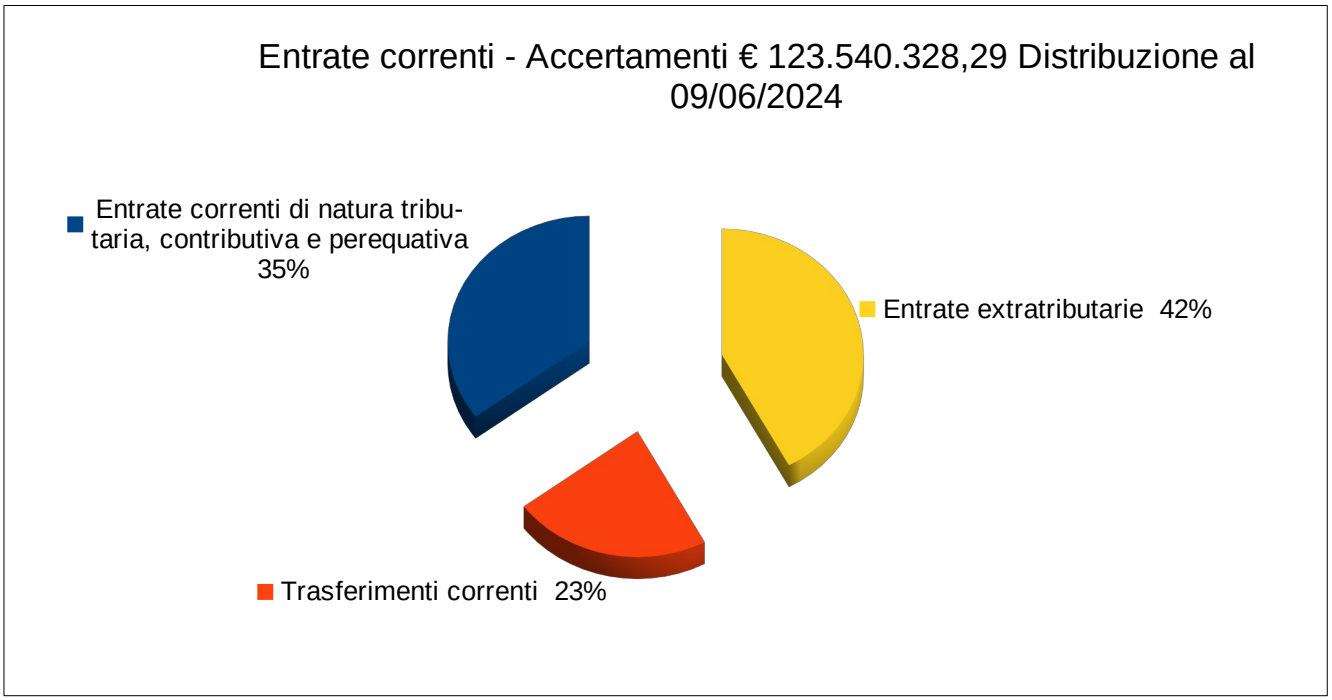
Entrate correnti - Accertamenti € 123.540.328,29 Distribuzione al 09/06/2024
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 35%
Entrate extratributarie 42%
Trasferimenti correnti 23%

Spese correnti (TITOLO 1°) al 09/06/2024

	Descrizione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni	% impegnato
U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	78.809.091,00	89.600.284,87	38.152.062,32	42,58
U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.876.762,00	9.483.415,77	6.094.382,27	64,26
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	166.027.955,56	187.023.817,94	93.763.142,25	50,13
U.1.04	Trasferimenti correnti	26.332.063,00	36.591.293,64	16.027.162,93	43,80
U.1.05	Trasferimenti di tributi	-	-	-	-
U.1.06	Fondi perequativi	-	-	-	-
U.1.07	Interessi passivi	2.718.225,53	2.718.225,53	53,50	0,00
U.1.08	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.041.400,00	2.745.372,36	1.498.367,71	54,58
U.1.10	Altre spese correnti	22.683.040,71	23.012.778,39	1.891.850,89	8,22
TOTALE SPESE CORRENTI		**304.488.537,80**	**351.175.188,50**	**157.427.021,87**	**44,83**

esclusi il fondo pluriennale vincolato destinato ad obbligazioni esigibili negli anni futuri e le prenotazioni di spesa

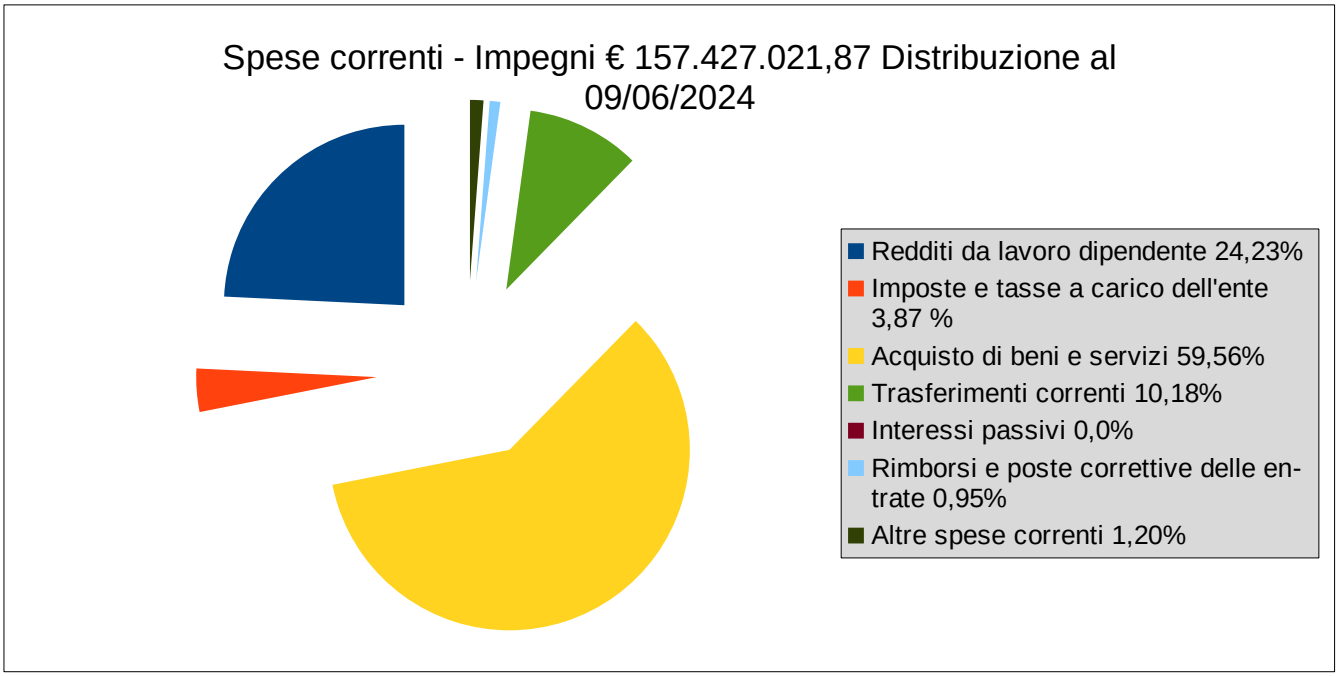

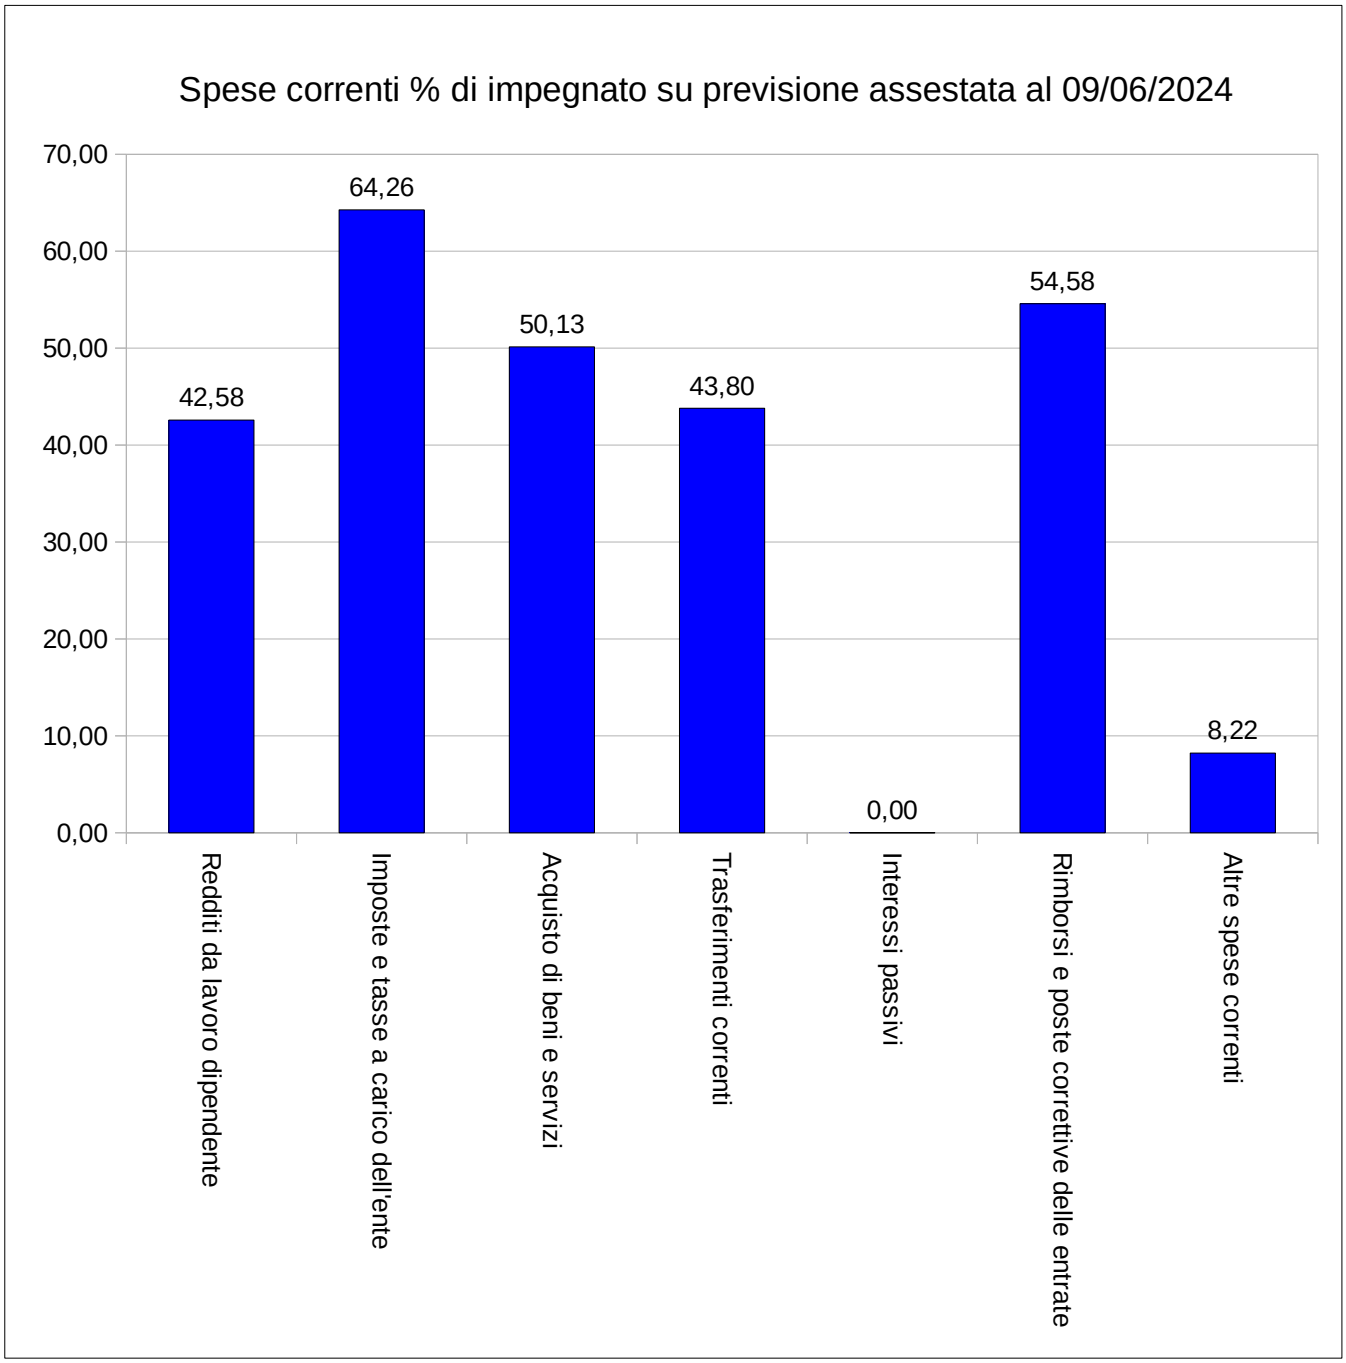
Spese correnti % di impegnato su previsione assestata al 09/06/2024
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
42,58
64,26
50,13
43,80
0,00
54,58
8,22
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

SPESE CORRENTI PER MISSIONE

SPESE LIBERE AL 09/06/2024			
MISSIONI	**previsione assestata**	**impegni**	**% impegni**
Servizi istituzionali, generali e di gestione	48.094.155,42	23.401.078,37	48,66
Giustizia	60.180,93	10.000,00	16,62
Ordine pubblico e sicurezza	20.909.872,60	9.888.323,51	47,29
Istruzione e diritto allo studio	21.222.398,60	10.776.767,54	50,78
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.779.330,41	4.864.891,73	55,41
Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.815.672,52	3.082.466,41	64,01
Turismo	254.304,00	21.517,42	8,46
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.535.734,69	527.237,81	34,33
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.047.263,32	3.008.793,37	49,75
Trasporti e diritto alla mobilità	11.569.855,74	5.641.754,38	48,76
Soccorso civile	177.226,00	73.315,61	41,37
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	37.774.275,28	23.625.719,72	62,54
Sviluppo economico e competitività	1.601.827,10	745.107,54	46,52
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	209.329,00	170.850,58	81,62
Relazioni Internazionali	147.288,00	50.537,24	34,31
Fondi e Accantonamenti	16.582.355,17	-	-
Debito pubblico	74.257,53	-	-
TOTALE	**179.855.326,31**	**85.888.361,23**	**47,75**

non sono compresi le prenotazioni di spesa ed il fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili negli anni futuri

Spese libere - impegni per missione al 09/06/2024 € 85.888.361,23



- Servizi istituzionali, generali e di gestione 27,25%
- Giustizia 0,01%
- Ordine pubblico e sicurezza 11,50%
- Istruzione e diritto allo studio 12,55%
- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 5,66%
- Politiche giovanili, sport e tempo libero 3,59%
- Turismo 0,03%
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,61%
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 3,50%
- Trasporti e diritto alla mobilità 6,57%
- Soccorso civile 0,09%
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 27,51%
- Sviluppo economico e competitività 0,87%
- Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,20%

SPESE VINCOLATE AL 09/06/2024			
MISSIONI	**previsione assestata**	**impegni**	**% impegni**
Servizi istituzionali, generali e di gestione	20.511.621,33	11.588.188,50	56,50
Giustizia	30,00	30,00	100,00
Ordine pubblico e sicurezza	8.935.503,80	5.606.438,03	62,74
Istruzione e diritto allo studio	2.933.102,49	1.791.172,96	61,07
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.845.441,13	1.528.780,85	26,15
Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.534.620,54	569.934,47	37,14
Turismo	286.958,35	250.661,42	87,35
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	183.726,84	183.726,84	100,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	52.161.100,02	15.977.167,37	30,63
Trasporti e diritto alla mobilità	30.201.198,15	15.123.369,99	50,08
Soccorso civile	9.704,20	7.234,00	74,55
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	44.965.320,51	18.656.386,03	41,49
Sviluppo economico e competitività	344.168,83	167.131,18	48,56
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	408.061,00	69.337,00	16,99
Relazioni Internazionali	19.102,00	19.102,00	100,00
Fondi e Accantonamenti	2.980.203,00	-	-
Debito pubblico	-	-	-
TOTALE	**171.319.862,19**	**71.538.660,64**	**41,76**

non sono compresi le prenotazioni di spesa ed il fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili negli anni futuri

Spese vincolate - impegni per missione al 09/06/2024
€ 71.538.660,64



- Servizi istituzionali, generali e di gestione 16,20%
- Ordine pubblico e sicurezza 7,84%
- Istruzione e diritto allo studio 2,50%
- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2,14%
- Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,80%
- Turismo 0,35%
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,26%
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 22,32%
- Trasporti e diritto alla mobilità 21,14%
- Soccorso civile 0,01%
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 26,08%
- Sviluppo economico e competitività 0,23%
- Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,10%
- Relazioni Internazionali 0,03%

SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA

SPESE LIBERE AL 09/06/2024			
MISSIONE/Programma	**previsione assestata**	**impegni**	**% impegni**
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	48.094.155,42	23.401.078,37	48,66
Organi istituzionali	6.076.265,41	2.664.458,96	43,85
Segreteria Generale	2.444.119,23	1.219.980,30	49,91
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.444.023,27	2.359.756,25	27,95
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.074.812,00	1.491.984,02	48,52
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.697.091,09	3.647.904,59	77,66
Ufficio Tecnico	8.827.427,03	4.675.926,27	52,97
Elezioni e consultazioni popolari-Anagrafe e Stato Civile	3.740.473,00	1.459.563,10	39,02
Statistica e sistemi informativi	5.200.700,39	3.467.818,33	66,68
Risorse Umane	4.451.618,00	2.047.552,60	46,00
Altri servizi generali	1.137.626,00	366.133,95	32,18
GIUSTIZIA	60.180,93	10.000,00	16,62
Uffici giudiziari	60.180,93	10.000,00	16,62
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	20.909.872,60	9.888.323,51	47,29
Polizia Locale e amministrativa	16.903.347,00	6.428.955,79	38,03
Sistema integrato di sicurezza urbana	4.006.525,60	3.459.367,72	86,34
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	21.222.398,60	10.776.767,54	50,78
Istruzione prescolastica	7.901.807,24	3.377.823,86	42,75
Altri ordini di istruzione	3.622.776,39	2.829.625,68	78,11
Servizi ausiliari all'istruzione	6.557.842,97	3.470.577,25	52,92
Diritto allo studio	3.139.972,00	1.098.740,75	34,99
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	8.779.330,41	4.864.891,73	55,41
Valorizzazione dei beni di interesse storico	987.056,19	755.854,93	76,58
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.792.274,22	4.109.036,80	52,73

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4.815.672,52	3.082.466,41	64,01
Sport e tempo libero	3.837.186,12	2.324.725,97	60,58
Giovani	978.486,40	757.740,44	77,44
TURISMO	254.304,00	21.517,42	8,46
Sviluppo e valorizzazione del turismo	254.304,00	21.517,42	8,46
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.535.734,69	527.237,81	34,33
Urbanistica e assetto del territorio	907.282,00	313.164,08	34,52
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	628.452,69	214.073,73	34,06
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	6.047.263,32	3.008.793,37	49,75
Difesa del suolo	-	-	-
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.628.003,17	2.331.112,61	50,37
Rifiuti	189.412,44	62.882,52	33,20
Servizio idrico integrato	206.114,71	46.550,00	22,58
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	141.400,00	27.807,11	19,67
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	882.333,00	540.441,13	61,25
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	11.569.855,74	5.641.754,38	48,76
Trasporto pubblico locale	3.358.638,13	722.608,41	21,51
Viabilità e infrastrutture stradali	8.211.217,61	4.919.145,97	59,91
SOCCORSO CIVILE	177.226,00	73.315,61	41,37
Sistema di protezione civile	168.226,00	68.250,55	40,57
Interventi a seguito di calamità naturali	9.000,00	5.065,06	56,28
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	37.774.275,28	23.625.719,72	62,54
Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	14.317.105,62	7.669.219,64	53,57
Interventi per la disabilità	7.306.715,00	4.811.152,34	65,85
Interventi per gli anziani	5.712.605,00	4.174.583,89	73,08
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.922.660,00	2.498.328,82	85,48
Interventi per le famiglie	895.059,00	386.915,84	43,23
Interventi per il diritto alla casa	1.165.219,00	570.836,01	48,99
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.766.903,00	792.691,12	44,86

Cooperazione e associazionismo	35.000,00	35.000,00	100,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	3.653.008,66	2.686.992,06	73,56
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1.601.827,10	745.107,54	46,52
Industria PMI e Artigianato	144.813,00	55.956,18	38,64
Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori	1.370.489,10	660.409,58	48,19
Reti e altri servizi di pubblica utilità	86.525,00	28.741,78	33,22
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	209.329,00	170.850,58	81,62
Sostegno all'occupazione	209.329,00	170.850,58	81,62
RELAZIONI INTERNAZIONALI	147.288,00	50.537,24	34,31
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	147.288,00	50.537,24	34,31
FONDI E ACCANTONAMENTI	16.582.355,17	-	0,00
Fondo di riserva	2.524.737,68	-	0,00
Fondo crediti di difficile esigibilità	14.050.617,49	-	0,00
Altri fondi	7.000,00	-	0,00
DEBITO PUBBLICO	74.257,53	-	0,00
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	74.257,53	-	0,00
TOTALE	**179.855.326,31**	**85.888.361,23**	**47,75**

non sono compresi le prenotazioni di spesa ed il fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili negli anni futuri

SPESE VINCOLATE AL 09/06/2024

MISSIONE/Programma	previsione assestata	impegni	% impegni
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	20.511.621,33	11.588.188,50	56,50
Organi istituzionali	4.735.644,00	1.607.463,67	33,94
Segreteria Generale	1.460.935,13	747.768,48	51,18
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.511.225,00	1.144.738,50	45,58
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	289.201,20	279.718,00	96,72
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.155.020,00	3.250.808,89	78,24
Ufficio Tecnico	1.279.052,47	902.450,45	70,56
Elezioni e consultazioni popolari-Anagrafe e Stato Civile	2.329.810,83	1.651.799,24	70,90
Statistica e sistemi informativi	2.891.282,46	1.337.754,06	46,27
Risorse Umane	473.132,00	359.632,00	76,01

Altri servizi generali	386.318,24	306.055,21	79,22
GIUSTIZIA	30,00	30,00	100,00
Uffici giudiziari	30,00	30,00	100,00
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	8.935.503,80	5.606.438,03	62,74
Polizia Locale e amministrativa	6.974.808,39	4.129.556,03	59,21
Sistema integrato di sicurezza urbana	1.960.695,41	1.476.882,00	75,32
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2.933.102,49	1.791.172,96	61,07
Istruzione prescolastica	1.010.850,80	907.085,60	89,73
Altri ordini di istruzione	823.882,32	267.256,78	32,44
Servizi ausiliari all'istruzione	608.610,37	128.071,58	21,04
Diritto allo studio	489.759,00	488.759,00	99,80
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	5.845.441,13	1.528.780,85	26,15
Valorizzazione dei beni di interesse storico	225.073,30	108.721,47	48,30
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.620.367,83	1.420.059,38	25,27
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.534.620,54	569.934,47	37,14
Sport e tempo libero	721.283,78	361.044,57	50,06
Giovani	813.336,76	208.889,90	25,68
TURISMO	286.958,35	250.661,42	87,35
Sviluppo e valorizzazione del turismo	286.958,35	250.661,42	87,35
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	183.726,84	183.726,84	100,00
Urbanistica e assetto del territorio	103.390,84	103.390,84	100,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	80.336,00	80.336,00	100,00
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	52.161.100,02	15.977.167,37	30,63
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.634.497,01	2.788.485,31	60,17
Rifiuti	47.184.730,50	13.069.320,67	27,70
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	182.538,62	33.587,71	18,40
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	159.333,89	85.773,68	53,83
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	30.201.198,15	15.123.369,99	50,08
Trasporto pubblico locale	19.492.593,03	10.291.359,22	52,80
Viabilità e infrastrutture stradali	10.708.605,12	4.832.010,77	45,12

SOCCORSO CIVILE	9.704,20	7.234,00	74,55
Sistema di protezione civile	9.704,20	7.234,00	74,55
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	44.965.320,51	18.656.386,03	41,49
Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	9.856.425,64	5.167.144,21	52,42
Interventi per la disabilità	6.674.849,15	2.291.094,21	34,32
Interventi per gli anziani	5.215.470,48	2.351.941,88	45,10
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	17.904.839,73	5.671.369,12	31,68
Interventi per le famiglie	463.483,64	83.219,50	17,96
Interventi per il diritto alla casa	4.133.143,61	2.706.272,11	65,48
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	416.666,26	238.597,00	57,26
Servizio necroscopico e cimiteriale	300.442,00	146.748,00	0,00
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	344.168,83	167.131,18	48,56
Industria PMI e Artigianato	17.314,00	17.314,00	100,00
Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori	317.399,83	140.362,18	44,22
Reti e altri servizi di pubblica utilità	9.455,00	9.455,00	100,00
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	408.061,00	69.337,00	16,99
Sostegno all'occupazione	408.061,00	69.337,00	16,99
RELAZIONI INTERNAZIONALI	19.102,00	19.102,00	100,00
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	19.102,00	19.102,00	100,00
FONDI E ACCANTONAMENTI	2.980.203,00	-	0,00
Fondo di riserva	1.000.000,00	-	0,00
Fondo crediti di difficile esigibilità	1.980.203,00	-	0,00
TOTALE	**171.319.862,19**	**71.538.660,64**	**41,76**

non sono compresi le prenotazioni di spesa ed il fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili negli anni futuri

Entrate da investimenti (TITOLI 4°, 5°, 6°) al 09/06/2024

	Descrizione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertamenti	*% accertato*
E.4.02.01.	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	198.639.288,30	243.268.642,17	104.676.663,40	43,03
E.4.02.03.	Contributi agli investimenti da Imprese	15.682.306,04	15.904.290,04	2.774.290,04	17,44
E.4.02.04.	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	308.000,00	633.000,00	25.000,00	3,95
E.4.02.05.	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	50.000,00	55.645,12	-	0,00
E.4.03.11.	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	31.000,00	31.000,00	-	0,00
E.4.03.12.	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	-	-	-	-
E.4.03.13.	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	247.000,00	247.000,00	-	0,00
E.4.04.01.	Alienazione di beni materiali	4.166.477,00	4.944.017,00	434.154,55	8,78
E.4.04.02.	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.698.150,00	1.698.150,00	109.022,42	6,42
E.4.05.01.	Permessi di costruire	6.574.600,00	6.674.600,00	4.368.620,94	65,45
E.4.05.04.	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	5.268.306,25	5.318.306,25	197.950,52	3,72
TOTALE TITOLO 4°		**232.665.127,59**	**278.774.650,58**	**112.585.701,87**	**40,39**
E.5.01.01.	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-	-	0,00
E.5.03.08.	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	-	-	-	0,00
E.5.04.07.	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO 5°		**-**	**-**	**-**	0,00
E.6.03.01.	Finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO 6°		**-**	**-**	**-**	0,00
TOTALE GENERALE		**232.665.127,59**	**278.774.650,58**	**112.585.701,87**	**40,39**

Escluso fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili nel 2024

Spese per investimenti (TITOLI 2°, 3°) al 09/06/2024

	Descrizione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni	*% impegnato*
U.2.02.01.	Beni materiali	69.104.744,66	175.778.781,03	116.101.735,53	66,05
U.2.02.02.	Terreni e beni materiali non prodotti	300.000,00	300.000,00	-	0,00
U.2.02.03.	Beni immateriali	1.181.504,64	6.361.632,70	3.372.855,37	53,02
U.2.03.01.	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	430.000,00	550.000,00	480.000,00	87,27
U.2.03.02.	Contributi agli investimenti a famiglie	-	-	-	0,00
U.2.03.03.	Contributi agli investimenti a Imprese	159.531.171,92	191.120.353,57	55.621.631,91	29,10
U.2.03.04.	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	639.968,00	639.968,00	500.000,00	78,13
U.2.05.04.	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	350.000,00	300.000,00	55.746,94	18,58
U.2.05.99.	Altre spese in conto capitale n.a.c	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO 2°		**231.537.389,22**	**375.050.735,30**	**176.131.969,75**	**46,96**
U.3.01.01.	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	-	-	-	0,00
U.3.03.08.	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	-	-	-	0,00
TOTALE TITOLO 3°		**-**	**-**	**-**	**0,00**
TOTALE GENERALE		**231.537.389,22**	**375.050.735,30**	**176.131.969,75**	**46,96**

Esclusi il fondo pluriennale vincolato destinato ad obbligazioni esigibili negli anni futuri e le prenotazioni di spesa

Spese per investimenti per missione (TITOLI 2°, 3°) al 09/06/2024

MISSIONI	previsione assestata	impegni	% impegni
Servizi istituzionali, generali e di gestione	44.166.909,74	21.268.922,81	48,16
Giustizia	-	-	-
Ordine pubblico e sicurezza	1.245.940,05	448.089,69	35,96
Istruzione e diritto allo studio	7.772.490,79	6.291.417,53	80,94
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	35.161.659,47	23.099.858,66	65,70
Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.375.186,01	12.853.054,43	66,34
Turismo	30.000,00	30.000,00	100,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	18.324.368,70	15.476.327,01	84,46
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.247.173,39	7.069.697,28	68,99
Trasporti e diritto alla mobilità	231.120.761,89	84.789.072,03	36,69
Soccorso civile	48.261,24	48.261,24	100,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.557.984,02	4.757.269,07	62,94
Sviluppo economico e competitività	-	-	-
TOTALE	**375.050.735,30**	**176.131.969,75**	**46,96**

Esclusi il fondo pluriennale vincolato destinato ad obbligazioni esigibili negli anni futuri e le prenotazioni di spesa

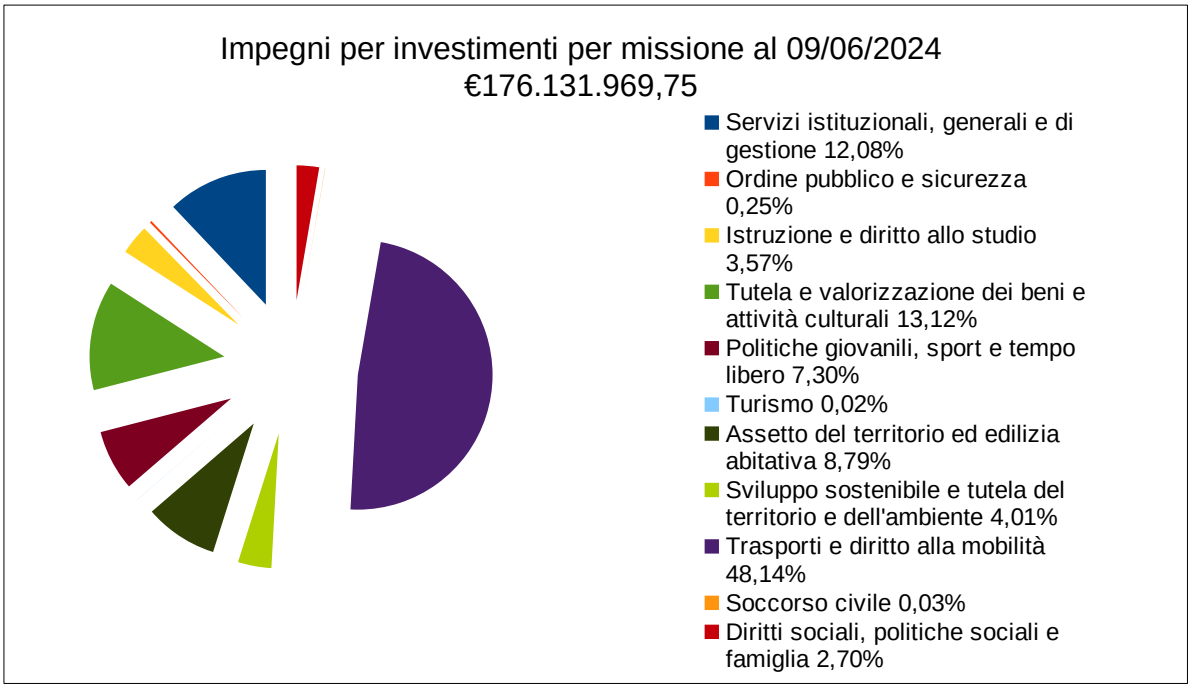

Spese per investimenti per programma (TITOLI 2°, 3°) al 09/06/2024

MISSIONE/Programma	previsione assestata	impegni	% impegni
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	44.166.909,74	21.268.922,81	48,16
Organi istituzionali	677.632,88	204.249,09	30,14
Segreteria generale	-	-	0,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.642.560,61	139.894,36	1,83
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	30.000,00	-	0,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14.624.146,82	6.332.900,94	43,30
Ufficio Tecnico	17.713.503,73	12.687.665,24	71,63
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	48.332,90	26.726,86	55,30
Statistica e sistemi informativi	3.430.732,80	1.877.486,32	54,73
GIUSTIZIA	-	-	0,00
Uffici giudiziari	-	-	0,00
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.245.940,05	448.089,69	35,96
Polizia Locale e amministrativa	1.245.940,05	448.089,69	35,96
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7.772.490,79	6.291.417,53	80,94
Istruzione prescolastica	1.138.066,64	837.728,94	73,61
Altri ordini di istruzione	6.634.424,15	5.453.688,59	82,20
Servizi ausiliari all’istruzione	-	-	0,00
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	35.161.659,47	23.099.858,66	65,70
Valorizzazione dei beni di interesse storico	34.498.132,68	23.027.210,04	66,75
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	663.526,79	72.648,62	10,95
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	19.375.186,01	12.853.054,43	66,34
Sport e tempo libero	19.373.186,01	12.853.054,43	66,34
Giovani	2.000,00	-	0,00
TURISMO	30.000,00	30.000,00	0,00
Sviluppo e valorizzazione del turismo	30.000,00	30.000,00	100,00
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	18.324.368,70	15.476.327,01	84,46
Urbanistica e assetto del territorio	1.450.000,00	804.392,80	55,48
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	16.874.368,70	14.671.934,21	86,95

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	10.247.173,39	7.069.697,28	68,99
Difesa del suolo	211.239,01	211.239,01	100,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8.284.828,83	6.614.859,75	79,84
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.751.105,55	243.598,52	13,91
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	0,00
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	231.120.761,89	84.789.072,03	36,69
Trasporto pubblico locale	190.196.487,66	53.976.619,00	28,38
Viabilità e infrastrutture stradali	40.924.274,23	30.812.453,03	75,29
SOCCORSO CIVILE	48.261,24	48.261,24	100,00
Sistema di Protezione Civile	48.261,24	48.261,24	100,00
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	7.557.984,02	4.757.269,07	62,94
Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	3.633.474,20	2.631.701,21	72,43
Interventi per la disabilità	201.995,00	-	0,00
Interventi per gli anziani	430.000,00	430.000,00	100,00
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.144.097,99	796.134,33	37,13
Interventi per le famiglie	-	-	0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	1.148.416,83	899.433,53	78,32
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	0,00
Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori	-	-	0,00
TOTALE	**375.050.735,30**	**176.131.969,75**	**46,96**

Esclusi il fondo pluriennale vincolato destinato ad obbligazioni esigibili negli anni futuri e le prenotazioni di spesa

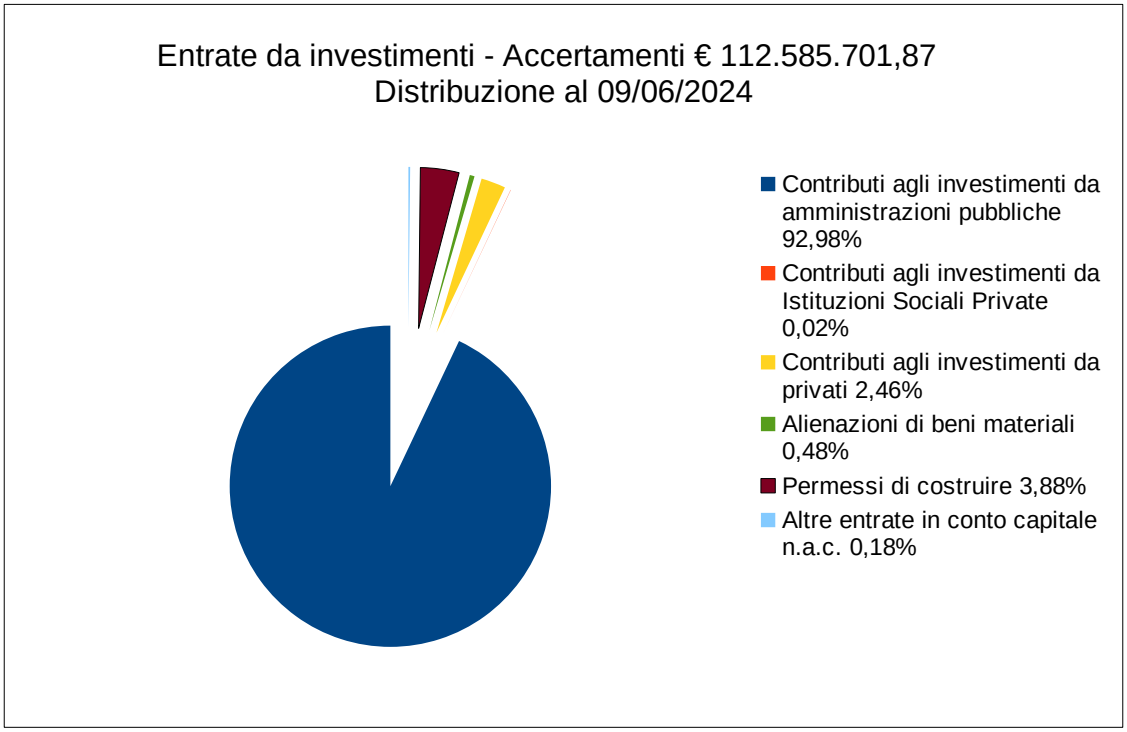
Entrate da investimenti - Accertamenti € 112.585.701,87
Distribuzione al 09/06/2024
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 92,98%
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,02%
Contributi agli investimenti da privati 2,46%
Alienazioni di beni materiali 0,48%
Permessi di costruire 3,88%
Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,18%

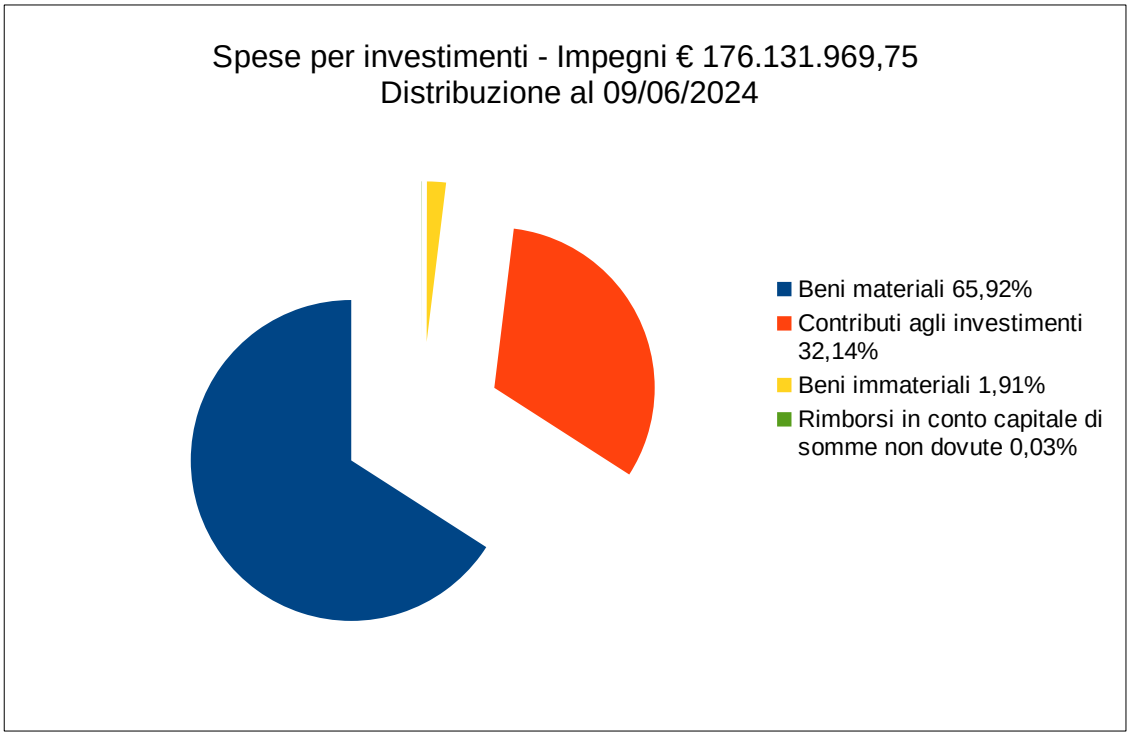
Spese per investimenti - Impegni € 176.131.969,75
Distribuzione al 09/06/2024
Beni materiali 65,92%
Contributi agli investimenti 32,14%
Beni immateriali 1,91%
Rimborsi in conto capitale di somme non dovute 0,03%

2. LAVORI PUBBLICI

Il monitoraggio dei lavori pubblici ha per oggetto l'analisi dello stato di realizzo delle opere finanziate nell'anno e negli anni precedenti ed in corso di esecuzione.

Per la predetta analisi viene scomposta ogni singola opera pubblica nelle diverse fasi di realizzo e viene attribuita a ciascuna fase un valore percentualizzato sull'intera opera, come rappresentato nella seguente tabella:

FASE DI REALIZZAZIONE	VALORE IN %
Progetto finanziato	10%
Progetto approvato	20%
Avvio procedura di gara	10%
Appalto aggiudicato	10%
Inizio dei lavori	5%
Conclusione dei lavori	40%
Collaudo	5%
Totale	**100%**

La percentuale di realizzazione di ogni singola opera equivale alla somma delle fasi già realizzate; la percentuale di realizzazione totale dell'Ente, invece, equivale alla media della percentuale di tutte le opere, ponderata in base all'importo di ciascuna opera.

In questa breve analisi, è stata creata una apposita sezione per le opere rientranti nel PNRR, che impegnano particolarmente gli uffici per i numerosi adempimenti richiesti dalla relativa normativa e per la necessità di rispettare gli obiettivi temporali (milestones) stabiliti negli atti di assegnazione.

Le pagine che seguono analizzano lo stato complessivo di realizzo delle opere e, successivamente, vengono riportate le schede di dettaglio con indicata, per ciascuna opera, il relativo importo finanziato e la fase di realizzazione al **09/06/2024.**.

OPERE FINANZIATE NELL'AMBITO DEL P.N.R.R. - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Nell'ambito dell'iniziativa Next Generatrion EU, all'Italia sono state assegnate risorse per complessivi euro 191,5 miliardi, successivamente incrementati di ulteriori 2,9 miliardi, destinati a finanziare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, costituito da un pacchetto di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021/2026.
Il Comune di Padova ha presentato numerosi progetti, rientranti nei vari ambiti previsti dal Piano ai quali vanno aggiunti il "Progetto nuova linea tramviaria Busa di Vigonza-Rubano (Sir 2)" e il "Progetto nuova linea tramviaria Stazione-Voltabarozzo (Sir3)", il cui monitoraggio viene effettuato separatamente e con altre modalità, sia per l'entità delle opere, sia per il fatto che le fasi della loro realizzazione sono gestite dalla società APS Holding Spa.

In queste pagine viene rappresentato lo stato di avanzamento degli interventi finanziati dal PNRR che costituiscono opere pubbliche. A tal riguardo occorre rilevare che nei primi mesi del 2024 è intervenuto il D.L. n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024, che ha modificato la fonte di finanziamento per alcune opere inizialmente ricomprese nel PNRR, sostituendola con contributo dello Stato. In ogni caso si è ritenuto opportuno continuare a mantenere le "opere fuoriuscite dal PNRR" in questo gruppo, dato che il loro monitoraggio avviene ancora attraverso la piattaforma "Regis", ossia il sistema informatico nazionale attraverso il quale i Ministeri competenti verificano lo stato di realizzo delle opere e le relative rendicontazioni. In questa analisi le opere "fuoriuscite dal PNRR" sono identificate come "ex PNRR".

Gli importi delle opere sono comprensivi del Fondo opere indifferibili aggiornato alla data del report, previsto per fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori

Nel dettaglio, i lavori pubblici realizzati nell'ambito del PNRR ed ex PNRR sono distribuiti tra i seguenti assi di investimento, facenti riferimento alle missioni sottoriportate:

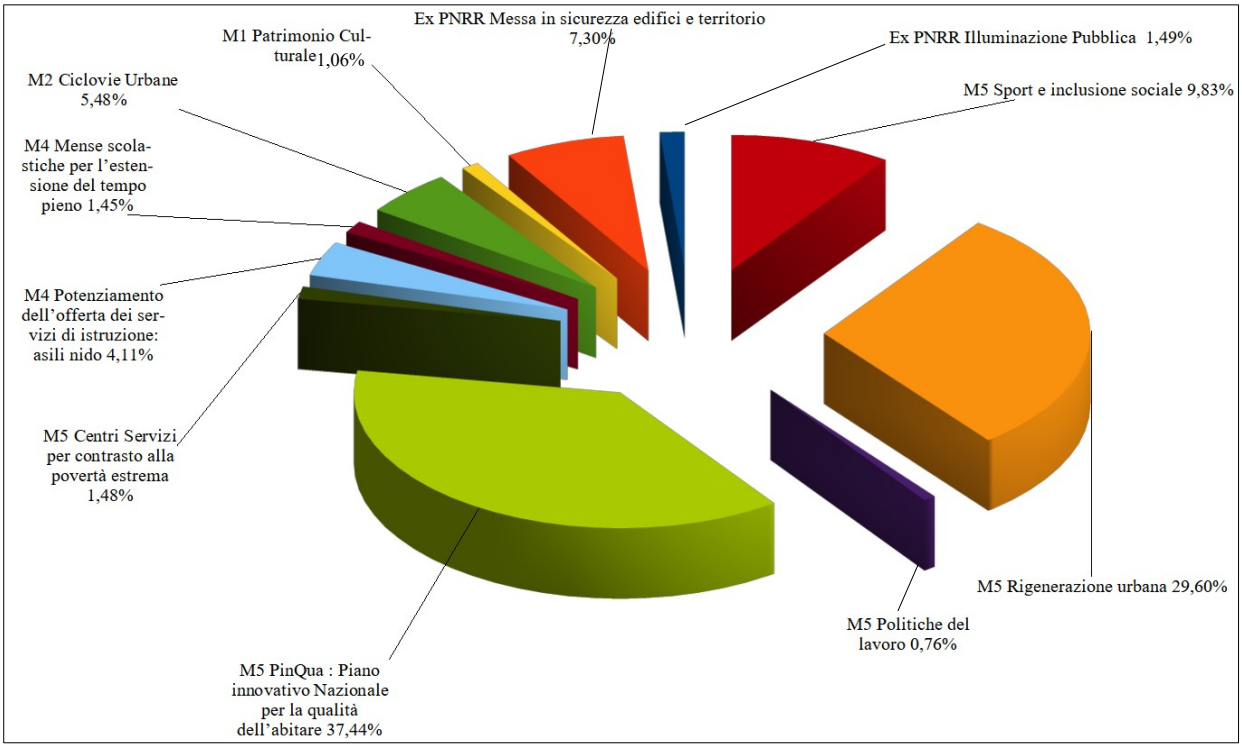

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO: tra gli obiettivi è previsto "...il rilancio di due settori che caratterizzano l'Italia: il turismo e la cultura."

Patrimonio Culturale
Per un totale di 776.749,87:

LLPP EDP 2022/072	Teatro Maddalene Via S. Giovanni da Verdara - Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di climatizzazione - interventi per l'ecoefficienza e riduzioni dei consumi energetici	279.064,87
LLPP EDP 2023/085	Rimozione delle barriere fisiche e cognitive del Museo Civico Eremitani	497.685,00

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Prevede di realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia per rendere il sistema sostenibile e garantire la sua competitività con azioni per l'efficientamento del patrimonio immobiliare e iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, per salvaguardare e promuovere la biodiversità del territorio, e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche.

Sono stati finanziati i seguenti progetti:

Ciclovie urbane
Per un totale di euro 3.985.349,19:

LLPP OPI 2020/032	Ciclovie Urbane	998.297,52
LLPP OPI 2021/021	In bici dalla Stazione all'Università	682.500,00
LLPP OPI 2022/027	Rafforzamento mobilità ciclistica – via Lago Dolfin	948.906,97
LLPP OPI 2022/029	Rafforzamento mobilità ciclistica – collegamenti e corsie	575.000,00
LLPP OPI 2022/028	Rafforzamento mobilità ciclistica – via Grassi/Rocco/Ippodromo	780.644,70

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
L'obiettivo è superare le carenze strutturali, quantitative e qualitative, dell'offerta di servizi di istruzione in tutto il ciclo formativo: si prevede di aumentare l'offerta di posti e servizi nelle scuole per innalzare il potenziale di crescita del settore istruzione

Sono stati finanziati i seguenti progetti:

Mense scolastiche per l'estensione del tempo pieno
Per un totale di euro 1.056.280,70

LLPP EDP 2022/053	Scuola Primaria MANIN – Nuova costruzione Mensa	523.496,56
LLPP EDP 2022/054	Scuola Primaria ROSMINI – Nuova costruzione Mensa	532.784,14

Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: asili nido
Per un totale di euro 2.993.801,28:

LLPP EDP 2022/060	Asilo Nido Comunale SCRICCIOLO – Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza	755.099,84
LLPP EDP 2022/062	Asilo Nido Comunale BERTACCHI – Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza	744.460,08
LLPP EDP 2022/064	Asilo Nido Comunale LO SCARABOCCHIO – Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza	747.125,68
LLPP EDP 2022/065	Asilo Nido Comunale TRENINO – Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza	747.115,68

MISSIONE 5: COESIONE E INCLUSIONE
Prevede investimenti nelle infrastrutture sociali, rafforza le politiche attive del lavoro, promuove il ruolo dello sport come fattore di inclusione con particolare attenzione alla coesione territoriale, al rafforzamento delle zone economiche speciali. Ha l'obiettivo di promuovere processi di rigenerazione in aree urbane con disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e incrementare la qualità dell'abitare.

Sono stati finanziati i seguenti progetti:

PinQua: Piano innovativo nazionale per la qualità dell'abitare
Per un totale di euro 27.241.114,57:

LLPP EDP 2021/135	Riqualificazione di Piazza Azzurri d'Italia (programma PinQua A1)	545.000,00
LLPP EDP 2021/136	Riqualificazione edificio ex Coni (programma PinQua A2)	7.000.000,00
LLPP EDP 2021/137	Restauro e riqualificazione dell'Istituto ex-Configliachi (programma PinQua A3)	8.280.000,00
LLPP EDP 2021/138	Efficientamento energetico del fabbricato ERP di 36 alloggi in via Duprè civ. 24 (programma PinQua A4)	847.500,00
LLPP EDP 2021/139	Completamento opere di recupero dei fabbricati ERP di via Moretto da Brescia civ. 1–3–5–7–9–11–13–15–19–21–23 (programma PinQua A5)	1.010.000,00
LLPP EDP 2021/140	Riqualificazione spazi aperti via Duprè Giardino dei Ciliegi e attivazione piastra pubblica polifunzionale (programma PinQua A6)	24.000,00
LLPP EDP 2021/141	Prosecuzione percorso ciclabile San Bellino (programma PinQua A7)	180.000,00
LLPP EDP 2021/142	Miglioramento accesso alle scuole quartiere Arcella (programma PinQua A8)	60.000,00
LLPP EDP 2021/143	Percorso sportivo scuola Briosco – Scuola Donatello – Riqualificazione spazi aperti Piazzale Azzurri d'Italia (programma PinQua A9)	60.000,00
LLPP EDP 2021/144	Realizzazione accesso cat// scuola Donatello (programma PinQua A10)	18.000,00
LLPP EDP 2021/145	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di alloggi ERP via santa Cabrini cv. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (programma PinQua A11)	8.569.999,57
LLPP EDP 2021/146	Demolizione fabbricato esistente ex centro anziani per nuova costruzione fabbricato con ricavo due alloggi ERP, per categorie protette (programma PinQua A12)	646.615,00

Sport e inclusione sociale
Per un totale di euro 7.150.000,00:

LLPP EDP 2022/068	Cittadella dello sport "Valsugana": campo rugby in erba naturale con tribuna, spogliatoi, campo da calcio e rugby in erba artificiale - next genereration EU	4.290.000,00
LLPP EDP 2022/069	Rigenerazione del Palazzetto dello Sport San Lazzaro - next genereration EU"	2.860.000,00

Rigenerazione urbana

Per un totale di euro 21.534.980,64:

LLPP OPI 2021/093	Mobilita' Sostenibile Bicipolitana Mura Nord (Progetto di rigenerazione urbana n. 1)	730.451,20
LLPP OPI 2021/094	Mobilita' Sostenibile Bicipolitana Mura Ovest (Progetto di rigenerazione urbana n. 2)	814.771,62
LLPP OPI 2021/095	Mobilita' Sostenibile Bicipolitana 4 Chiesanuova (Progetto di rigenerazione urbana n. 3)	509.654,80
LLPP OPI 2021/096	Mobilita' Sostenibile Bicipolitana 5 Colli (Progetto di rigenerazione urbana n. 4)	712.946,87
LLPP OPI 2021/097	Mobilita' Sostenibile Accessibilità Paleocapa (Progetto di rigenerazione urbana n. 5)	2.310.000,00
LLPP OPI 2021/098	Mobilita' Sostenibile Bicipolitana Mura Sud – Tratto Mandria Bassanello (Progetto di rigenerazione urbana n. 6)	2.348.258,82
LLPP OPI 2021/099	Mobilita' Sostenibile Riqualificazione 58° Fanteria (Progetto di rigenerazione urbana n. 7)	1.007.825,34
LLPP OPI 2021/100	Mobilita' Sostenibile Bicipolitana Mura Sud-Est (Progetto di rigenerazione urbana n.8)	969.329,43
LLPP OPI 2021/101	Mobilita' Sostenibile Riqualificazione Pontecorvo-Bicipolitana 12a Facciolati (Progetto di rigenerazione urbana n.9)	961.250,74
LLPP EDP 2021/102	Restauro dell'ala Nord del Castello dei Carraresi (Progetto di rigenerazione urbana n. 10)	5.300.000,00
LLPP EDP 2021/090	Costruzione nuova aula polivalente c/o la scuola primaria "Lombardo-Radice in via Ciamician n. 3 (Progetto di rigenerazione urbana n. 11)	550.000,00
LLPP EDP 2021/103	Palaghiaccio/Plebiscito: completamento del primo piano (Progetto di rigenerazione urbana n. 12)	588.619,36
LLPP EDP 2021/104	Nuovo campo in erba artificiale "Sacra Famiglia" (Progetto di rigenerazione urbana n. 13)	500.000,00
LLPP EDP 2021/105	Attività sportiva all'aperto in quartiere: Piastre Polivalenti (Progetto di rigenerazione urbana n. 14)	580.000,00
LLPP EDP 2021/106	Ristrutturazione di un fabbricato ERP di 6 alloggi in via Pizzamano civ. 34 (Progetto di rigenerazione urbana n. 15)	720.591,81
LLPP EDP 2021/107	Ristrutturazione di 3 alloggi ERP in via Boyle civ. 2 e via Curie civv. 25 e 28 a Padova (Progetto di rigenerazione urbana n. 16)	431.280,65
LLPP VER 2021/108	Riqualificazione ed ampliamento Parco Iris. Primo stralcio (Progetto di rigenerazione urbana n. 17)	2.000.000,00
LLPP EDP 2021/109	Sistemazione aree esterne Liceo Artistico Pietro Selvatico Padova (Progetto di rigenerazione urbana n. 18)	500.000,00

Centri Servizi per contrasto alla povertà estrema

Per un totale di euro 1.075.000,00.

LLPP EDP 2022/078	Centri Servizi – Stazioni di Posta: Ristrutturazione con efficientamento energetico ex Gabelli e Casetta Eremitano	910.000,00
LLPP EDP 2023/083	Centri Servizi – HOUSING FIRST: Miglioramento funzionale edificio in Via Rovereto	165.000,00

Politiche del lavoro

Per un totale di euro 550.000,00

LLPP EDP 2024/052	PNRR – Missione 5 Componente 1 Politiche del lavoro, Investimento 1.1. - Potenziamento dei centri per l'impiego – Riqualificazione immobile di Corso Stati Uniti	550.000,00

OPERE ex PNRR:

Illuminazione pubblica

Per un totale di euro 1.086.098,79:

LLPP EDP 2020/091	PNRR M2C4I2.2-A – Efficientamento di alcuni impianti di illuminazione pubblica	149.310,10
LLPP EDP 2021/088	Efficientamento energetico di alcuni Impianti di illuminazione pubblica	152.141,28
LLPP EDP 2021/088-001	Efficientamento energetico di alcuni Impianti di illuminazione pubblica – LOTTO 2	154.647,41
LLPP EDP 2022/067	Efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione Pubblica-NextGeneratioEU	210.000,00
LLPP EDP 2023/068	Efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione Pubblica-NextGeneratioEU	210.000,00
LLPP EDP 2023/069	Efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione Pubblica-NextGeneratioEU	210.000,00

Messa in sicurezza edifici e territorio

Per un totale di euro 5.310.616,14:

LLPP OPI 2020/043	Intervento preventivo in aree a elevato rischio idraulico – Realizzazione invasi di laminazione bacino Brusegana – C.so Australia	785.000,00
LLPP OPI 2020/044	Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – Recupero strutturale del Ponte sul Bacchiglione in Corso Kennedy/Corso Esperanto	1.119.906,54
LLPP OPI 2020/045	Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – interventi manutentivi sui ponti cittadini in muratura	985.709,60
LLPP OPI 2020/046	Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – interventi manutentivi sui ponti cittadini in c.a. e acciaio	980.000,00
LLPP OPI 2020/047	Manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza di tratti di viabilità – ripristino e sostituzione dei giunti di dilatazione in corrispondenza di ponti e cavalcavia con messa in sicurezza idraulica degli impalcati	560.000,00
LLPP OPI 2020/048	Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – Recupero strutturale del Ponte Paleocapa	880.000,00

Finora sono state rispettate tutte le milestones stabilite nei singoli bandi e decreti di assegnazione dei fondi ed è in costante avanzamento l'inserimento nella piattaforma di monitoraggio REGIS, di tutti i dati richiesti dalle Amministrazioni centrali titolari (Ministeri).

La seguente tabella riepiloga, nel complesso e per fase di realizzo, l'avanzamento delle opere pubbliche finanziate dal PNRR e quelle ex PNRR:

Opere pubbliche PNRR ed ex PNRR: Avanzamento al 09/06/2024			
Totale Progetti	**60**	**72.759.991,18**	**100,00%**
Progetti Approvati	58	71.999.991,18	98,96%
Procedure di gara avviate	56	70.592.306,18	97,02%
Appalti aggiudicati	54	62.945.691,18	86,51%
Inizio lavori	42	26.665.381,12	36,65%
Conclusione lavori	15	5.280.367,72	7,26%
Collaudo	7	1.556.396,31	2,14%

In questo grafico, invece, è rappresentata la distribuzione delle opere PNRR ed ex PNRR del Comune di Padova per fase realizzata alla data del 09/06/2024:

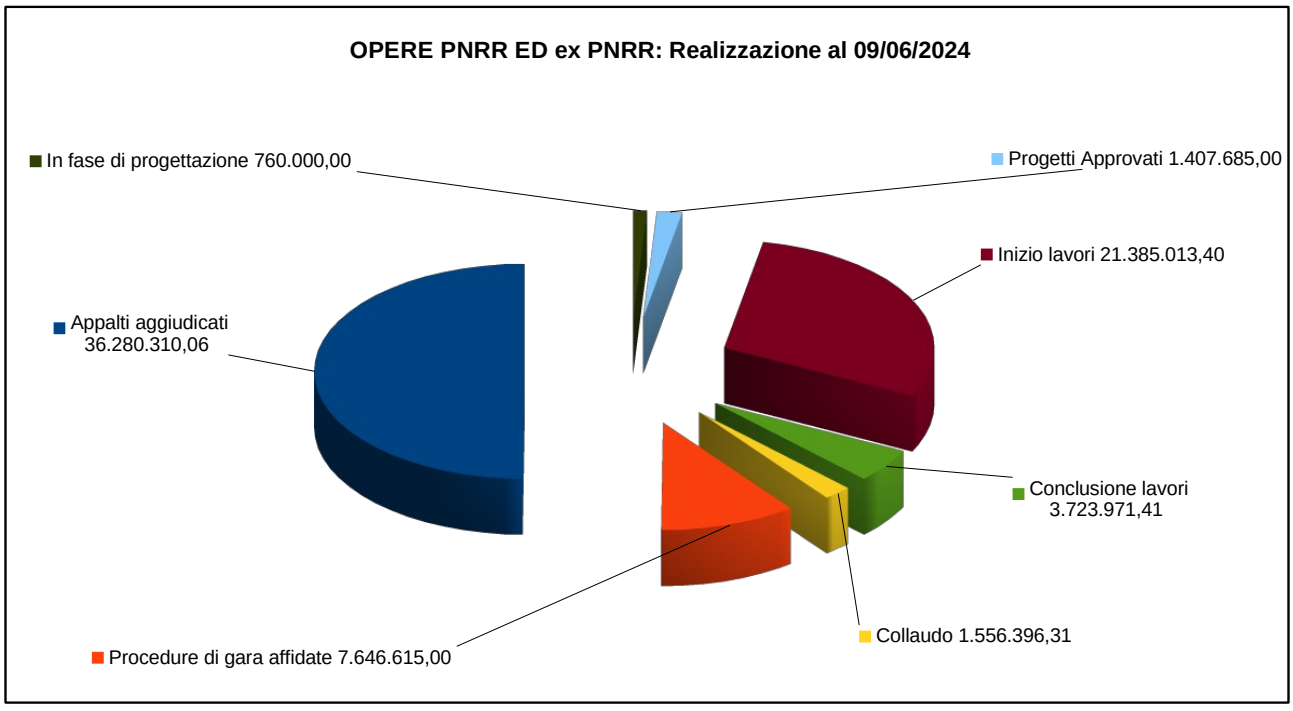

Lo stato di realizzazione di ogni singola Missione/ambito è evidenziato nella tabella seguente. Esso è calcolato in base alla percentuale media di realizzo, parametrata all'importo delle opere.

Descrizione	Fase di realizzazione	Totale per fase	% di realizzo
M1 Patrimonio Culturale	Progetto approvato	497.685,00	30%
	Conclusione dei lavori	279.064,87	95%
Totale		**776.749,87**	**53,35%**
M2 Ciclovie Urbane	Appalto aggiudicato	1.729.551,67	50%
	Inizio dei lavori	1.257.500,00	55%
	Collaudo	998.297,52	100%
Totale		**3.985.349,19**	**64,10%**
M4 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: asili nido	Inizio dei lavori	2.993.801,28	55%
Totale		**2.993.801,28**	**55,00%**
M4 Mense scolastiche per l'estensione del tempo pieno	Inizio dei lavori	1.056.280,70	55%
Totale		**1.056.280,70**	**55,00%**
M5 PinQua : Piano innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare	Avvio procedura di gara	7.646.615,00	40%
	Appalto aggiudicato	19.252.499,57	50%
	Inizio dei lavori	180.000,00	55%
	Conclusione dei lavori	60.000,00	95%
	Collaudo	102.000,00	100%
Totale		**27.241.114,57**	**47,51%**
M5 Centri Servizi per contrasto alla povertà estrema	Progetto approvato	910.000,00	30%
	Inizio dei lavori	165.000,00	55%
Totale		**1.075.000,00**	**33,84%**
M5 Rigenerazione urbana	Appalto aggiudicato	8.148.258,82	50%
	Conclusione dei lavori	500.000,00	95%
	Inizio dei lavori	12.886.721,82	55%
Totale		**21.534.980,64**	**54,04%**
M5 Sport e inclusione sociale	Appalto aggiudicato	7.150.000,00	50%
Totale		**7.150.000,00**	**50,00%**
M5 Politiche del lavoro	Progetto finanziato	550.000,00	10%
Totale		**550.000,00**	**10,00%**
Ex PNRR: Illuminazione Pubblica	Progetto finanziato	210.000,00	10%
	Conclusione dei lavori	420.000,00	95%
	Collaudo	456.098,79	100%
Totale		**1.086.098,79**	**80,66%**
Ex PNRR: Messa in sicurezza edifici e territorio	Conclusione dei lavori	2.464.906,54	95%
	Inizio dei lavori	2.845.709,60	55%
Totale		**5.310.616,14**	**73,57%**
Totale PNRR ed ex PNRR		**72.759.991,18**	**52,99%**

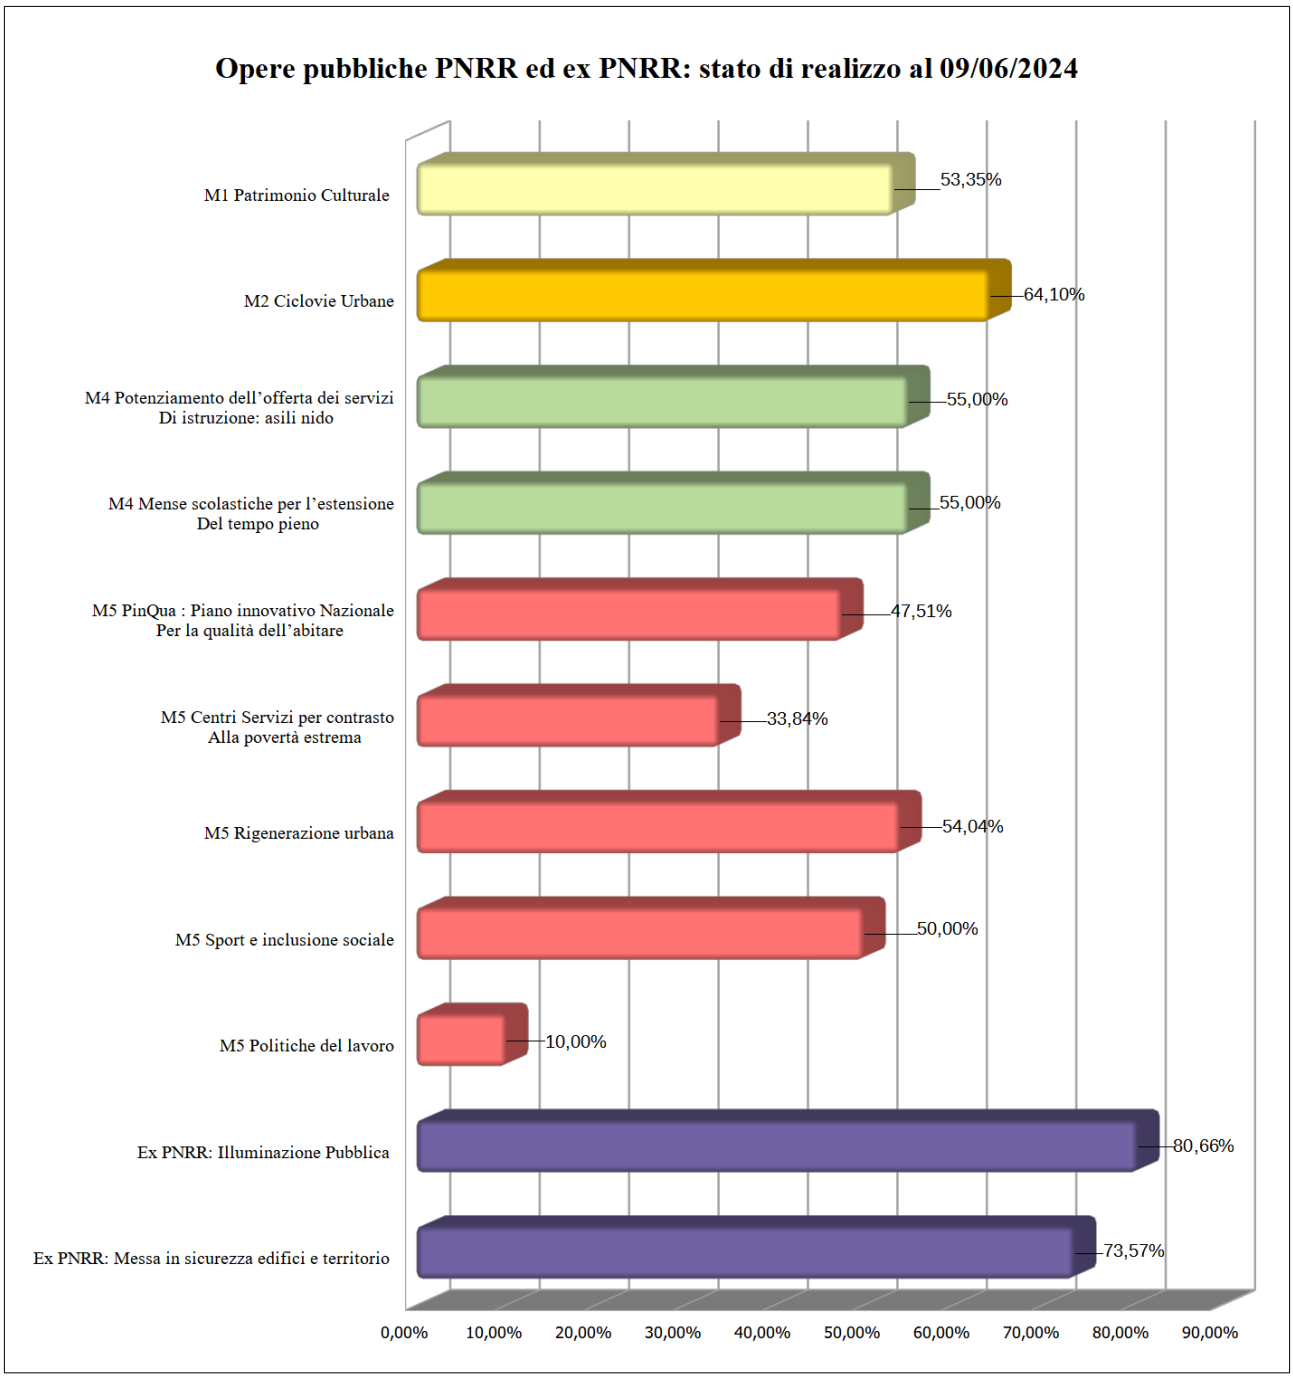

Successivamente al paragrafo relativo all'elenco annuale 2024 è riportato il dettaglio di tutte le opere monitorate con il relativo stato di realizzo alla data del report.

Per quanto riguarda il SIR 2, è stato aggiudicato l'appalto integrato per la progettazione e la realizzazione dei lavori, divisa in due lotti funzionali. Il progetto esecutivo è stato approvato per parti e sono in corso le operazioni preliminari: spostamento sottoservizi, bonifica bellica e saggi.

Relativamente al SIR 3, è in corso la cantierizzazione dell'opera in più punti della città. Attualmente è stato terminato circa il 30% delle opere.

OPERE FINANZIATE NELL'ANNO 2023 E PRECEDENTI

Le opere finanziate nell'anno 2023 e precedenti ed in corso di realizzazione nel 2024, escluse quelle rientranti nel PNRR e trattate in precedenza, ammontano a € 106.205.364,38 e riguardano le seguenti tipologie di lavori:

Tipologia Lavori	Importo	%
Manutenzione straordinaria	48.623.393,56	45,78%
Completamento Recupero Ristrutturazione Restauro	32.737.204,13	30,82%
Nuova Costruzione/Ampliamento	24.537.579,30	23,11%
Demolizione	307.187,39	0,29%
Totale	**106.205.364,38**	**100,00%**

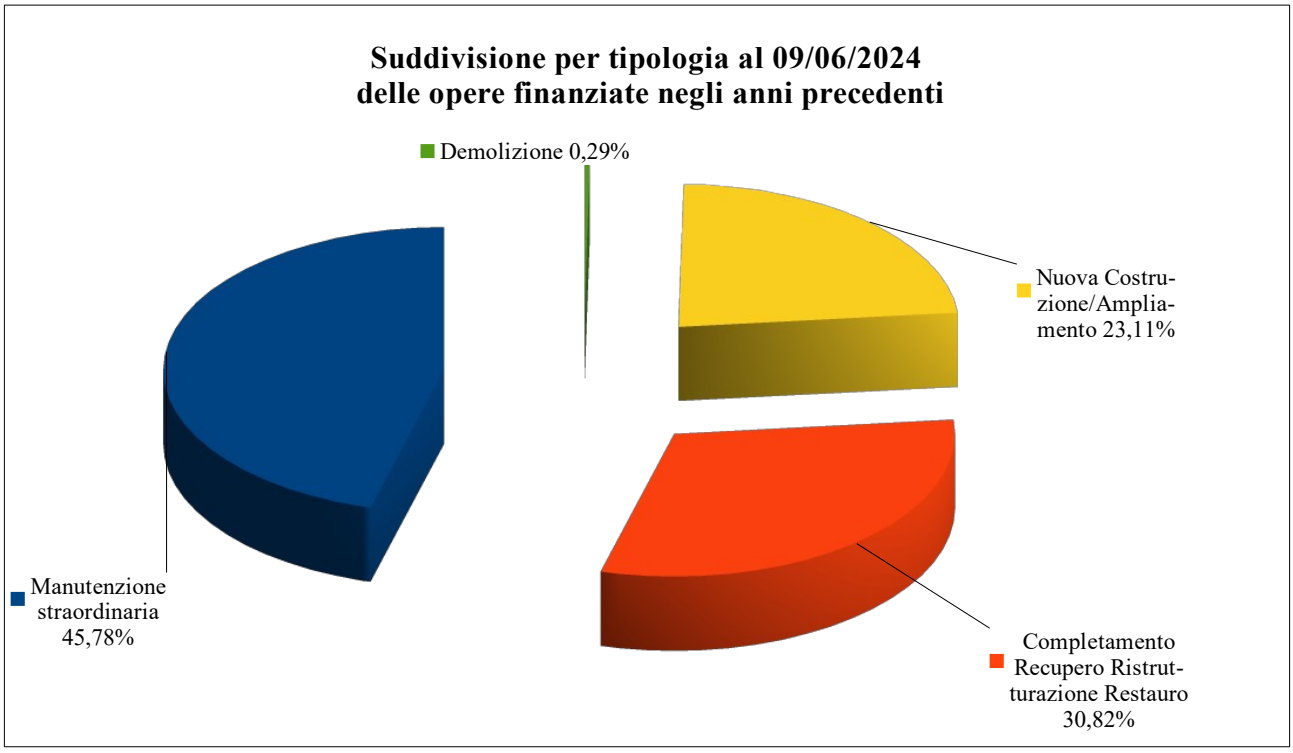

Le opere di **nuova costruzione/ampliamento** riguardano per il 31,75% le infrastrutture viarie, per il 36,68% gli edifici sportivi, per il 14,60% interventi vari per migliorare la vivibilità; per la restante parte gli edifici comunali (8,17%), gli edifici scolastici (7,78%) e il verde pubblico (1,02%).

Le opere di **completamento, ristrutturazione, recupero, restauro** sono relative alla sistemazione degli edifici monumentali (40,33%), alla riqualificazione degli edifici residenziali (14,72%) e del verde pubblico (11,30%), all'efficientamento degli impianti sportivi (10,13%), degli edifici comunali (10,35%) e scolastici (8,16%), mentre la parte restante riguarda il recupero delle infrastrutture stradali (3,64%) e di altre aree pubbliche (1,37%).

Le opere di **manutenzione straordinaria** sono inerenti alle infrastrutture viarie (40,37%), al verde pubblico (15,79%), all'edilizia comunale (13,30%) e al recupero dei beni monumentali (11,41%). Il resto è distribuito tra gli impianti sportivi (8,47%), l'edilizia scolastica (5,96%), la manutenzione degli edifici residenziali (4,07%) e altri interventi di miglioramento (0,63%).

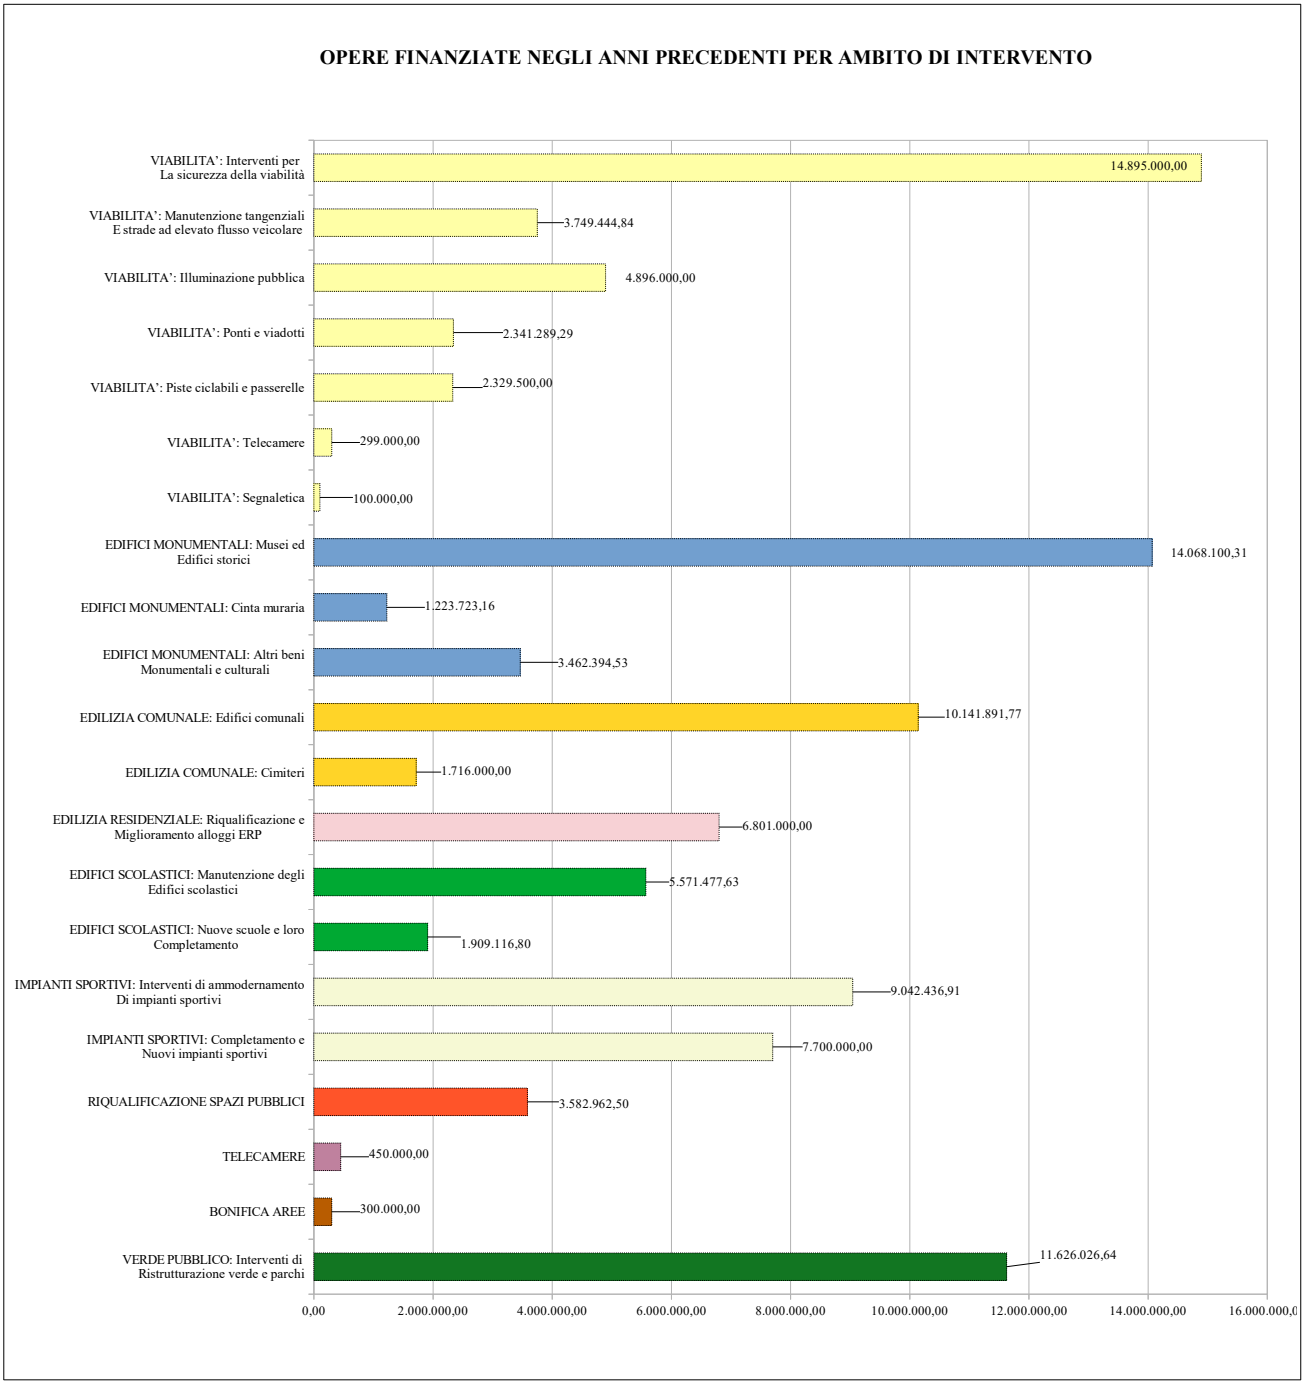

Alla fine del 2023 risultava già realizzato in media il 56,22% delle fasi nelle quali sono scomposte le opere; al 9 giugno si è raggiunto il 61,16%. In ogni caso va tenuto conto che per alcuni lavori di particolare complessità la fase di esecuzione si protrarrà oltre l'anno.

OPERE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI				
FASI	**01/01/2024**	**% TOTALE**	**09/06/2024**	**% TOTALE**
Progetto finanziato	11.484.133,50	10,81%	9.884.133,50	9,31%
Progetto approvato	20.027.721,22	18,86%	11.263.764,89	10,61%
Avvio procedura di gara	910.000,00	0,86%	8.984.796,33	8,46%
Appalto aggiudicato	7.342.743,11	6,91%	3.593.809,52	3,38%
Inizio dei lavori	36.502.223,91	34,37%	35.323.126,07	33,26%
Conclusione lavori	29.938.542,64	28,19%	27.730.331,92	26,11%
Collaudo	0,00	0,00%	9.425.402,15	8,87%
Totale	**106.205.364,38**	**100,00%**	**106.205.364,38**	**100,00%**

Dal monitoraggio sullo stato di avanzamento delle opere, si osserva che il 68,24% dell'importo dei lavori risulta cantierato e che il 34,98% è già stato ultimato (pari a € 37.155.734,07). Per alcune opere è conclusa anche la fase di collaudo. Va evidenziato, anche, che i lavori della maggior parte delle opere "più datate" sono già terminati e che una volta conclusa la procedura amministrativa collegata al collaudo, terminerà anche il loro monitoraggio.

Successivamente al paragrafo relativo all'elenco annuale 2024 è riportato il dettaglio di tutte le opere monitorate con il relativo stato di realizzo alla data del report.

OPERE FINANZIATE NEL 2024

Il 2024 è caratterizzato, come sopra descritto, dal forte impegno nell'ambito del PNRR, che vede il Comune di Padova beneficiario di un considerevole ammontare di risorse.

Fino al 09/06/2024 sono stati finanziati e approvati i progetti esecutivi delle seguenti opere previste nell'elenco annuale 2024:

- LLPP OPI 2024/013 Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni pedonali con eliminazione delle barriere architettoniche di euro 216.023,24;
- LLPP OPI 2024/008 Manutenzione straordinaria della pavimentazione di Ponte Darwin di euro 250.000,00.

e gli accordi quadro relativi ai seguenti lavori di carattere pluriennale:

- LLPP VER 2024/005 Cura e conservazione del patrimonio arboreo urbano I lotto, di cui euro 200.000,00 previsti nel 2024;
- LLPP VER 2024/005 001 Cura e conservazione del patrimonio arboreo urbano II lotto, di cui euro 100.000,00 previsti nel 2024;
- LLPP VER 2024/003 Interventi urgenti per la sicurezza e la conservazione del patrimonio arboreo urbano I lotto, di cui euro 400.000,00 previsti nel 2024;
- LLPP VER 2024/003 001 Interventi urgenti per la sicurezza e la conservazione del patrimonio arboreo urbano II lotto di cui euro 250.000,00 previsti nel 2024;
- LLPP VER 2024/003 002 Interventi urgenti per la sicurezza e la conservazione del patrimonio arboreo urbano III lotto, di cui euro 150.000,00 revisti nel 2024.

Come si evince dal grafico seguente tutte le opere sopra riportate risultano finanziate con fondi propri.

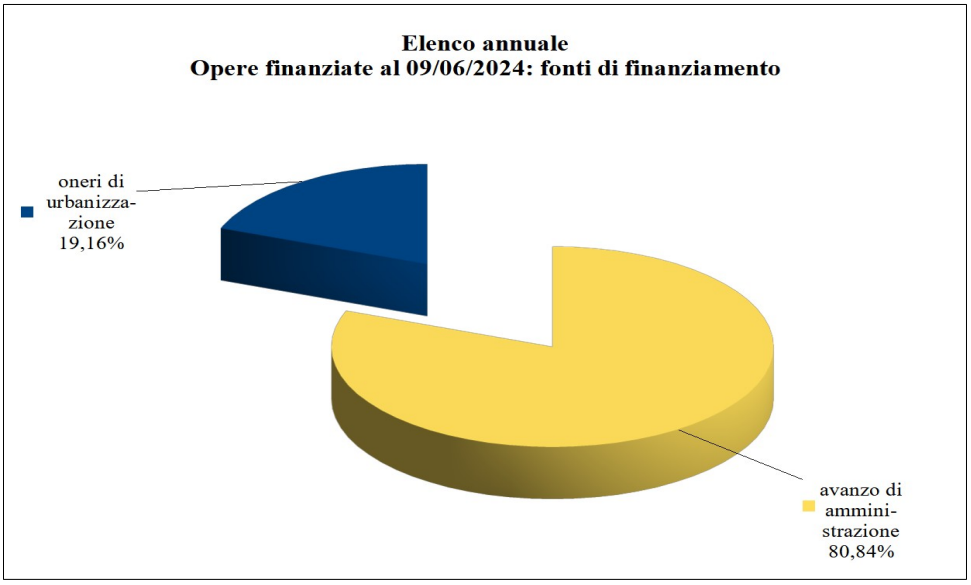

Al di fuori delle opere programmate, inoltre, sono stati finanziati nuovi interventi che si sono resi necessari in corso d'anno, per i quali non vi è l'obbligo dell'inserimento nell'elenco annuale, per un ammontare complessivo di € 1.110.908,92 così distribuiti fra i settori di intervento:

Codice int. Amm.ne	Descrizione	Importo progetto	Fase di realizzo
EDIFICI CIVICI			
LLPP EDP 2024/003 ONC	Manutenzione straordinaria per la sostituzione di tratti del collettore fognario a servizio degli Uffici Municipali di Palazzo Gozzi	29.878,92	Collaudo
LLPP EDP 2024/004 ONC	Intervento di messa in sicurezza area e fabbricati ex Amag in via J. Corrado.	50.000,00	Conclusione dei lavori
LLPP EDP 2024/010 ONC	Manutenzione annuale gruppi elettrogeni, pressurizzazione idrica antincendio e idrici di spegnimento.	150.000,00	Progetto approvato
LLPP EDP 2024/012 ONC	Manutenzione annuale presidi antincendio (estintori e idranti).	160.000,00	Progetto approvato
LLPP EDP 2024/015 ONC	Realizzazione rampa in Piazzetta Gasparotto	2.440,00	Collaudo
EDIFICI MONUMENTALI			
LLPP EDP 2023/080	Realizzazione banchina per barche elettriche presso parco Tito Livio	132.690,00	Progetto approvato
IMPIANTI SPORTIVI			
LLPP EDP 2024/001 ONC	Riqualificazione lato Sud Stadio Euganeo : sistemazione appoggio ovest trave in acciaio e prove di carico sulle strutture	88.000,00	Inizio dei lavori
EDIFICI SCOLASTICI			
LLPP EDP 2024/019 ONC	Lavori di somma urgenza nella sede del settore Servizi Scolastici in via Raggio di Sole	97.900,00	Progetto approvato
OPERE E MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI			
LLPP OPI 2024/002 ONC	Sistemazione area pedonale tra via Forcellini e via Prosdocimi	85.000,00	Progetto approvato
LLPP OPI 2024/004 ONC	Manutenzione straordinaria localizzata pavimentazioni in materiale lapideo.	180.000,00	Progetto approvato
LLPP OPI 2024/005 ONC	Eliminazione delle barriere architettoniche	120.000,00	Progetto approvato
VERDE PUBBLICO			
LLPP VER 2023/001 ONC	Totem park 2.0: intervento di manutenzione area Kobe Bryant	15.000,00	Appalto aggiudicato
	TOTALE	**1.110.908,92**	

MONITORAGGIO AL 09/06/2024
OPERE PUBBLICHE P.N.R.R.

Codice Opera	DESCRIZIONE	Importo progetto	Progetto finanziato	Progetto approvato	Avvio procedura di gara	Appalto aggiudicato	Inizio lavori	% realizz. (SAL)	Fine Lavori	Collaudo	% di realizzazione delle opere
Patrimonio Culturale											
LLPP EDP 2022/072	Next generation EU-Teatro Maddalene Via S. Giovanni da Verdara - Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di climatizzazione - interventi per l'ecoefficienza e riduzioni dei consumi energetici	279.064,87						100,00%			95%
LLPP EDP 2023/085	Rimozione delle barriere fisiche e cognitive del Museo Civico Eremitani	497.685,00									30%
Ciclovie urbane											
LLPP OPI 2020/032	Ciclovie Urbane	998.297,52						90,92%			100%
LLPP OPI 2021/021	In bici dalla Stazione all'Università	682.500,00									55%
LLPP OPI 2022/027	Rafforzamento mobilità ciclistica" – misura M2C2 del PNRR: 01. BikeNRG – via Lago Dolfin	948.906,97									50%
LLPP OPI 2022/029	Rafforzamento mobilità ciclistica" – misura M2C2 del PNRR: 03. BikeNRG – collegamenti e corsie	575.000,00						25,00%			55%
LLPP OPI 2022/028	Rafforzamento mobilità ciclistica" – misura M2C2 del PNRR: 02. BikeNRG – via Grassi/Rocco/Ippodromo	780.644,70									50%
Mense scolastiche per l'estensione del tempo pieno											
LLPP EDP 2022/053	Scuola Primaria MANIN – Nuova costruzione Mensa	523.496,56						30,81%			55%
LLPP EDP 2022/054	Scuola Primaria ROSMINI – Nuova costruzione Mensa	532.784,14									55%
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: asili nido											
LLPP EDP 2022/060	Asilo Nido Comunale SCRICCIOLO – Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza	755.099,84									55%
LLPP EDP 2022/062	Asilo Nido Comunale BERTACCHI – Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza	744.460,08									55%
LLPP EDP 2022/064	Asilo Nido Comunale LO SCARABOCCHIO – Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza	747.125,68									55%
LLPP EDP 2022/065	Asilo Nido Comunale TRENINO – Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza	747.115,68									55%
PinQua: Piano innovativo nazionale per la qualità dell'abitare											
LLPP EDP 2021/135	Riqualificazione di Piazza Azzurri d'Italia (programma PinQua A1)	545.000,00									50%
LLPP EDP 2021/136	Riqualificazione edificio ex Coni (programma PinQua A2)	7.000.000,00									40%
LLPP EDP 2021/137	Restauro e riqualificazione dell'Istituto ex-Configliachi (programma PinQua A3)	8.280.000,00									50%
LLPP EDP 2021/138	Efficientamento energetico del fabbricato ERP di 36 alloggi in via Duprè civ. 24 (programma PinQua A4)	847.500,00									50%
LLPP EDP 2021/139	Completamento opere di recupero dei fabbricati ERP di via Moretto da Brescia civ. 1–3–5–7–9–11–13–15–19–21–23 (programma PinQua A5)	1.010.000,00									50%
LLPP EDP 2021/140	Riqualificazione spazi aperti via Duprè Giardino dei Ciliegi e attivazione piastra pubblica polifunzionale (programma PinQua A6)	24.000,00						96,36%			100%
LLPP EDP 2021/141	Prosecuzione percorso ciclabile San Bellino (programma PinQua A7)	180.000,00									55%

MONITORAGGIO AL 09/06/2024
OPERE PUBBLICHE P.N.R.R.

Codice Opera	DESCRIZIONE	Importo progetto	Progetto finanziato	Progetto approvato	Avvio procedura di gara	Appalto aggiudicato	Inizio lavori	% realizz. (SAL)	Fine Lavori	Collaudo	% di realizzazione delle opere
LLPP EDP 2021/142	Miglioramento accesso alle scuole quartiere Arcella (programma PinQua A8)	60.000,00						100,00%			100%
LLPP EDP 2021/143	Percorso sportivo scuola Briosco – Scuola Donatello – Riqualificazione spazi aperti Piazzale Azzurri d'Italia (programma PinQua A9)	60.000,00						100,00%			95%
LLPP EDP 2021/144	Realizzazione accesso cat// scuola Donatello (programma PinQua A10)	18.000,00						100,00%			100%
LLPP EDP 2021/145	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di alloggi ERP via santa Cabrini cv. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (programma PinQua A11)	8.569.999,57									50%
LLPP EDP 2021/146	Demolizione fabbricato esistente ex centro anziani per nuova costruzione fabbricato con ricavo due alloggi ERP, per categorie protette (programma PinQua A12)	646.615,00									40%
	Sport e inclusione sociale										
LLPP EDP 2022/068	Cittadella dello sport "Valsugana": campo rugby in erba naturale con tribuna, spogliatoi, campo da calcio e rugby in erba artificiale - PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione Sociale, Cluster 1 e 2 finanziato dall'Unione Europea next genereration EU	4.290.000,00									50%
LLPP EDP 2022/069	Rigenerazione del Palazzetto dello Sport San Lazzaro - PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione Sociale, Cluster 1 e 2 finanziato dall'Unione Europea next genereration EU"	2.860.000,00									50%
	Rigenerazione urbana										
LLPP EDP 2021/090	Costruzione nuova aula polivalente c/o la scuola primaria Lombardo-Radice in via Ciamician n. 3 (Progetti di rigenerazione urbana n. 11)	550.000,00									55%
LLPP EDP 2021/102	Restauro dell'ala Nord del Castello dei Carraresi (Progetti di rigenerazione urbana n. 10)	5.300.000,00									50%
LLPP EDP 2021/103	Palaghiaccio/Plebiscito: completamento del primo piano (Progetti di rigenerazione urbana n. 12)	588.619,36						23,47%			55%
LLPP EDP 2021/104	Nuovo campo in erba artificiale "Sacra Famiglia" (Progetti di rigenerazione urbana n. 13)	500.000,00						100,00%			95%
LLPP EDP 2021/105	Attività sportiva all'aperto in quartiere: Piastre Polivalenti (Progetti di rigenerazione urbana n. 14)	580.000,00						23,99%			55%
LLPP EDP 2021/107	Ristrutturazione di 3 alloggi ERP in via Boyle civ. 2 e via Curie civv. 25 e 28 a Padova (Progetti di rigenerazione urbana n. 16)	431.280,65						25,25%			55%
LLPP OPI 2021/093	Mobilita' Sostenibile Bicipolitana Mura Nord (Progetti di rigenerazione urbana n. 1)	730.451,20						33,71%			55%
LLPP OPI 2021/094	Mobilita' Sostenibile Bicipolitana Mura Ovest (Progetti di rigenerazione urbana n. 2)	814.771,62						32,56%			55%
LLPP OPI 2021/095	Mobilita' Sostenibile Bicipolitana 4 Chiesanuova (Progetti di rigenerazione urbana n. 3)	509.654,80						33,18%			55%
LLPP OPI 2021/097	Mobilita' Sostenibile Accessibilità Paleocapa (Progetti di rigenerazione urbana n. 5)	2.310.000,00						14,18%			55%
LLPP OPI 2021/098	Mobilita' Sostenibile Bicipolitana Mura Sud – Tratto Mandria Bassanello (Progetti di rigenerazione urbana n. 6)	2.348.258,82									50%
LLPP OPI 2021/099	Mobilita' Sostenibile Riqualificazione 58° Fanteria (Progetti di rigenerazione urbana n. 7)	1.007.825,34									55%
LLPP OPI 2021/100	Mobilita' Sostenibile Bicipolitana Mura Sud-Est (Progetti di rigenerazione urbana n.8)	969.329,43						33,65%			55%
LLPP OPI 2021/101	Mobilita' Sostenibile Riqualificazione Pontecorvo-Bicipolitana 12a Facciolati (Progetti di rigenerazione urbana n.9)	961.250,74						42,11%			55%
LLPP VER 2021/108	Riqualificazione ed ampliamento Parco Iris. Primo stralcio (Progetti di rigenerazione urbana n. 17)	2.000.000,00									55%

MONITORAGGIO AL 09/06/2024
OPERE PUBBLICHE P.N.R.R.

Codice Opera	DESCRIZIONE	Importo progetto	Progetto finanziato	Progetto approvato	Avvio procedura di gara	Appalto aggiudicato	Inizio lavori	% realizz. (SAL)	Fine Lavori	Collaudo	% di realizzazione delle opere
LLPP EDP 2021/106	Ristrutturazione di un fabbricato ERP di 6 alloggi in via Pizzamano civ. 34 (Progetti di rigenerazione urbana n. 15)	720.591,81									55%
LLPP EDP 2021/109	Sistemazione aree esterne Liceo Artistico Pietro Selvatico Padova (Progetti di rigenerazione urbana n. 18)	500.000,00									50%
LLPP OPI 2021/096	Mobilita' Sostenibile Bicipolitana 5 Colli (Progetti di rigenerazione urbana n. 4)	712.946,87									55%
	Centri Servizi per contrasto alla povertà estrema										
LLPP EDP 2022/078	NGEU M5C2I1.3.2 SDP2 Centri Servizi – Stazioni di Posta: Ristrutturazione con efficientamento energetico ex Gabelli e Casetta Eremitano	910.000,00									30%
LLPP EDP 2023/083	NGEU M5C2I1.3.1 Centri Servizi – HOUSING FIRST: Miglioramento funzionale edificio in Via Rovereto	165.000,00						56,25%			55%
	Politiche del lavoro										
LLPP EDP 2024/052	"PNRR – Missione 5 Componente 1 Politiche del lavoro, Investimento 1.1 – Potenziamento dei centri per l'impiego – Riqualificazione immobile di Corso Stati Uniti"	550.000,00									10%
	ex PNRR: Illuminazione Pubblica										
LLPP EDP 2020/091	PNRR M2C4I2.2-A – Efficientamento di alcuni impianti di illuminazione pubblica	149.310,10						100,00%			100%
LLPP EDP 2021/088	Efficientamento energetico di alcuni Impianti di illuminazione pubblica	152.141,28						89,64%			100%
LLPP EDP 2021/088-001	Efficientamento energetico di alcuni Impianti di illuminazione pubblica – LOTTO 2	154.647,41						90,64%			100%
LLPP EDP 2022/067	Efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione Pubblica-NextGeneratioEU	210.000,00						100,00%			95%
LLPP EDP 2023/068	Efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione Pubblica-NextGeneratioEU	210.000,00						100,00%			95%
LLPP EDP 2023/069	Efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione Pubblica-NextGeneratioEU	210.000,00									10%
	ex PNRR: Messa in sicurezza edifici e territorio										
LLPP OPI 2020/044	Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – Recupero strutturale del Ponte sul Bacchiglione in Corso Kennedy/Corso Esperanto	1.119.906,54						95,00%			95%
LLPP OPI 2020/045	Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – interventi manutentivi sui ponti cittadini in muratura	985.709,60						65,09%			55%
LLPP OPI 2020/046	Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – interventi manutentivi sui ponti cittadini in c.a. e acciaio	980.000,00									55%
LLPP OPI 2020/047	Manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza di tratti di viabilità – ripristino e sostituzione dei giunti di dilatazione in corrispondenza di ponti e cavalcavia con messa in sicurezza idraulica degli impalcati	560.000,00						99,94%			95%
LLPP OPI 2020/048	Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – Recupero strutturale del Ponte Paleocapa	880.000,00									55%
LLPP OPI 2020/043	Intervento preventivo in aree a elevato rischio idraulico – Realizzazione invasi di laminazione bacino Brusegana – C.so Australia	785.000,00						88,36%			95%
	Totale	72.759.991,18									

MONITORAGGIO AL 09/06/2024
OPERE PUBBLICHE DEGLI ELENCHI ANNUALI PRECEDENTI IL 2024

Codice Opera	DESCRIZIONE	Importo progetto	Progetto finanziato	Progetto approvato	Avvio procedura di gara	Appalto aggiudicato	Inizio lavori	% realizz. (SAL)	Fine Lavori	Collaudo	% di realizzazione delle opere
2014											
LLPP EDP 2014/053-002	Interventi vari di trasformazione e ampliamento delle cabine elettriche degli edifici comunali	30.000,00						45,10%			55%
LLPP EDP 2014/058 -002	Completamento adeguamento norme prevenzione incendi scuola Briosco e altri plessi	100.000,00						98,40%			95%
2015											
LLPP EDP 2015/043-007	Manutenzione straordinaria dei servizi igienici delle scuole primarie Rosmini, Forcellini, Valeri e della scuola secondaria di primo grado Zanella	305.239,76						99,87%			95%
LLPP EDP 2015/052-002	Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le scuole Colibri'/Peter Pan, Sacro Cuore, Salvo D'Acquisto/Quadrifoglio, Forcellini, Prati, Deledda, Copernico, Levi Civita	350.000,00						99,99%			95%
LLPP EDP 2015/052-003	Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole primarie Carraresi e Cesarotti	200.000,00						17,50%			95%
2016											
LLPP EDP 2016/002	Riqualificazione area di P.le Boschetti	3.582.962,50						99,13%			95%
LLPP EDP 2016/013	Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere	146.534,23						99,99%			95%
LLPP EDP 2016/084	Rifacimento parziale impianti elettrici palazzo Moroni-Scarpari, Cattedrale ex Macello via Cornaro, Loggia e Odeo Cornaro	90.000,00						99,35%			95%
LLPP OPI 2016/003	Strada di collegamento Peep via del Commissario	480.000,00						100,00%			95%
LLPP OPI 2016/050	Arco di Giano II^ fase variante di via Friburgo I lotto collegamento cavalcavia San Marco	3.100.000,00						86,28%			95%
2017											
LLPP EDP 2017/033 ONC	Realizzazione di nuova segnaletica turistica/monumentale nell'ambito della valorizzazione della Urbs Picta	60.000,00						99,97%			100%
LLPP EDP 2017/035	Cimitero Maggiore. Realizzazione nuova rete idrica	250.000,00						99,81%			95%
LLPP EDP 2017/036 ONC	Lavori di messa in sicurezza del fabbricato denominato “la casa medievale” posto all'angolo tra via S.Lucia e via Boccalerie	16.661,89						71,53%			95%
LLPP EDP 2017/092	Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi asili nido Bruco, Arcobaleno, Sacra Famiglia, Trottola	150.000,00						98,96%			95%
LLPP EDP 2017/095	Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le scuole Colibri'/Peter Pan – Sacro Cuore - Salvo d'Acquisto/Quadrifoglio - Forcellini - Prati	250.000,00						13,69%			95%
LLPP OPI 2017/042-004	Manutenzione ed incremento del Patrimonio arboreo parchi storici – terzo lotto	300.000,00						99,99%			95%
2018											
LLPP EDP 2018/022	Nuovo pacchetto di pavimentazione e isolamento, copertura dell'autorimessa interrata via Pinelli.	150.000,00						99,57%			95%
LLPP EDP 2018/034	Corte Ca' Lando. Restauro conservativo delle facciate e della copertura delle case popolari quattrocentesche di Padova.	550.000,00						100,00%			95%
LLPP EDP 2018/042	Manutenzione straordinaria impianti antincendio (lotti)	150.000,00						86,14%			95%
LLPP EDP 2018/115-002	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo sui beni monumentali – 3 °lotto – opere da restauratore	65.000,00						49,43%			95%
LLPP EDP 2018/116	Area ex Macello: Manutenzione straordinaria dell'ex fabbricato suini e delle coperture del fabbricato ex Lanuti	300.000,00						99,98%			95%
LLPP OPI 2018/006	Sistemazione area tra le vie Tartaglia Dini Dal Piaz.	350.000,00						79,16%			95%
LLPP OPI 2018/037	Interventi di decoro urbano - cancellazione scritte murali e manutenzione segnaletica verticale (in lotti)	100.000,00						100,00%			95%
LLPP EDP 2018/086	Bastioni e quinte murarie LOTTO 4 - Parco delle Mura, Illuminazione architettonica PIANO PERIFERIE	1.223.723,16						51,81%			55%
LLPP EDP 2018/135	Ampliamento scuola secondaria di primo grado G. Galilei. PIANO PERIFERIE	1.489.700,00						99,99%			95%
LLPP EDP 2018/137	Castello Carraresi. Intervento di restauro e riqualificazione funzionale Stralci PIANO PERIFERIE	6.167.996,82						32,36%			55%
2019											
LLPP EDP 2019/002	Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionamento Edifici comunali	200.000,00						99,48%			95%
LLPP EDP 2019/013 ONC	Nuove telecamere di videosorveglianza quartieri 1-2-3. Piazza De Gasperi, via Perosi, Piazza della Vecchia e Parco delle Farfalle	150.000,00						99,56%			100%
LLPP EDP 2019/015 ONC	Lavori urgenti di adeguamento edifici comunali - Opere da elettricista	21.350,00						0,00%			95%
LLPP EDP 2019/016	Ristrutturazione ex Marchesi viale Arcella per sede decentrata	600.000,00						99,97%			95%
LLPP EDP 2019/035	Recupero manti di copertura e nuova impermeabilizzazione via Bajardi case in linea, via Morandini civ. 6 e altri fabbricati ERP.	200.000,00						97,00%			95%
LLPP EDP 2019/050	Lavori vari di manutenzione nei complessi cimiteriali	200.000,00						100,00%			95%
LLPP EDP 2019/064	Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e civici	100.000,00						99,95%			100%
LLPP EDP 2019/076-001	Adeguamento normativo degli impianti sportivi cittadini per ottenimento C.P.I. e illuminazione arcieri parco Brentelle – lotto 2: opere da idraulico	100.000,00						99,88%			95%
LLPP EDP 2019/138-002	Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione barriere architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido – assistenza indagini	50.000,00						0,00%			95%

MONITORAGGIO AL 09/06/2024
OPERE PUBBLICHE DEGLI ELENCHI ANNUALI PRECEDENTI IL 2024

Codice Opera	DESCRIZIONE	Importo progetto	Progetto finanziato	Progetto approvato	Avvio procedura di gara	Appalto aggiudicato	Inizio lavori	% realizz. (SAL)	Fine Lavori	Collaudo	% di realizzazione delle opere
LLPP EDP 2019/163	Stadio Euganeo 1° stralcio: costruzione del nuovo Palazzetto per i Basket e parte della nuova Curva Fattori	3.028.970,35						38,90%			55%
LLPP EDP 2019/164	Stadio Euganeo 2° stralcio: costruzione del nuovo Palazzetto Polifunzionale e parte della nuova Curva Fattori	2.880.349,01						76,51%			55%
LLPP EDP 2019/165	Stadio Euganeo 3° stralcio: riqualificazione delle tribune	1.290.680,64						59,62%			55%
LLPP OPI 2018/055	Parco del Basso Isonzo e rustico di via Bainsizza. PIANO PERIFERIE	238.516,44						99,98%			100%
LLPP OPI 2019/014	Nuova passerella ciclopedonale Voltabrusegana	300.000,00						100,00%			95%
LLPP OPI 2019/022	PUMS - interventi di moderazione del traffico	150.000,00						100,00%			95%
LLPP OPI 2019/026	Barriere metalliche nella tangenziale	999.444,84						69,06%			95%
LLPP VER 2019/006	Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo nelle aree verdi (in lotti)	400.000,00						36,75%			100%
LLPP EDP 2019/061	Manutenzione straordinaria porte tagliafuoco e maniglioni antipanico edifici comunali e impianti sportivi	100.000,00						68,70%			100%
	2020										
LLPP EDP 2020/016	Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e civici	150.000,00						97,47%			95%
LLPP EDP 2020/018 ONC	Installazione impianti di condizionamento asili nido Scarabocchio, Scricciolo e Trenino	60.951,20						100,00%			95%
LLPP EDP 2020/025	Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionamento Edifici comunali	130.000,00						99,20%			100%
LLPP EDP 2020/028	Ristrutturazione ex magazzini frigoriferi di C.so Australia per magazzini – completamento opere	300.000,00						99,98%			95%
LLPP EDP 2020/037	Risanamento conservativo di n. 4 alloggi siti in via Plana civ. 4 e via Curie civv. 35-43-45	445.000,00						0,00%			55%
LLPP EDP 2020/043	Manutenzione impianti sportivi cittadini – Opere edili	190.000,00						74,55%			55%
LLPP EDP 2020/043-001	Manutenzione impianti sportivi cittadini – Opere di impermeabilizzazione	160.000,00						99,85%			95%
LLPP EDP 2020/055	Manutenzione straordinaria degli impianti meccanici dei musei agli Eremitani e della sede di via Porciglia.	1.246.000,00						100,00%			95%
LLPP EDP 2020/073	Nuovo plesso scolastico “il Girotondo” e demolizione dell’esistente	1.909.116,80									55%
LLPP EDP 2020/081	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici monumentali e altri	125.000,00						99,99%			95%
LLPP EDP 2020/082	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici civici e altri	125.000,00						100,00%			95%
LLPP EDP 2020/083	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli impianti sportivi	150.000,00						87,63%			95%
LLPP EDP 2020/088	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici scolastici e altri	150.000,00						99,88%			100%
LLPP EDP 2020/092	Arcostruttura di via Luisari: adeguamento energetico e nuovi spogliatoi	1.250.000,00						20,06%			55%
LLPP EDP 2020/096	Ex Ostello della Gioventù – Risanamento conservativo degli interni	275.000,00									50%
LLPP OPI 2019/011	Opere di riqualificazione urbana - Spazi urbani dei quartieri	1.000.000,00						92,24%			95%
LLPP OPI 2019/045	Soppressione passaggio a livello via Gramsci	600.000,00						88,24%			95%
LLPP OPI 2020/009-002	Rifacimento di marciapiedi cittadini – Lotto 2 – zona Nord -Ovest	286.000,00						78,30%			100%
LLPP OPI 2020/024	Sistemazione di ponti in muratura (Via Giotto, via Cornaro,ed altri)	250.000,00						98,63%			95%
LLPP OPI 2020/025	Sistemazione ponti in c.a. (Ponte Ognissanti, Cavalcaferrovia Camerini, Corso Esperanto su Bacchiglione)	250.000,00						0,00%			95%
LLPP OPI 2020/029	Opere complementari per nuova passerella ciclopedonale sul fiume Bacchiglione a Voltabrusegana	200.000,00						100,00%			100%
LLPP OPI 2020/031	Manzoni e Pontecorvo – Interventi per la sicurezza	600.000,00						89,25%			95%
LLPP OPI 2020/033	Opere stradali a servizio della sicurezza della circolazione - Piazza Mazzini	500.000,00						84,70%			95%
LLPP OPI 2020/042	Riqualificazione vie Grassi/Maroncelli	250.000,00						99,86%			95%
LLPP VER 2020/004	Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo urbano nelle aree verdi Lotto 1	200.000,00						99,37%			95%
LLPP VER 2020/010	Sostituzione e messa dimora di nuove alberature (in lotti) Lotto 1	200.000,00						99,91%			95%
	2021										
LLPP EDP 2021/002	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici civici e altri	100.000,00						54,76%			95%
LLPP EDP 2021/003	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici scolastici e altri	86.058,60						99,73%			100%
LLPP EDP 2021/004	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli impianti sportivi	100.000,00						93,39%			95%
LLPP EDP 2021/005	Interventi di consolidamento e indagini edifici civici, scuole e ponti Comunali	100.000,00						99,97%			55%

MONITORAGGIO AL 09/06/2024
OPERE PUBBLICHE DEGLI ELENCHI ANNUALI PRECEDENTI IL 2024

Codice Opera	DESCRIZIONE	Importo progetto	Progetto finanziato	Progetto approvato	Avvio procedura di gara	Appalto aggiudicato	Inizio lavori	% realizz. (SAL)	Fine Lavori	Collaudo	% di realizzazione delle opere
LLPP EDP 2021/007	Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere	100.000,00						99,76%			95%
LLPP EDP 2021/010	Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti termici/condizionamento Edifici comunali	173.000,00						84,58%			95%
LLPP EDP 2021/010 ONC	Lavori di riqualificazione delle sale della "Croce di Giotto" e delle opere coeve del Museo Eremitani – opere edili	38.249,16						80,58%			95%
LLPP EDP 2021/012 ONC	Completamento opere di miglioramento funzionale e adeguamento normativo di alcuni edifici comunali	95.000,00						93,07%			95%
LLPP EDP 2021/013 ONC	Manutenzione straordinaria sedi varie Settore Servizi Sociali.	125.000,00						95,82%			95%
LLPP EDP 2021/014	Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali	98.134,34						100,00%			100%
LLPP EDP 2021/014 ONC	Stadio Euganeo: ripristino del collegamento di linea interrata per gas metano	39.600,00						0,00%			100%
LLPP EDP 2021/016 ONC	Manutenzione straordinaria dei magazzini comunali	65.000,00						0,00%			95%
LLPP EDP 2021/018 ONC	Manutenzione straordinaria al Cimitero Maggiore, opere di asfaltatura	190.000,00						99,99%			100%
LLPP EDP 2021/020	Sistemazione aree esterne pertinenza edifici pubblici	100.000,00						94,81%			95%
LLPP EDP 2021/020 ONC	Manutenzione straordinaria cimiteri cittadini: sistemazione vasche ornamentali al cimitero di Voltabarozzo	60.000,00						0,00%			95%
LLPP EDP 2021/027	Risanamento conservativo di n. 3 alloggi siti in via Curie civv. 18-20-22.	315.000,00						93,59%			100%
LLPP EDP 2021/028	Risanamento conservativo di n. 3 alloggi siti in via Boyle civv. 4-8-10.	365.000,00						84,03%			100%
LLPP EDP 2021/029	Risanamento conservativo di n. 8 alloggi siti in via Armistizio civ. 245.	800.000,00						57,87%			55%
LLPP EDP 2021/030	Risanamento conservativo di n. 6 alloggi siti in via Ceron civ. 38.	675.000,00						79,02%			55%
LLPP EDP 2021/033	Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini	200.000,00						48,35%			55%
LLPP EDP 2021/036	Adeguamento normativo degli impianti sportivi cittadini per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi LOTTO 1- opere da fabbro	49.000,00						99,00%			95%
LLPP EDP 2021/036-001	Adeguamento normativo degli impianti sportivi cittadini per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi LOTTO 2- opere di idraulico	51.000,00						99,84%			100%
LLPP EDP 2021/046	Restauro della Torre degli Anziani	1.500.000,00						25,95%			55%
LLPP EDP 2021/052	Adeguamento normativo per ottenimento CPI Edifici Monumentali	100.000,00						99,97%			100%
LLPP EDP 2021/058	Restauro della statuaria Complesso Monumentale di Prato della Valle – 6 Lotto Statue 24-2+6-69-70-71-72-73-75-76 – Dante, Giotto – Obelischi 33-34-77-78	196.420,00						99,99%			100%
LLPP EDP 2021/066	Ristrutturazione servizi igienici presso scuole secondaria Carazzolo, primarie Santa Rita, Randi e Manin.	300.000,00						73,26%			95%
LLPP EDP 2021/085	Ristrutturazione con adeguamento energetico dell'arcostruttura di via Bonardi	235.000,00						100,00%			100%
LLPP EDP 2021/086	Ristrutturazione con adeguamento energetico dell'arcostruttura di via Ca' Rasi	280.000,00						100,00%			100%
LLPP EDP 2021/087	Ristrutturazione con adeguamento energetico dell'arcostruttura di via Gozzano	235.000,00						100,00%			100%
LLPP EDP 2021/089	Ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario	1.300.000,00									55%
LLPP EDP 2021/092	Area Sportiva Toni Franceschini (via Attendolo)	1.600.000,00									10%
LLPP EDP 2021/113	Riatto di 9 alloggi di ERP nel Comune di Padova. Lotto 2	135.000,00						40,41%			95%
LLPP EDP 2021/114	Messa a norma impianti elettrici e opere di idraulico in vari alloggi ERP	115.000,00						99,92%			95%
LLPP EDP 2021/115	Recupero alloggi di ERP. Ristrutturazione interna ed esterna	120.000,00						98,47%			100%
LLPP EDP 2021/116	Manutenzione straordinaria nei cimiteri cittadini	232.000,00						99,97%			95%
LLPP EDP 2021/117	Realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido	250.000,00						87,75%			95%
LLPP EDP 2021/118	Ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario – Opere di Completamento	200.000,00									55%
LLPP EDP 2021/119	Bonifica elementi contenenti amianto plesso scolastico Girotondo	232.682,18						99,95%			100%
LLPP EDP 2021/120	Recupero alloggi ERP - Lotto 1	150.000,00						98,10%			100%
LLPP EDP 2021/122	Recupero alloggi ERP - Lotto 3	150.000,00						99,88%			95%

MONITORAGGIO AL 09/06/2024
OPERE PUBBLICHE DEGLI ELENCHI ANNUALI PRECEDENTI IL 2024

Codice Opera	DESCRIZIONE	Importo progetto	Progetto finanziato	Progetto approvato	Avvio procedura di gara	Appalto aggiudicato	Inizio lavori	% realizz. (SAL)	Fine Lavori	Collaudo	% di realizzazione delle opere
LLPP EDP 2021/126	Stadio Euganeo: opere complementari di riqualificazione	250.000,00									30%
LLPP EDP 2021/127	Ampliamento reti dati per la cablatura delle aule degli edifici scolastici e degli asili nido	200.000,00						33,28%			55%
LLPP EDP 2021/128	Rifacimento della pista di Atletica a Voltabarozzo	600.000,00						40,69%			55%
LLPP EDP 2021/129	Ex Macello di via Cornaro - Restauro del fabbricato dei Servizi Accessori	568.719,00									40%
LLPP EDP 2021/130	Efficientamento e manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	4.636.000,00									30%
LLPP EDP 2021/131	Rifacimento illuminazione sottoportici del centro storico	200.000,00						95,02%			55%
LLPP EDP 2021/132-001	Manutenzione straordinaria immobili monumentali. Opere da restauratore	50.000,00						99,97%			95%
LLPP EDP 2021/133	Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli stabili comunali	500.000,00									30%
LLPP EDP 2021/134	Restauro delle gallerie del cimitero maggiore	245.000,00									50%
LLPP OPI 2020/021	Manutenzione straordinaria e pittura dei Ponti Quattro Martiri e Voltabarozzo – primo intervento p.te Voltabarozzo	581.289,29									55%
LLPP OPI 2021/002 ONC	Pronto intervento a supporto della sicurezza urbana	100.000,00						99,96%			95%
LLPP OPI 2021/003	Pista ciclabile Corso Milano	500.000,00									30%
LLPP OPI 2021/004	Pista ciclabile via Gattamelata	300.000,00						91,12%			95%
LLPP OPI 2021/004 ONC	Playground Mandria	50.000,00									100%
LLPP OPI 2021/014	Recupero cavalcavia Borgomagno	840.000,00						74,44%			55%
LLPP OPI 2021/015	Realizzazione di barriere fonoassorbenti in via Friburgo	860.000,00						80,36%			55%
LLPP OPI 2021/016	Opere complementari dell'intervento di via Tartaglia, Dini, Dal Piaz	200.000,00						96,73%			95%
LLPP OPI 2021/017	Opere complementari via Maroncelli da via Friburgo a via Grassi	100.000,00						90,14%			95%
LLPP OPI 2021/022	Cammin Facendo nuove ciclabili casa-lavoro	387.000,00						89,94%			100%
LLPP OPI 2021/023	Parco San Carlo Borromeo	1.200.000,00						99,97%			95%
LLPP OPI 2021/024	Messa a norma delle barriere metalliche nella tangenziale sud-est	600.000,00									55%
LLPP OPI 2021/025-001	Manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso lotto 1- tangenziali e bretelle di collegamento	1.000.000,00						98,25%			100%
LLPP OPI 2021/025-003	Manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso LOTTO 3- strade ad elevato flusso veicolare- zona sud	650.000,00						100,00%			100%
LLPP OPI 2021/025-006	Manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso LOTTO 6- viabilità interquartiere Sud	500.000,00						91,42%			100%
LLPP OPI 2021/026-001	Manutenzione straordinaria delle strade in materiale lapideo con abbattimento barriere architettoniche lotto 1-comparto piazze	500.000,00						92,86%			100%
LLPP OPI 2021/026-002	Manutenzione straordinaria delle strade in materiale lapideo con abbattimento barriere architettoniche 2- centro storico zona est	500.000,00						26,23%			55%
LLPP OPI 2021/027-001	Manutenzione straordinaria marciapiedi in asfalto con abbattimento delle barriere architettoniche – Lotto 1 – zona Nord -Est	487.000,00						94,45%			100%
LLPP OPI 2021/027-002	Manutenzione straordinaria marciapiedi in asfalto con abbattimento delle barriere architettoniche – Lotto 2 – zona Sud -Ovest	552.000,00						100,00%			100%
LLPP OPI 2021/029	Manutenzione straordinaria delle strade bianche Anno 2021	200.000,00						97,79%			95%
LLPP OPI 2021/030	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto anno 2021	200.000,00						99,98%			100%
LLPP OPI 2021/031	Demolizione della gradinata est dello Stadio Appiani	307.187,39						97,55%			95%
LLPP OPI 2021/032	Realizzazione infrastrutture ed apparecchi per videosorveglianza presso parchi e aree comunali – anno 2021	300.000,00						52,07%			55%
LLPP VER 2021/003	Rotatorie stradali realizzazione e manutenzione straordinaria dell'arredo verde	100.000,00						49,36%			100%
LLPP VER 2021/004	Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo urbano nelle aree verdi	200.000,00						93,27%			95%
LLPP VER 2021/017	Messa a dimora di 10.000 alberi per Padova	2.800.000,00						69,61%			55%
LLPP VER 2021/019	Restauro dei Giardini della Rotonda	300.000,00						99,99%			100%
LLPP VER 2021/025	Parco inclusivo sensoriale di via Siena - stralcio IV° lotto	460.000,00						52,19%			55%
LLPP VER 2021/027-001	Cura e conservazione del patrimonio arboreo lotto 1- alberature stradali	200.000,00						99,97%			95%

MONITORAGGIO AL 09/06/2024
OPERE PUBBLICHE DEGLI ELENCHI ANNUALI PRECEDENTI IL 2024

Codice Opera	DESCRIZIONE	Importo progetto	Progetto finanziato	Progetto approvato	Avvio procedura di gara	Appalto aggiudicato	Inizio lavori	% realizz. (SAL)	Fine Lavori	Collaudo	% di realizzazione delle opere
2022											
LLPP EDP 2022/001	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici civici e altri	100.000,00									55%
LLPP EDP 2022/004	Manutenzione straordinaria cabine	50.000,00									50%
LLPP EDP 2022/005 ONC	Nuova illuminazione-dmx del Palazzetto dello Sport San Lazzaro	60.000,00						100,00%			100%
LLPP EDP 2022/006	Manutenzione presidi antincendio	100.000,00						99,97%			95%
LLPP EDP 2022/006 ONC	Stadio Euganeo. Adeguamento impianto di videosorveglianza	111.000,00						41,24%			55%
LLPP EDP 2022/010	Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali	100.000,00						100,00%			95%
LLPP EDP 2022/013	Manutenzione straordinaria ascensori comunali.	120.000,00						100,00%			95%
LLPP EDP 2022/030	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici monumentali e altri	100.000,00									50%
LLPP EDP 2022/066	Musei Civici Eremitani-Lavori di messa in sicurezza delle sale espositive, di adeguamento dell'accessibilità e di aggiornamento dei sistemi multimediali	1.000.000,00						59,34%			55%
LLPP EDP 2022/073	Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini. Nuova illuminazione	500.000,00									50%
LLPP EDP 2022/074	Riqualificazione delle centrali termiche delle scuole primaria Rodari e secondaria Donatello	222.050,95						100,00%			95%
LLPP EDP 2022/075	Riqualificazione del fabbricato in via Stella 2-4 e via Stella 2A-6 (ex vicolo Pastori 18-20)	1.140.000,00									10%
LLPP EDP 2022/076	Riqualificazione del fabbricato in via Stella 8A-8B (ex vicolo Pastori 14-16)	860.000,00									10%
LLPP EDP 2022/077	Manutenzione straordinaria e restauro beni monumentali	150.000,00						100,00%			95%
LLPP EDP 2022/079	Completamento delle palestre lato sud dello Stadio Euganeo	1.800.000,00									10%
LLPP EDP 2022/080	Realizzazione nuovi ossari cittadini	304.000,00									55%
LLPP EDP 2022/081	Completamento della bonifica ambientale e messa in sicurezza del Castello dei Carraresi	400.000,00									10%
LLPP EDP 2022/082	Manutenzione straordinaria di Palazzo del Capitanio	239.312,64									30%
LLPP OPI 2022/024	Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano – Anno 2022	230.000,00						99,91%			95%
LLPP OPI 2022/026	Bonifica via Trieste ex-CLEDCA	300.000,00						97,13%			95%
LLPP OPI 2022/034	Realizzazione infrastrutture ed apparecchi video sorveglianza presso parchi ed aree comunali - II Stralcio	299.000,00									55%
LLPP OPI 2022/035	Via Armistizio e via Vigonovese: interventi per la sicurezza stradale	700.000,00									30%
LLPP VER 2021/024	Opere per la riduzione dell'isola di calore e mitigazione eventi meteo estremi via Savelli-via Croce Rossa	729.000,00						84,98%			55%
LLPP VER 2022/003	Rotatorie stradali: realizzazione e manutenzione straordinaria dell'arredo verde	100.000,00						84,17%			55%
LLPP VER 2022/006-001	Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo urbano nelle aree verdi (in lotti) (Lotto 1)	300.000,00						59,04%			55%
LLPP VER 2022/006-002	Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo urbano nelle aree verdi (in lotti) (Lotto 2)	300.000,00						42,83%			55%
LLPP VER 2022/018	Realizzazione di una URBAN FARM nel Parco Agricolo del Basso Isonzo – I stralcio	250.000,00									55%
2023											
LLPP EDP 2023/002 ONC	Restauro delle balaustre dei quattro ponti di Prato della Valle	70.000,00									30%
LLPP EDP 2023/004 ONC	Manutenzione straordinaria impianti di ascensori stadio Euganeo	54.649,52									50%
LLPP EDP 2023/005 ONC	Recupero strutturale travi piano seminterrato edificio Casetta Michelino	98.000,00									55%
LLPP EDP 2023/006 ONC	Realizzazione impianto di spegnimento automatico e di rilevazione fumi e allarme incendio sala macchine sit - 3° piano Palazzo Sarpi.	65.000,00									30%
LLPP EDP 2023/007 ONC	Adeguamento norme prevenzione incendi area esterna complesso Plebiscito	80.000,00									30%
LLPP EDP 2023/008 ONC	Recupero ed efficientamento energetico sedi uffici comunali (Lotto 1)	149.000,00									30%
LLPP EDP 2023/009 ONC	Recupero ed efficientamento energetico sedi uffici comunali (Lotto 2)	200.000,00									30%
LLPP EDP 2023/010 ONC	Scuola primaria prati, via Decorati Valor Civile. Ampliamento giardino con annessione area verde - opere edili ed affini	14.794,94						100,00%			100%
LLPP EDP 2023/011 ONC	Risanamento e ripristino degli uffici del Settore Tributi e riscossione in Prato della Valle	28.798,65						100,00%			100%
LLPP OPI 2023/002 ONC	Manutenzione straordinaria Cavalcavia Camerini - Anno 2023	120.000,00									50%
LLPP OPI 2023/003 ONC	Eliminazione barriere architettoniche	100.000,00									30%

MONITORAGGIO AL 09/06/2024
OPERE PUBBLICHE DEGLI ELENCHI ANNUALI PRECEDENTI IL 2024

Codice Opera	DESCRIZIONE	Importo progetto	Progetto finanziato	Progetto approvato	Avvio procedura di gara	Appalto aggiudicato	Inizio lavori	% realizz. (SAL)	Fine Lavori	Collaudo	% di realizzazione delle opere
LLPP OPI 2023/005 ONC	Passerella pedonale provvisoria in Riviera Paleocapa	42.500,00						100,00%			100%
LLPP EDP 2021/053	Castello Carraresi – restauro ala est	5.265.854,33									40%
LLPP EDP 2022/050	Realizzazione di impianti di climatizzazione su asili nido e scuole infanzia. Climatizzazione su asili nido	560.000,00									50%
LLPP EDP 2022/071	Scuola primaria "Randi" ristrutturazione ex alloggio custode ad uso scuola e quartiere, creazione aula all'aperto. Scuola secondaria "Tartini" realizzazione nuova aula all'aperto	250.000,00									40%
LLPP EDP 2023/006	Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici scolastici e altri 2023.	100.000,00									55%
LLPP EDP 2023/032	Riatto alloggi ERP.	100.000,00									55%
LLPP EDP 2023/038	Messa a norma impianti alloggi ERP	200.000,00									55%
LLPP EDP 2023/041	Bonifica amianto in 28 alloggi ERP in via Stella civv. 2-2A-8A-8B	331.000,00									40%
LLPP EDP 2023/042	Manutenzione straordinaria e rimozione barriere architettoniche cimiteri cittadini 2023	85.000,00									30%
LLPP EDP 2023/045	Realizzazione nuovi ossari nei cimiteri cittadini 2023	150.000,00									30%
LLPP EDP 2023/079	Manutenzione straordinaria e rimozione barriere architettoniche edifici monumentali anno 2023: lotto 1 opere edili e affini	193.651,87									40%
LLPP EDP 2023/079 001	Manutenzione straordinaria e rimozione barriere architettoniche edifici monumentali anno 2023: lotto 2 opere restauratore	156.348,13									40%
LLPP EDP 2023/081	Siti Unesco – Manutenzione straordinaria ufficio IAT di destinazione Turistica presso P.zza delle Erbe	129.160,00									50%
LLPP EDP 2023/082	Manutenzione straordinaria impianti meccanici su edifici di proprietà comunale	200.000,00									55%
LLPP EDP 2023/086	Installazione di nuovo ascensore a Palazzo Moroni	150.000,00									50%
LLPP EDP 2023/087	POR FESR 21-27 Ristrutturazione Casa Leonardo da Vinci	765.000,00									10%
LLPP EDP 2023/088	POR FESR 21-27 Ristrutturazione via Altichiero 1	1.010.075,55									10%
LLPP EDP 2023/089	Riqualificazione impianti termici di edifici comunali ad uso scolastico e sportivo	379.223,00									40%
LLPP EDP 2023/089 ONC	Riqualificazione impianti termici di edifici comunali ad uso scolastico e sportivo. Palestra "Gozzano" - riqualificazione linee di alimentazione	44.897,00						100,00%			100%
LLPP EDP 2023/090	POR FESR Riqualificazione della sala multifunzionale di comunità "Diego Valeri"	350.000,00									10%
LLPP EDP 2023/091	Riqualificazione della Centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali	500.000,00									40%
LLPP OPI 2023/008	Nuovo tracciato stradale di via Beato Arnaldo da Limena	750.000,00									10%
LLPP OPI 2023/009	Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto della viabilità principale	500.000,00									50%
LLPP OPI 2023/010	Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali quartieri	250.000,00									50%
LLPP OPI 2023/011	Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni pedonali in asfalto	400.000,00									50%
LLPP OPI 2023/012	Manutenzione straordinaria elementi strutturali di Ponte Ariosto	600.000,00									30%
LLPP OPI 2023/013	Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo barriere metalliche nella tangenziale sud-est	1.000.000,00									30%
LLPP OPI 2023/014	Manutenzione straordinaria cavalcaferrovia Brusegana	200.000,00									30%
LLPP OPI 2023/015	POR FESR Riqualificazione verde del parco delle mura di San Benedetto	1.209.057,95									10%
LLPP VER 2021/020	Progetto di restauro del Parco Treves finanziato con Art Bonus.	260.000,00									50%
LLPP VER 2022/019	Opere per l'incremento e la sostituzione delle strutture ludiche nei giardini scolastici	250.000,00									40%
LLPP VER 2023/015	Interventi urgenti patrimonio arboreo urbano nelle aree verdi (in lotti) – alberature aree verdi	400.000,00									40%
LLPP VER 2023/015 001	Interventi urgenti patrimonio arboreo urbano nelle aree verdi (in lotti) – alberature stradali	150.000,00									40%
LLPP VER 2023/015 002	Interventi urgenti patrimonio arboreo urbano nelle aree verdi (in lotti) – potature di formazione	50.000,00									40%
LLPP VER 2023/016	Opere per l'incremento e la sostituzione delle strutture ludiche nei giardini scolastici (LOTTO 2)	250.000,00									40%
LLPP VER 2023/016 001	Opere per l'incremento e la sostituzione delle strutture ludiche nei giardini scolastici (LOTTO 3)	240.000,00									40%
LLPP VER 2023/017	POR FESR Parco Guizza	1.739.452,25									30%
	Totale	**106.205.364,38**									

MONITORAGGIO AL 09/06/2024
ELENCO ANNUALE 2024: OPERE PUBBLICHE FINANZIATE

Codice Opera	DESCRIZIONE	Importo progetto	Progetto finanziato	Progetto approvato	Avvio procedura di gara	Appalto aggiudicato	Inizio lavori	% realizz. (SAL)	Fine Lavori	Collaudo	% di realizzazione delle opere
LLPP OPI 2024/013	Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni pedonali con eliminazione delle barriere architettoniche	**216.023,24**									10%
LLPP OPI 2024/008	Manutenzione straordinaria della pavimentazione di Ponte Darwin	**250.000,00**									10%
LLPP VER 2024/005	Cura e conservazione del patrimonio arboreo urbano I lotto – accordo quadro	**200.000,00**									10%
LLPP VER 2024/005 001	Cura e conservazione del patrimonio arboreo urbano II lotto – accordo quadro	**100.000,00**									10%
LLPP VER 2024/003	Interventi urgenti per la sicurezza e la conservazione del patrimonio arboreo urbano I lotto – accordo quadro	**400.000,00**									10%
LLPP VER 2024/003 001	Interventi urgenti per la sicurezza e la conservazione del patrimonio arboreo urbano II lotto – accordo quadro	**250.000,00**									10%
LLPP VER 2024/003 002	Interventi urgenti per la sicurezza e la conservazione del patrimonio arboreo urbano III lotto – accordo quadro	**150.000,00**									10%
	Totale	**1.566.023,24**									

MANUELA
MATTIAZZO
Comune di
Padova
08.11.2024
13:01:43
GMT+01:00
