
Scheda pianta 4.58704 - Via Pascoli Giovanni **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	5	**Cartellino**	
Coordinate	724.917,64 / 5.028.418,75		
Proprietà	Area di proprietà		



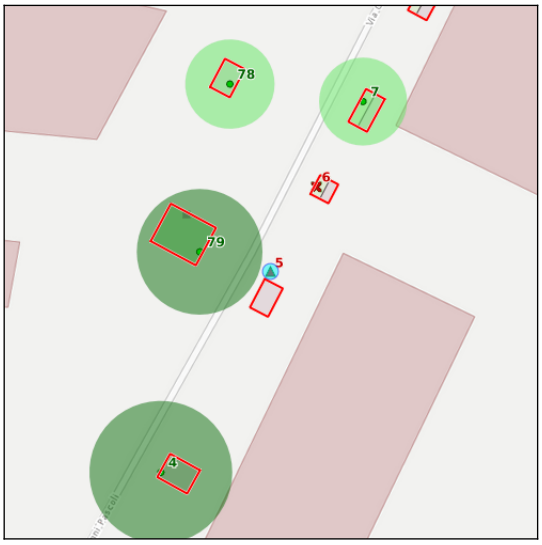

Tassonomia	Pinus pinea (Pino domestico)		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	15,18 m	**Ø chioma**	9,94 m
Altezza castello	7,45 m		
Circ. tronco	148 cm	**Ø tronco**	47,00 cm
Stato pianta	Ceppaia		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	66
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	61
Data abbattimento	29/04/2026	**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note	Copiosa perdita d'acqua potabile da tubatura che passa nell'immediata prossimità dell'apparato radicale del pino, con evidenti segni di scalzamento della zolla radicale. Per risolvere la perdita risulta inoltre necessario eseguire uno scavo in corrispondenza dell'apparato radicale compromettendo definitivamente la stabilità, già minata dalla fuoriuscita d'acqua, dell'intera pianta.		

VSA - Data: 22/11/2024	**CPC: C - Gravità moderata**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Luca Fantini
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Banchina
Stato vegetativo	1 normale
Altezza	14,00 m
Ø chioma	8,00 m
Altezza castello	8,00 m
Ø tronco	48,00 cm
Circ. tronco	151 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note Il Pino presenta il tronco inclinato di 15°verso la sede stradale. Sondaggio basale nella norma lato trazione.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Sottoservizi, reti tecnologiche (2), Spazio radicale sottodimensionato (2)
Colletto	Colletto interrato (1)
Fusto	Lesioni cicatrizzate (1), Fusto arcuato - sciabolato (2)
Castello	Lesioni cicatrizzate (1)
Branche	Ferite rimarginate (1)
Chioma	Asimmetria per competizione laterale (1), Spiombatura in asse (1)
Interferenze	Edifici - muri (1)

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
VTAv - VTA visivo		22/11/2025

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	22/11/2024 11:20:09	Luca Fantini	In lavorazione
2	29/11/2024 16:22:15	Luca Fantini	Conflitto rilevato
3	29/11/2024 16:30:42	Luca Fantini	Richiesta validazione (Applicativo)
4	29/11/2024 16:30:42	Luca Fantini	Validata
