
Scheda pianta 4.125 - Parco Dei Faggi **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	224	**Cartellino**	9990905/102
Coordinate	726.981,86 / 5.029.564,96		
Proprietà	Area di proprietà		



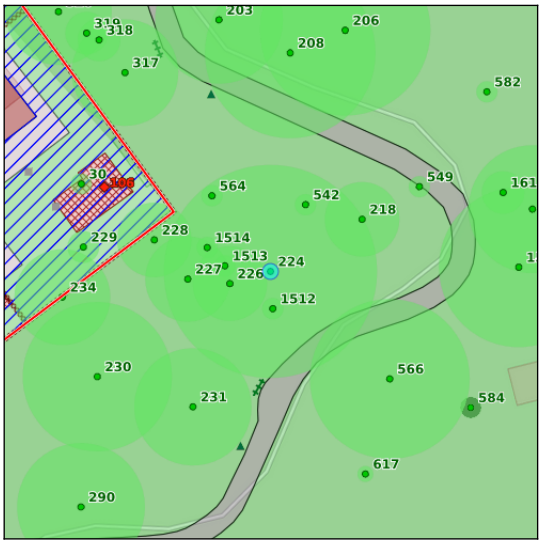

Tassonomia	Prunus laurocerasus (Lauroceraso)		
Sito di crescita	Prato o giardini		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata		
Altezza	6,00 m	**Ø chioma**	20,00 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	141 cm	**Ø tronco**	45,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**	
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note			

VSA - Data: 20/08/2026		**CPC: D - Gravità estrema**
Cartellino	9990905/102	**Stato cartellino** Cartellino presente
Rilevatore	U.O.S. Q3 Q4 Scuole	
Tipo	Ricontrollo	
Fase fisiologica	adulto	
Sito di crescita	Prato o giardini	
Stato vegetativo	2 deperiente	
Altezza	6,00 m	
Ø chioma	20,00 m	
Altezza castello	2,00 m	
Ø tronco	45,00 cm	
Circ. tronco	141 cm	
Bersaglio	Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata	



Note Albero bicormico, con radici strozzanti, affioranti e danneggiate, si può evidenziare la presenza di carie radicale, i contrafforti di reazione confermano il progressivo diffondersi della carie in risalita verso il colletto. I fusti presentano depressioni, fessurazioni, ferite aperte. La chioma riflette le condizioni radicali tramite regressione e seccumi diffusi. In seguito alla rottura di uno dei due cormi (il giorno 19/08/2026), l'albero non possiede più l'architettura strutturale tale da permetterne la stabilità, inoltre il cormo rimanente risulta danneggiato da fessurazioni e carie in ascesa dal colletto, condividendo lo stesso marciume radicale del cormo caduto. Il laurocerasо è stato oggetto di monitoraggio tramite v.s.a. dal 2019, nell'ultima v.s.a. eseguita il 23/02/2026 viene collocato nella C.P.C. C, sono sempre stati eseguiti gli interventi previsti dalle prescrizioni.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Radici affioranti decorticate (3), Sollevamento zolla (2), Fessurazione del terreno (2), Radice strozzante (3), Carie (3), Radici affioranti (3)
Colletto	Carie (3), Codominanze (3), Decadimento superficiale (2), Decorticazione - danni alla corteccia (3), Contrafforte di reazione (3), Depressioni e concavità (2), Contrafforte lesionato (3), Orifizi - fessure - lesioni aperte (3)
Fusto	Codominanza - fusto policormico (3), Fessurazioni - crack (3), Orifizi - fessure - lesioni aperte (3), Decorticazione - danni alla corteccia (3), Carie (3), Torsione (2), Fusto inclinato (3), Costolature (3), Depressione (2)
Castello	Ferite da taglio aperte (3), Carie (2), Codominanza (3), Corteccia inclusa (1), Fessurazioni (2), Danni alla corteccia (2)
Branche	Cretti - fessurazioni (3), Seccumi (2), Carie (2), Branche compromesse (2), Branche secche (2), Ferite da taglio marcescenti (2), Rottura (2)
Chioma	Spiombatura fuori asse (3), Asimmetrica (2), Dissecamento (2), Autoriduzione della chioma (2)

Lavori proposti

Tipo lavoro	**Impresa**	**Data fine prevista**
ABB - Abbattimento pianta		05/09/2026

Iter

#	**Data esecuzione**	**Eseguito da**	**Stato VSA**
1	20/08/2026 09:42:09	U.O.S. Q3 Q4 Scuole	In lavorazione
2	20/08/2026 09:42:23	U.O.S. Q3 Q4 Scuole	Richiesta validazione (Applicativo)
3	20/08/2026 09:42:23	U.O.S. Q3 Q4 Scuole	Validata











CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
20.08.2026 14:26:11
GMT+01:00
