PADOVA URBS PICTA

I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Al Quartiere n. 3 Est
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di una pianta in via Antonio Grassi (n. 12 dell'inventario delle alberature comunali)

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 1 esemplare di *Ulmus glabra* presente in via Antonio Grassi.

L'esemplare di *Ulmus glabra* è stato oggetto di un percorso di monitoraggio e approfondimento diagnostico sviluppato tra il 2022 e il 2026. Le indagini svolte hanno consentito di documentare l'evoluzione di un processo di decadimento localizzato al colletto e alle radici strutturali, inizialmente evidenziato dalla comparsa di carie sottocorticale e alterazioni tomografiche della sezione basale, successivamente associato a progressivi sintomi di deperimento della chioma e perdita di efficienza vegetativa.

L'ipotesi diagnostica formulata nel 2025, che individuava nell'apparato radicale la principale sede del decadimento, è stata verificata mediante prova di trazione controllata eseguita nel 2026. Tale prova ha evidenziato significativi deficit dell'ancoraggio radicale, con fattori di sicurezza al ribaltamento inferiori o prossimi all'unità nella quasi totalità delle direzioni investigate, indicando una marcata riduzione della stabilità dell'apparato di sostegno.

La convergenza tra evidenze visive, progressione documentata del quadro fitosanitario, risultati tomografici e conferma strumentale ottenuta mediante prova di trazione consente di ritenere accertata la compromissione dell'apparato radicale e del sistema di ancoraggio dell'albero.

In considerazione della natura evolutiva del decadimento e dell'impossibilità di ripristinare le funzionalità biomeccaniche compromesse, si ritiene l'abbattimento dell'esemplare tecnicamente giustificato e coerente con i principi di corretta gestione del rischio arboreo.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
12	*Ulmus glabra*	Esito VTA e indagini strumentali: classe CPC D	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegati: scheda rilevamento dati, foto, indagini strumentali, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.


CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026
15:02:51
GMT+01:00

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana

Scheda pianta 3.38302 - Via Grassi Antonio **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	12	**Cartellino**	
Coordinate	727.102,72 / 5.032.823,59		
Proprietà	Area di proprietà		



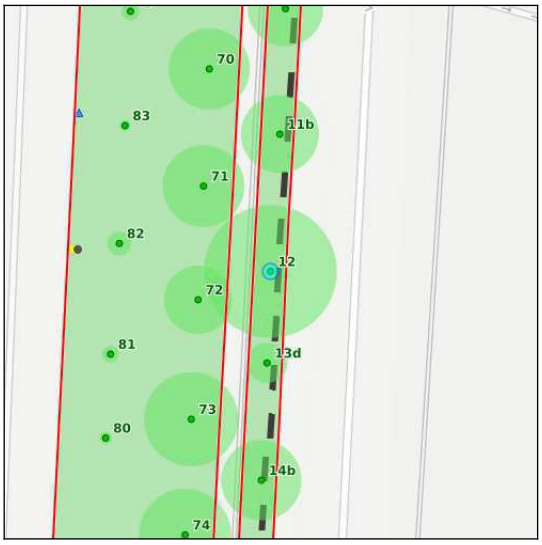

Tassonomia	Ulmus glabra (Olmo montano)		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	18,00 m	**Ø chioma**	12,46 m
Altezza castello	3,09 m		
Circ. tronco	267 cm	**Ø tronco**	85,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	81
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	76
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 18/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Luca Fantini
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Banchina
Stato vegetativo	2 deperiente
Altezza	18,00 m
Ø chioma	12,46 m
Altezza castello	3,09 m
Ø tronco	85,00 cm
Circ. tronco	267 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note Rilevata carie sottocorticale sul lato sud del colletto, dopo lo scollettamento manuale. Il tomogramma basale (2025) conferma la presenza di carie discontinua a macchia di leopardo sulla sezione del colletto, verosimilmente risalente dall'apparato radicale: ciò spiegherebbe anche i seccumi in chioma e, in generale, la condizione vegetativa in deperimento. La prova a trazione controllata (2026) conferma infatti la presenza di gravi deficit a carico dell'ancoraggio radicale su almeno il 75% della zolla radicale (sensori blu, rosso e verde, con valori del fattore di sicurezza al ribaltamento ormai 1); solo il lato a trazione (sensore giallo) presenta valori appena sufficienti (1,01): la propensione al cedimento per cedimento ipogeo è quindi da ritenersi ormai "estrema".

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Radici	Radici affioranti (2)
Colletto	Carie (3), Micelio (2)
Castello	Ferite da taglio marcescenti (2)
Branche	Ferite rimarginate (2), Branche secche (2)
Chioma	Dissecamento (2), Autoriduzione della chioma (2)

T - Prova di trazione

Nr.	Data rilievo	Esito	Note
12	18/08/2026		

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		08/09/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	18/08/2026 11:39:09	Luca Fantini	In lavorazione
2	07/09/2026 20:05:31	Luca Fantini	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 20:05:31	Luca Fantini	Validata

Wind Load Analysis

Tree Number	**12**
Arbotag	**12**

Project

Project Name	pulling test
Project Number	30
Test Date	18/08/2026

Site

3.38302 - via grassi antonio

,

Altitude a. sea level	10	m


Tree Data

Tree Species		olmo	
Stem circumference		267	cm
Stem Diameter	||	85	cm
in 1m height	_|_	85	cm
Bark Thickness		4	cm
Tree Height		**18**	**m**

Applied Material Properties

as for	Ulmus glabra	
Source	Stuttgart	
Compressive Strength	20	MPa
Modulus of Elasticity	5700	MPa
Limit of Elasticity	0,35	%
Green Density	1	g/cm³

Crown Outline

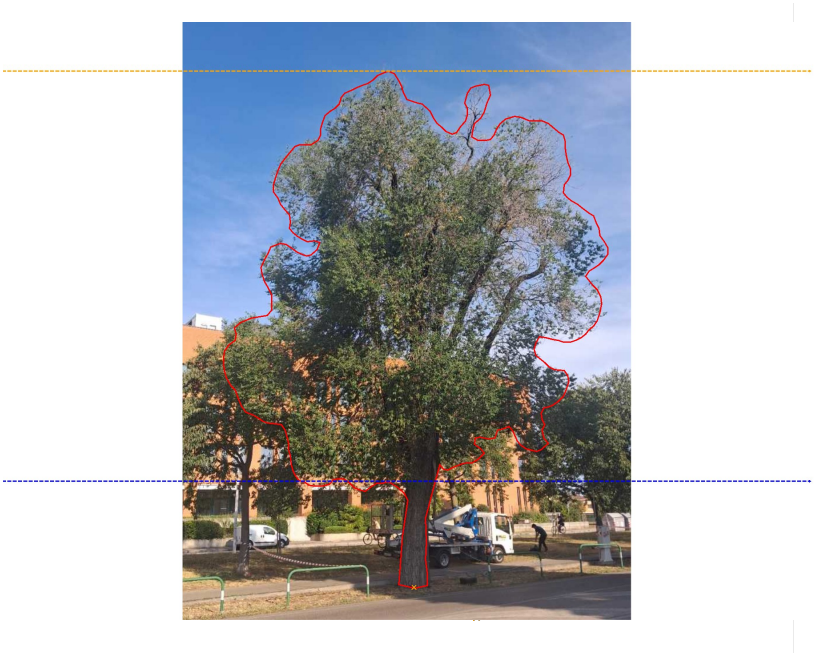

Load Direction	nord	
Surface Area Analysis		
Crown Base	3,7	m
Effective Height	12,3	m
Total Surface Area	135	m²
Crown Eccentricity	0,07	m
Applied Structural Parameters		
Drag Factor	0,25	
Natural Frequency	0,51	Hz
Damping Decrement	0,37	
Form Factor for Dead Weight	0,8	
Applied Site Parameters		
Windzone	D 2	
Speed of Applied		
Design Wind Speed	25	m/s
Air Density	1,29	kg/m³
Roughness Catagory	Stadt	
Exponent for Wind Profile	0,3	
Proximity Factor for Effects in Near Ground Wind Flow	1,3	
Factor for Crown Exposure	1,00	

Results

Wind Load Analysis			**Tree Static Analysis**		
Mean Wind Pressure	9,4	kN	Dead Weight Tree	6,7	t
Gust Reaction Factor	3,39		Critical Degree of Hollowness	86	%
Load Centre	10,1	m	Critical Residual Wall Thickness	6	cm
Torsion Moment	2	kNm	Assuming an Uncompromised Residual Wall		
Design Wind Load	**323**	**kNm**	**Basic Safety Factor**	**2,7**	

General

Comments

© ArboSafe

Calculated Tipping Stability according to Pull Test


Tree Data

Project	pulling test	**Tree Number**	**12**
Tree Species	olmo	Date	18/08/2026

Setup Pulling Test

Height of the Stem Anchor	4,2 m	**Measurement No.**	**1**
Rope Angle	10,6 °	Load Direction	nord

Graphic Display (test data and best fit to tipping curve)

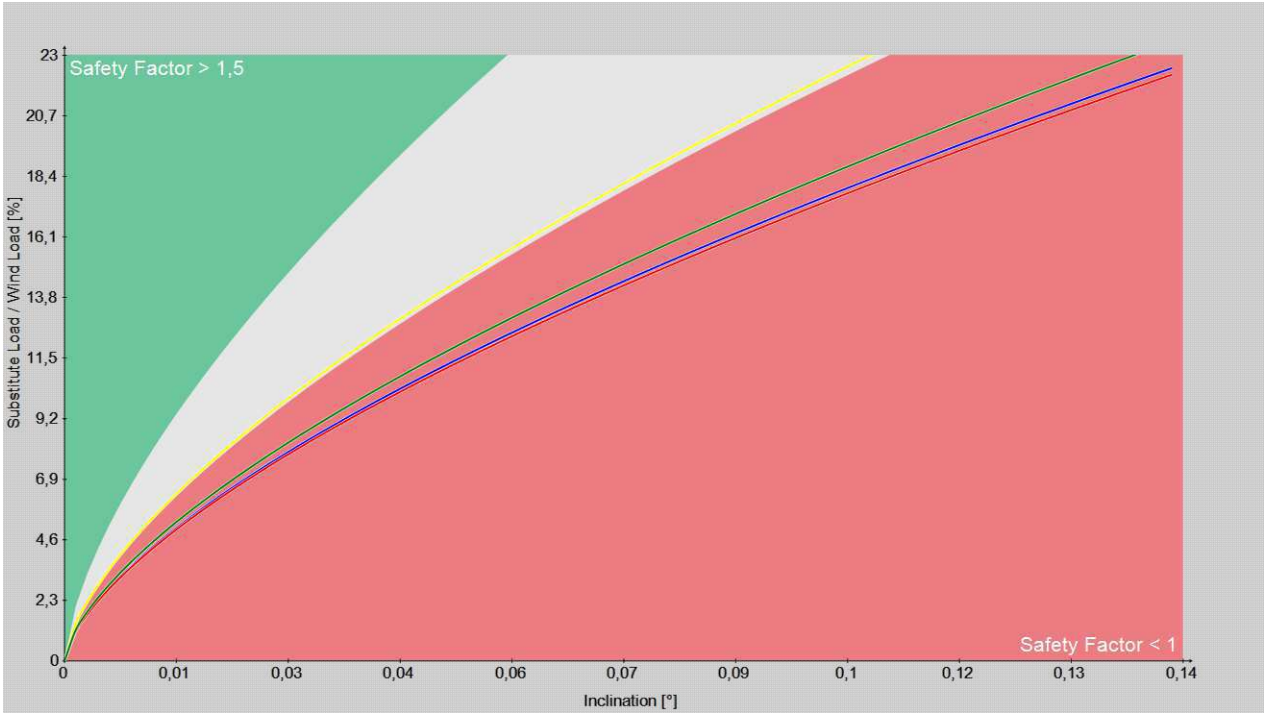

Inclinometer Measurement		80	81	82	83
Position		comp y	traz y	perp x	perp x
Tipping Stability (based on Generalized Tipping Curve)					
Safety Factor		**0,81**	**1,01**	**0,8**	**0,84**
Control Value	in				
Standard Deviation	%	1,47	2,21	1,34	1,27
Substitute Load	%	22,5	22,5	22,5	22,5
Load Direction at Inclinometer		y-Axis	y-Axis	x-Axis	x-Axis

General for Pull Test

Consultant	SV
Witness / Assistant	-

Measurement Comments

© ArboSafe









ArcGIS Web Map



11/09/2026, 12:29:30

1:532

0 0,00425 0,0085 0,017 mi

0 0,005 0,01 0,02 km

- Grafo Vie
- Numeri Civici

Alberi

- Albero,Ceppaia
- Albero,Pianta morta
- Albero,Pianta non gestita
- Albero,Pianta viva
- Albero,Posto libero
- Cespuglio,Viva
- Pianta in vaso/fioriera,Viva

Web AppBuilder for ArcGIS

PADOVA URBS PICTA

I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Al Quartiere n. 4 Sud - Est
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di una pianta in via Camillo Manfroni (n. 1 dell'inventario delle alberature comunali)

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 1 esemplare di *Fraxinus excelsior* presente in via Camillo Manfroni.

L'esemplare di *Fraxinus excelsior* presenta un quadro fitostatico gravemente compromesso, caratterizzato da estesi fenomeni di decadimento a carico del colletto, dell'apparato radicale e della chioma.

Alla base del fusto, sul lato sud-est, è presente un carpoforo di *Perenniporia fraxinea* associato a una cavità esposta e a diffusi fenomeni di carie del colletto. Sono inoltre rilevabili ulteriori manifestazioni del processo degradativo quali lesioni dei contrafforti radicali, orifizi e cavità basali, nonché diffusi fenomeni di degradazione del legno a carico delle radici principali e del colletto. Dal punto di vista vegetativo, l'albero manifesta evidenti sintomi di sofferenza fisiologica, con marcata clorosi fogliare, diffusi disseccamenti apicali, presenza di branche secche e fenomeni di autoriduzione della chioma, indicativi di una progressiva perdita di efficienza dell'apparato radicale e delle strutture di sostegno.

Le indagini strumentali eseguite al colletto tra il 2025 e il 2026 hanno evidenziato un progressivo fenomeno cariogeno, fino a raggiungere uno spessore di legno residuo integro ormai inferiore ai limiti statistici di sicurezza alla rottura, confermando il grave stato di compromissione dei tessuti legnosi e la significativa riduzione della sezione resistente residua.

Il quadro complessivo evidenzia pertanto una grave compromissione biomeccanica dell'esemplare, determinata dalla concomitante presenza di Perenniporia fraxinea, carie del colletto e delle radici, cavità basali, danneggiamento dei contrafforti radicali, diffusi disseccamenti della chioma e progressiva riduzione delle caratteristiche meccaniche del legno.

Tali condizioni risultano incompatibili con il mantenimento dell'alberatura in condizioni di sicurezza e giustificano l'attribuzione della Classe di Propensione al Cedimento D, rendendo necessario procedere all'abbattimento dell'esemplare a tutela della pubblica incolumità.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
4	*Fraxinus excelsior*	Esito VTA e indagini strumentali: classe CPC D	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegati: scheda rilevamento dati, foto, indagini strumentali, planimetria con indicata l'ubicazione


CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026 15:02:51 GMT+01:00

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana

Scheda pianta 4.45852 - Via Manfroni Camillo **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	1	**Cartellino**	
Coordinate	725.558,90 / 5.030.307,13		
Proprietà	Area di proprietà		



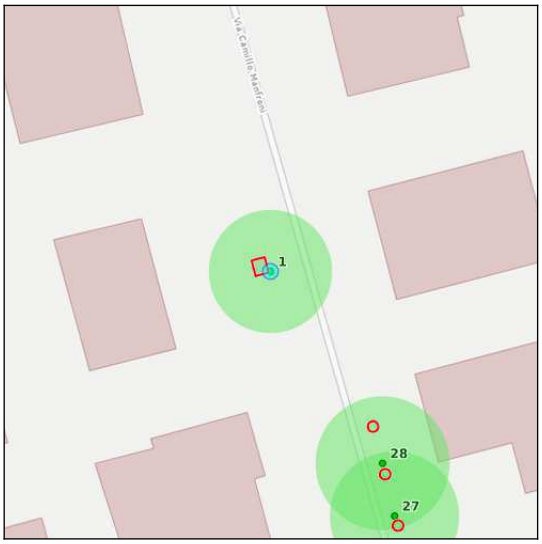

Tassonomia	Fraxinus excelsior (Frassino maggiore)		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio			
Altezza	14,75 m	**Ø chioma**	11,57 m
Altezza castello	3,10 m		
Circ. tronco	160 cm	**Ø tronco**	51,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	76
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	71
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale			
Note	INTERFERENZA CON LINEE AEREE		

VSA - Data: 03/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Luca Fantini
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Banchina
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente
Altezza	14,75 m
Ø chioma	11,57 m
Altezza castello	3,10 m
Ø tronco	51,00 cm
Circ. tronco	160 cm



Note Carpoforo di Perentoria fraxinea al colletto sul lato sud-est, con carie basale esposta. Seccumi apicali diffusi e marcata clorosi. I sondaggi strumentali eseguiti nel 2025 al colletto intercettavano: sul lato sud un intensa carie sottocorticali, sui lati nord-ovest e nord-est un andamento privo di anomalie dei tessuti interni. Il sondaggio penetrometrico eseguito nel 2026 conferma un intenso processo di carie con spessore di legno residuo integro ormai al di sotto dei limiti statistici di sicurezza alla rottura. I sondaggi con l'asta confermano inoltre l'approfondimento della carie in direzione radicale.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Radici	Carie (3), Spazio radicale sottodimensionato (2), Radici affioranti (1)
Colletto	Carpofori (3), Cavitá esposta (3), Cavità individuata strumentalmente (3), Azzampatura (1), Contrafforte lesionato (3), Orifizi - fessure - lesioni aperte (3), Carie (3)
Fusto	Fusto inclinato (1)
Castello	Ferite da taglio aperte (1), Ferite da taglio marcescenti (1)
Branche	Seccumi (2), Ferite rimarginate (1), Branche secche (2)
Chioma	Dissecamento (2), Autoriduzione della chioma (2), Clorosi (2), Asimmetrica (1), Spiombatura in asse (1)
Agenti patogeni	Perenniporia fraxinea (3)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
3	03/08/2026	Colletto	90	0,00		70,00	7,00	0,20

Lavori proposti


Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		19/08/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	03/08/2026 14:42:34	Luca Fantini	In lavorazione
2	07/09/2026 20:05:57	Luca Fantini	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 20:05:57	Luca Fantini	Validata

Measuring / object data

Measurement no.:	3	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	:	**Needle state:**	---	**Level**	:
Drilling depth	: 39,95 cm	**Tilt**	: -28°	**Direction:**	
Date	: 03.08.2026	**Offset**	: 79 / 301	**Species**	:
Time	: 13:00:16	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	:
Feed	: 100 cm/min			**Name**	:

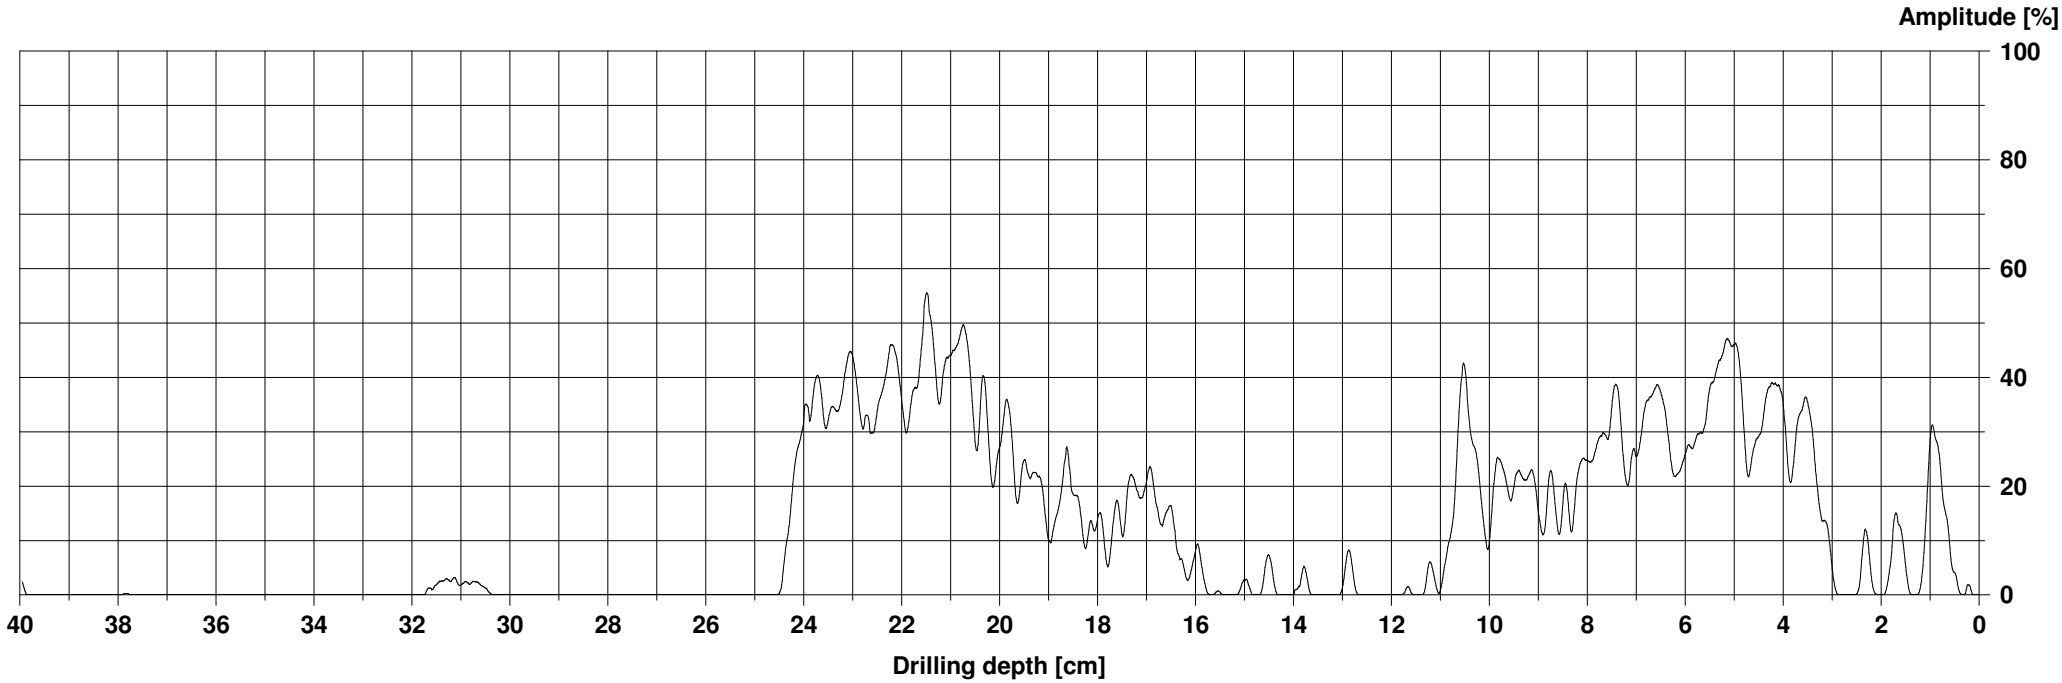

Assessment


Comment









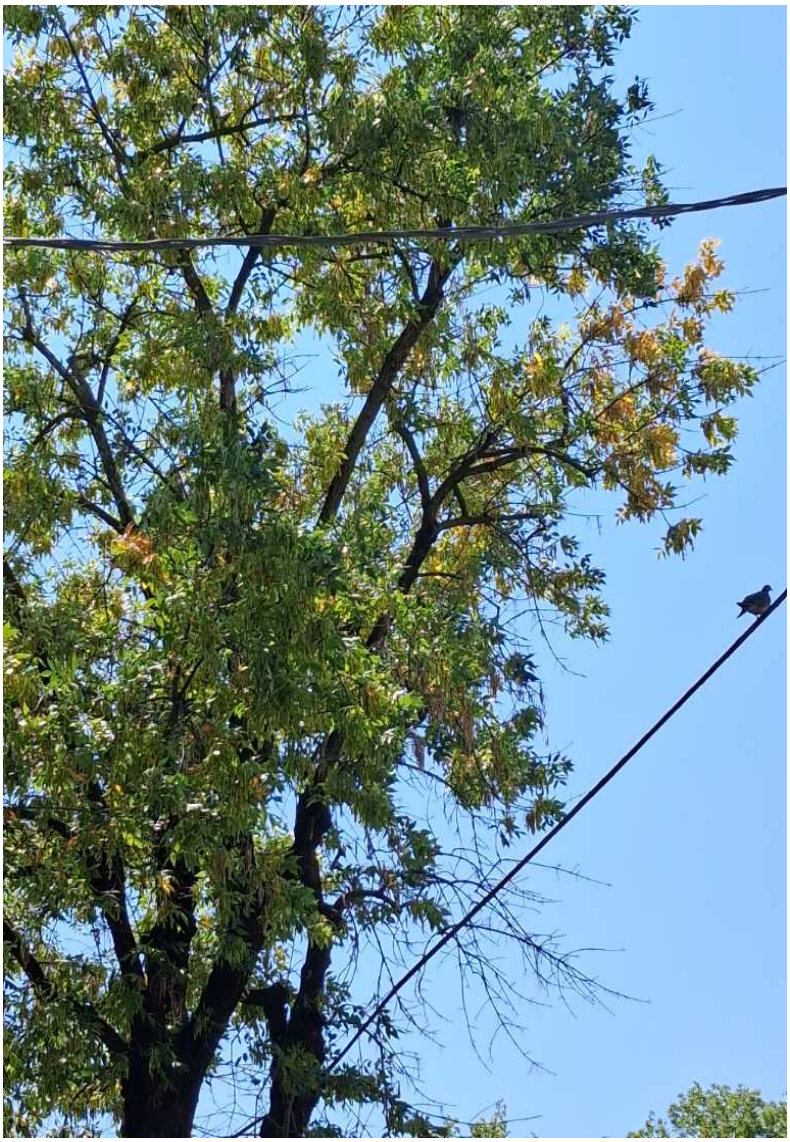


HB 425SR



ArcGIS Web Map



11/09/2026, 12:53:30

1:718

0 0,005 0,01 0,02 mi

0 0,0075 0,015 0,03 km

PADOVA URBS PICTA I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Padova, Treviso e Belluno
Palazzo Folco, via Aquileia, 7
35139 Padova
pec : sabp-pd-tv-bl@pec.cultura.gov.it

Al Quartiere n. 1 Centro
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di una pianta in via Cernaia (n. 16 dell'inventario delle alberature comunali)

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 1 esemplare di *Acer platanoides* presente in via Cernaia.

L'esemplare di *Acer platanoides* presenta estesi danni corticali che si sviluppano dal colletto lungo il fusto fino all'inserzione delle branche principali. Tali alterazioni compromettono in modo significativo la funzionalità dei tessuti di conduzione, determinando una marcata riduzione dell'attività vegetativa e una crescita stentata dell'albero.

Sono inoltre presenti diffusi fenomeni di disseccamento della chioma e aree di necrosi che, unitamente ai danni sopra descritti, testimoniano un avanzato stato di deperimento fisiologico, tale da non consentire il recupero delle normali condizioni vegetative della pianta.

Le condizioni riscontrate risultano incompatibili con il mantenimento in sicurezza dell'alberatura e giustificano la classificazione in Classe di Propensione al Cedimento D, rendendo necessario l'abbattimento dell'esemplare a tutela della pubblica incolumità.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
16	*Acer platanoides*	Esito VTA: classe CPC D	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegati: scheda rilevamento dati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.


CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026 15:02:51
GMT+01:00

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana

Scheda pianta 1.18854 - Via Cernaia **1 - Quartiere 1**

Nr. albero	16	**Cartellino**	
Coordinate	724.125,20 / 5.031.501,45		
Proprietà	Area di proprietà		



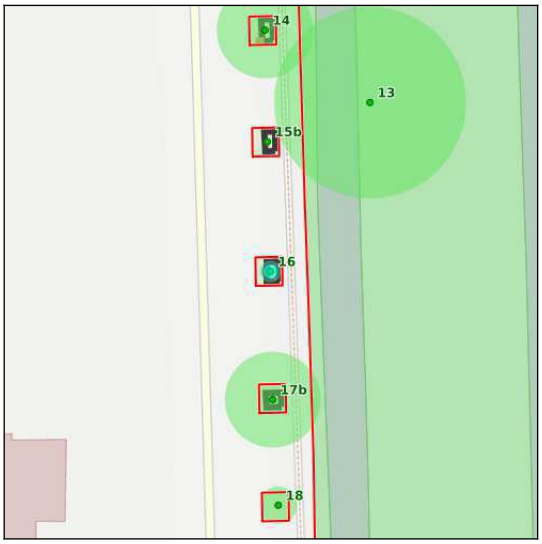

Tassonomia	Acer platanoides (Acero riccio)		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	4,00 m	**Ø chioma**	2,00 m
Altezza castello	2,00 m		
Circ. tronco	41 cm	**Ø tronco**	13,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	31
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	26
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale			
Note			

VSA - Data: 08/09/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Mainardi Daniela
Tipo	Primo controllo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Banchina
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente
Altezza	4,00 m
Ø chioma	2,00 m
Altezza castello	2,00 m
Ø tronco	13,00 cm
Circ. tronco	41 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note Albero in abbattimento per albero compromesso

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Colletto	Decadimento superficiale (3), Decorticazione - danni alla corteccia (3)
Fusto	Orifizi - fessure - lesioni aperte (3), Decorticazione - danni alla corteccia (3)
Castello	Danni alla corteccia (3), Ferite da taglio aperte (3), Necrosi (3)
Branche	Seccumi (3), Branche secche (3), Monconi necrotizzati (3)
Chioma	Dissecamento (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		24/09/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	08/09/2026 17:31:55	Mainardi Daniela	In lavorazione
2	09/09/2026 09:18:30	Mainardi Daniela	Richiesta validazione (Applicativo)
3	09/09/2026 09:18:30	Mainardi Daniela	Validata





ArcGIS Web Map



11/09/2026, 12:18:35

1:452

0 0,00375 0,0075 0,015 mi

0 0,005 0,01 0,02 km

Web AppBuilder for ArcGIS

PADOVA URBS PICTA I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Al Quartiere n. 1 Centro
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di una pianta in via Francesco Marzolo (n. 27 dell'inventario delle alberature comunali)

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 1 esemplare di *Cercis siliquastrum* presente in via Francesco Marzolo.

L'esemplare di *Cercis siliquastrum* presenta un grave stato di deperimento, caratterizzato da una crescita fortemente stentata e da un disseccamento che interessa circa il 90% della chioma, con conseguente drastica riduzione della funzionalità vegetativa. Alla base del fusto è stata rilevata la presenza di un carpoforo di *Ganoderma resinaceum*, indicativo dell'attuale processo di degradazione dei tessuti legnosi a carico dell'apparato radicale e della porzione basale del tronco. L'albero presenta inoltre ferite e lesioni sia lungo il fusto sia in corrispondenza del castello, che compromettono ulteriormente l'integrità strutturale dell'esemplare.

Il quadro complessivo rilevato ha valutato come elevata la propensione al ribaltamento della zolla, a seguito di una condizione di grave compromissione biomeccanica e fitosanitaria.

Le condizioni riscontrate risultano incompatibili con il mantenimento in sicurezza dell'alberatura e giustificano la classificazione in Classe di Propensione al Cedimento D, rendendo necessario l'abbattimento dell'esemplare a tutela della pubblica incolumità.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
27	*Cercis siliquastrum*	Esito VTA: classe CPC D	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026 15:02:51
GMT+01:00

Allegati: scheda rilevamento dati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana

Scheda pianta 1.47704 - Via Marzolo Francesco **1 - Quartiere 1**

Nr. albero	27	**Cartellino**	
Coordinate	725.794,45 / 5.032.499,73		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Cercis siliquastrum (Albero di Giuda)		
Sito di crescita	Marciapiede		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	8,79 m	**Ø chioma**	7,44 m
Altezza castello	2,60 m		
Circ. tronco	82 cm	**Ø tronco**	26,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Preciso	**Età pianta calcolata**	25
Data impianto	01/01/2001	**Età all'impianto**	0
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 04/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Mattia Morello
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Marciapiede
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente
Altezza	8,79 m
Ø chioma	7,44 m
Altezza castello	2,60 m
Ø tronco	26,00 cm
Circ. tronco	82 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note Albero stentato, con 10% di chioma ancora vitale. Senza futuro. Carpoforo di Ganoderma sp. al colletto. Elevata propensione al ribaltamento della zolla radicale.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Scavi recenti (1), Taglio radicale (1)
Colletto	Carpofori (3)
Fusto	Fusto inclinato (1), Orifizi - fessure - lesioni aperte (1)
Castello	Ferite da taglio aperte (1)
Chioma	Dissecamento (3)
Agenti patogeni	Ganoderma resinaceum (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		20/08/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	04/08/2026 16:53:12	Mattia Morello	In lavorazione
2	07/09/2026 21:45:02	Mattia Morello	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 21:45:02	Mattia Morello	Validata







ArcGIS Web Map



11/09/2026, 12:55:43

1:408

0 0,00325 0,0065 0,013 mi

0 0,005 0,01 0,02 km

Web AppBuilder for ArcGIS

PADOVA URBS PICTA I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Al Quartiere n. 3 Est
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di una pianta in via Gattamelata (n. 114 dell'inventario delle alberature comunali)

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 1 esemplare di *Tilia × europaea* presente in via Gattamelata.

L'esemplare di *Tilia × europaea* presenta un quadro di decadimento localizzato al colletto e alle radici strutturali documentato dalla presenza di necrosi corticali basali, carpofori di *Ganoderma sp.*, cavità al colletto e alterazioni del legno confermate dalle indagini strumentali eseguite. Sebbene la tomografia sonica abbia evidenziato un decadimento limitato nella sezione esaminata, il sondaggio eseguito in direzione radicale ha intercettato una più estesa alterazione del legno al di sotto del piano campagna, che denota un processo di marciume a carico delle radici di sostegno.

La convergenza tra evidenze visive, presenza di agenti cariogeni e risultati delle indagini strumentali consente di ritenere significativamente compromessa l'affidabilità biomeccanica dell'apparato radicale di ancoraggio.

Considerata la natura evolutiva del decadimento e l'impossibilità di ripristinare le funzionalità strutturali perdute, si ritiene l'abbattimento tecnicamente motivato e coerente con i principi di prudente gestione del rischio arboreo.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
114	*Tilia x europaea*	Esito VTA e indagini strumentali: classe CPC D	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026 15:02:51
GMT+01:00


Allegati: scheda rilevamento dati, foto, indagini strumentali, planimetria con indicata l'ubicazione

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana

Scheda pianta 3.35200 - Via Gattamelata **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	114	**Cartellino**	
Coordinate	726.287,68 / 5.031.716,54		
Proprietà	Area di proprietà		



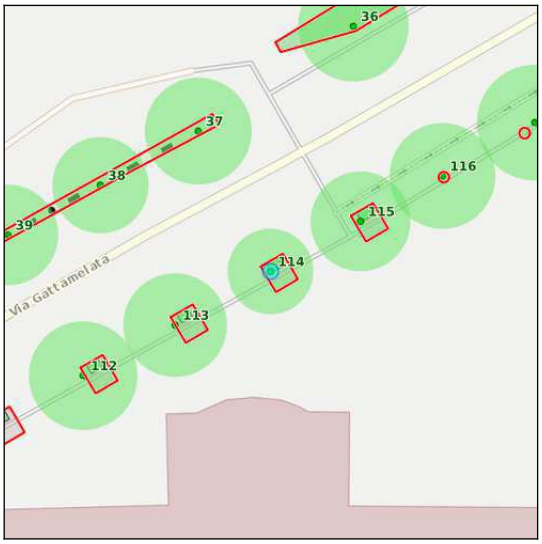

Tassonomia	Tilia × europaea		
Sito di crescita	Marciapiede		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità			
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	12,56 m	**Ø chioma**	8,03 m
Altezza castello	3,80 m		
Circ. tronco	132 cm	**Ø tronco**	42,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	66
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	61
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 05/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Luca Fantini
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Marciapiede
Stato vegetativo	2 deperiente
Altezza	12,56 m
Ø chioma	8,03 m
Altezza castello	3,80 m
Ø tronco	42,00 cm
Circ. tronco	132 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note Necrosi corticali al colletto e fusto, lato sud-ovest e corpi fruttiferi di Ganoderma sp. al colletto, lato nord-est. La tomografia non risulta particolarmente significativa in quanto rileva, a livello del colletto, solo un limitato processo di carie (area blu sul tomogramma allegato); tuttavia va considerato che la dimensione ridotta della sezione basale ha permesso l'applicazione solo di un numero ridotto di sensori. Il sondaggio basale, eseguito sempre al colletto ma in direzione radicale, risulta invece significativo, in quanto intercetta invece un'ampia carie del legno al di sotto del piano campgana, conseguente ad un intenso processo di marciume alle radici con sviluppo acropeto. Le evidenze diagnostiche visive e strumentali sono quindi tali da far ritenere che la propensione al cedimento per rottura ipogea sia ormai già "estrema".

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Radici	Sollevamento pavimentazione-cordolo (1)
Colletto	Lesioni cicatrizzate (1), Carie (3), Carpofori (3), Orifizi - fessure - lesioni aperte (1), Cavità individuata strumentalmente (3)
Fusto	Ricacci diffusi - riscoppi (1), Carie (3), Fusto arcuato - sciabolato (1), Orifizi - fessure - lesioni aperte (1), Lesioni cicatrizzate (1)
Branche	Seccumi (1), Ferite rimarginate (1), Ferite da taglio marcescenti (1)
Chioma	Posizione asimmetria Nord-est (1), Asimmetrica (1), Autoriduzione della chioma (1), Microfillia (1)
Agenti patogeni	Ganoderma spp (3)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
41	05/08/2026	Colletto	270	0,00				

S - Tomografo sonico

Nr.	Data rilievo	Posizione	h [cm]	Numero sensori	Velocità media	Esito	
114	05/08/2026	Colletto	10,00	5			tomogramma eseguibile solo con 5 sensori a causa della dimensione estremamente ridotta della seziona basale.

Lavori proposti


Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		21/08/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	05/08/2026 12:28:41	Luca Fantini	In lavorazione
2	07/09/2026 20:05:29	Luca Fantini	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 20:05:29	Luca Fantini	Validata


Measuring / object data

Measurement no.:	41	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	:	**Needle state:**	---	**Level**	:
Drilling depth	: 39,15 cm	**Tilt**	: -49°	**Direction:**	
Date	: 05.08.2026	**Offset**	: 77 / 329	**Species**	:
Time	: 09:41:13	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	:
Feed	: 150 cm/min			**Name**	:

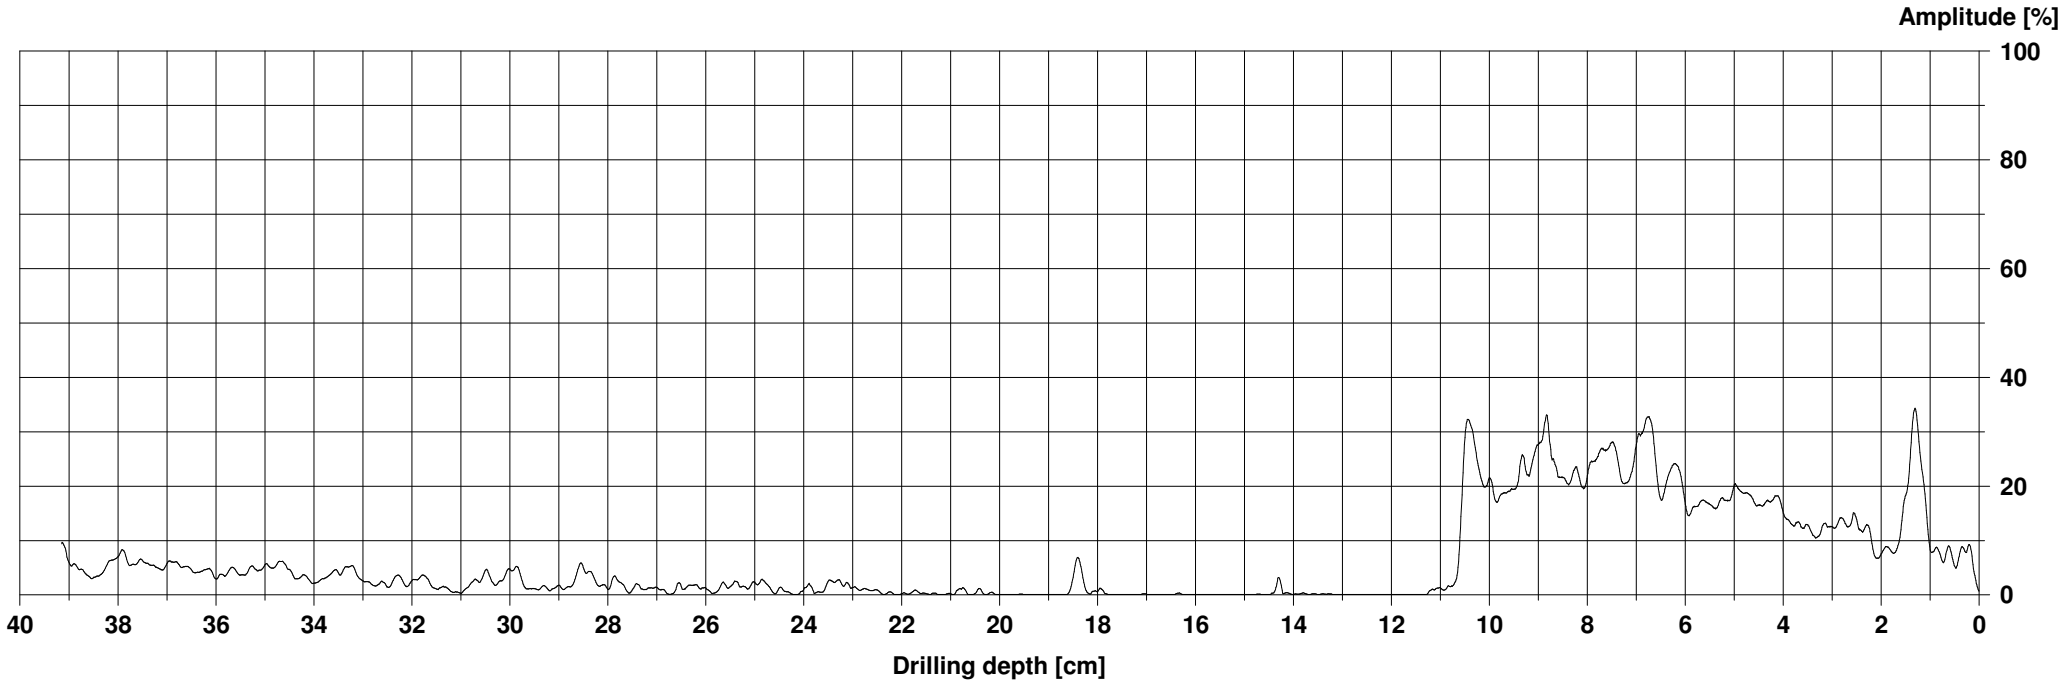

Assessment

Comment

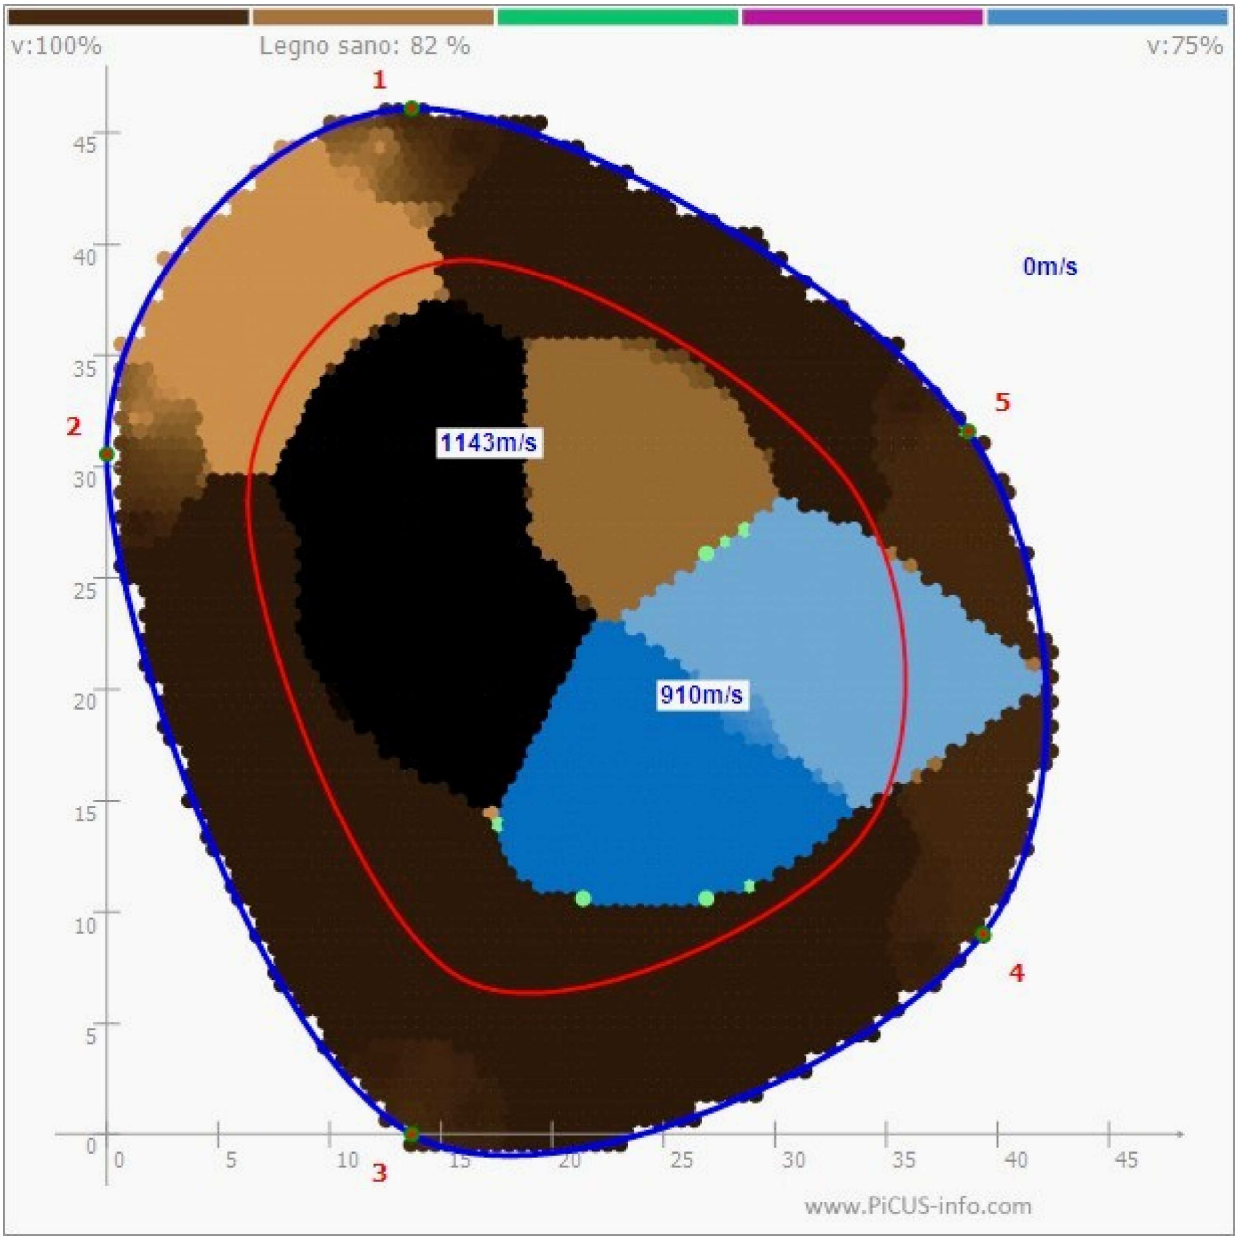
v:100%
Legno sano: 82 %
v:75%
1
2
3
4
5
0m/s
1143m/s
910m/s
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
www.PiCUS-info.com










ArcGIS Web Map

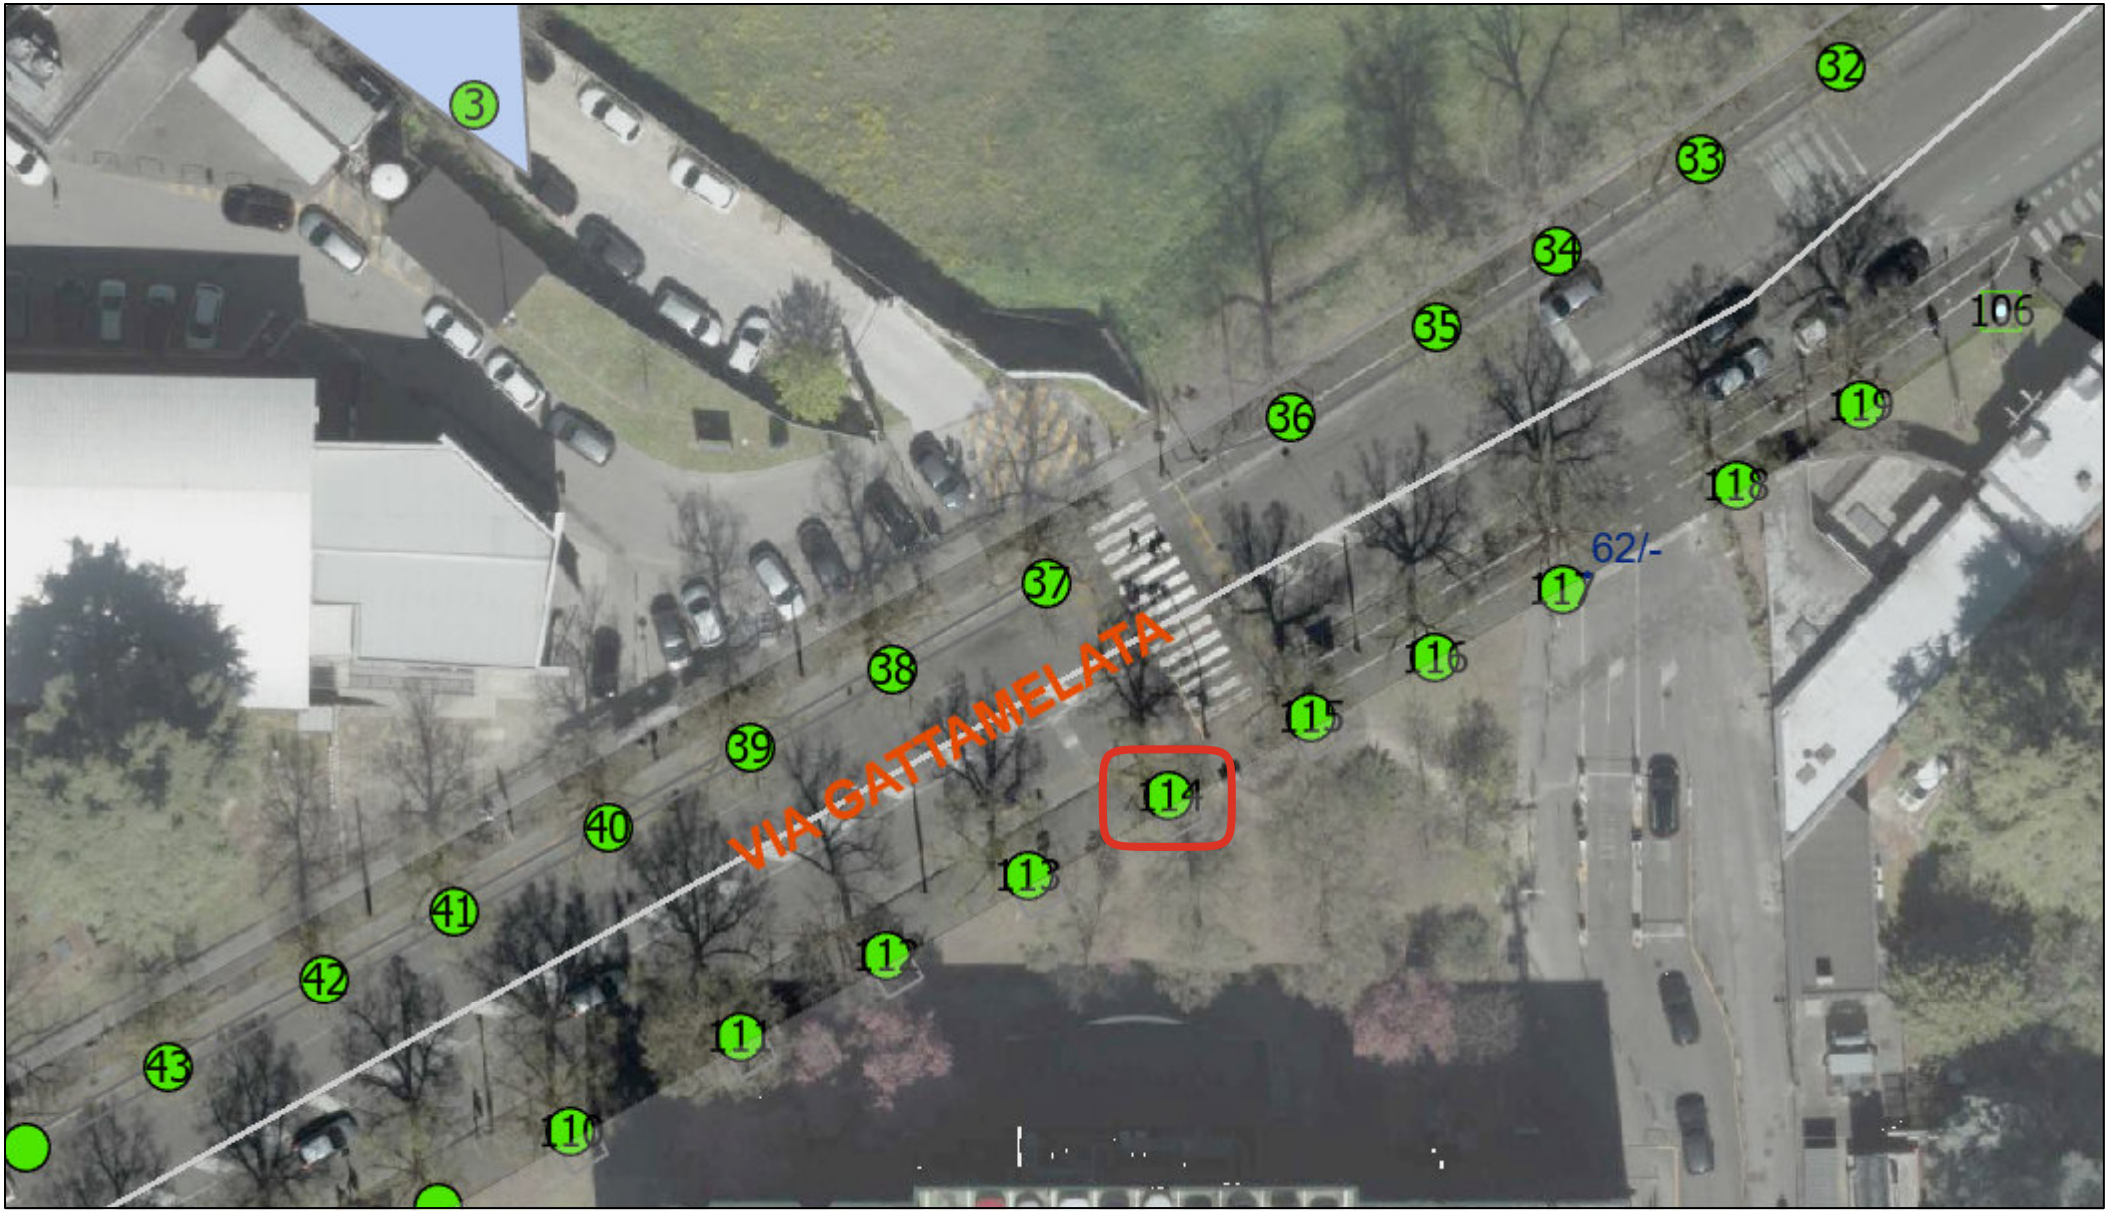

09/09/2026, 09:59:45

1:452

0 0,00375 0,0075 0,015 mi

0 0,005 0,01 0,02 km

Grafo Vie

Numeri Civici

Isolati

Alberi

Albero,Ceppaia

Albero,Pianta morta

Albero,Pianta non gestita

Albero,Pianta viva

Albero,Posto libero

Cespuglio,Viva

Pianta in vaso/fioriera,Viva

Web AppBuilder for ArcGIS

PADOVA URBS PICTA

I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Al Quartiere n. 4 Sud - Est
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di una pianta in via Giacomo Leopardi (n. 4 dell'inventario delle alberature comunali)

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 1 esemplare di *Platanus × hispanica* presente in via Giacomo Leopardi.

L'esemplare di *Platanus × hispanica* presenta un quadro fitostatico gravemente compromesso, caratterizzato da diffusi fenomeni di deperimento della chioma, con estesi disseccamenti, branche strutturalmente compromesse, carie localizzate sulle branche principali, cretti e numerosi carpofori fungini associati ai settori interessati dal decadimento, alla base dell'albero sono stati inoltre rilevati tagli radicali.

La tomografia eseguita nel 2024 aveva evidenziato la presenza di un principio di carie localizzato sul lato nord-est del tronco, rilevando tuttavia una sezione basale ancora ampiamente efficiente dal punto di vista strutturale, con una percentuale di legno integro pari al 94%, diversamente la successiva valutazione visiva di stabilità (VTA) e l'ispezione in quota eseguite nel 2026 hanno documentato una significativa evoluzione peggiorativa del quadro fitosanitario e strutturale dell'albero rilevando un'estesa infezione da *Fomitiporia punctata*, associata a diffusi processi di necrosi e alla presenza di carpofori in corrispondenza del castello e delle branche principali.

La grave compromissione della branca primaria est, interessata da estesi processi degenerativi e da una diffusa perdita di funzionalità strutturale, renderebbe necessaria la sua rimozione, tuttavia, un intervento di tale entità determinerebbe un eccessivo e irreversibile sbilanciamento della chioma residua, pregiudicando la stabilità complessiva dell'albero e la sua possibilità di conservazione.

In considerazione della natura irreversibile delle criticità riscontrate e dell'impossibilità di ripristinare le funzionalità meccaniche, l'abbattimento risulta tecnicamente motivato e coerente con i principi di prudente gestione del rischio arboreo.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
4	*Platanus × hispanica*	Esito VTA e indagini strumentali: classe CPC D	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegati: scheda rilevamento dati, foto, indagini strumentali, planimetria con indicata l'ubicazione

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026 15:02:51
GMT+01:00

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana

Scheda pianta 4.42251 - Via Leopardi Giacomo **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	4	**Cartellino**	
Coordinate	725.650,20 / 5.030.955,39		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Platanus × hispanica (Platano comune)		
Sito di crescita	Parterre		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio			
Altezza	18,00 m	**Ø chioma**	12,00 m
Altezza castello	4,00 m		
Circ. tronco	225 cm	**Ø tronco**	71,50 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	71
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	66
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note	INTERFERENZA CON LINEE AEREE		

VSA - Data: 03/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Luca Fantini
Tipo	In quota
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Parterre
Stato vegetativo	2 deperiente
Altezza	18,00 m
Ø chioma	12,00 m
Altezza castello	4,00 m
Ø tronco	71,50 cm
Circ. tronco	225 cm



Note La tomografia basale del 2024 rilevava un principio di carie sul lato nord-est con spessore comunque di legno integro sulla sezione ancora ampiamente sufficiente (94%). In quota, l'analisi 2026 rileva invece la presenza di una estesa infezione da Fomitiporia punctata, con necrosi discendente che interessa ormai tutta la branca primaria est (sondaggio n. 5), fino ormai al castello (sondaggio n. 6) Considerando che la chioma è impalcata su due solo branche primarie (est e ovest), la rimozione della branca est comporterebbe automaticamente l'eccessivo sbilanciamento dell'intera chioma, per cui si rende necessario procedere all'abbattimento dell'intera pianta.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Radici	Sollevamento pavimentazione-cordolo (1), Spazio radicale sottodimensionato (2), Radici affioranti decorticate (1), Taglio radicale (2), Sottoservizi, reti tecnologiche (2)
Colletto	Carie (1), Allargato (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (1), Ipertrofie - iperplasie (1), Depressioni e concavità (1)
Fusto	Ricacci diffusi - riscoppi (1), Fusto arcuato - sciabolato (1), Torsione (1), Ipertrofie - iperplasie (1)
Castello	Carpofori (3), Necrosi (3)
Branche	Branche pericolanti (3), Cretti - fessurazioni (3), Branche capitozzate (2), Branche secche (1), Seccumi (1), Carie (3), Carpofori (3), Monconi (1), Monconi necrotizzati (3), Branche compromesse (3)
Chioma	Dissecamento (3), Asimmetria per competizione laterale (1), Spiombatura in asse (1), Capitozzo (3)
Agenti patogeni	Fomitiporia punctata (3)
Interferenze	Lampioni (2), Cavi elettrici - telefonici (1)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
5	17/08/2026	Castello	180	700,00				
6	17/08/2026	Castello	180	500,00				

Lavori proposti


Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		31/08/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	03/08/2026 14:42:33	Luca Fantini	In lavorazione
2	07/09/2026 20:05:57	Luca Fantini	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 20:05:57	Luca Fantini	Validata

Measuring / object data

Measurement no.:	5	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	:	**Needle state:**	---	**Level**	:
Drilling depth	: 26,64 cm	**Tilt**	: +3°	**Direction:**	
Date	: 17.08.2026	**Offset**	: 84 / 306	**Species**	:
Time	: 15:56:56	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	:
Feed	: 100 cm/min			**Name**	:

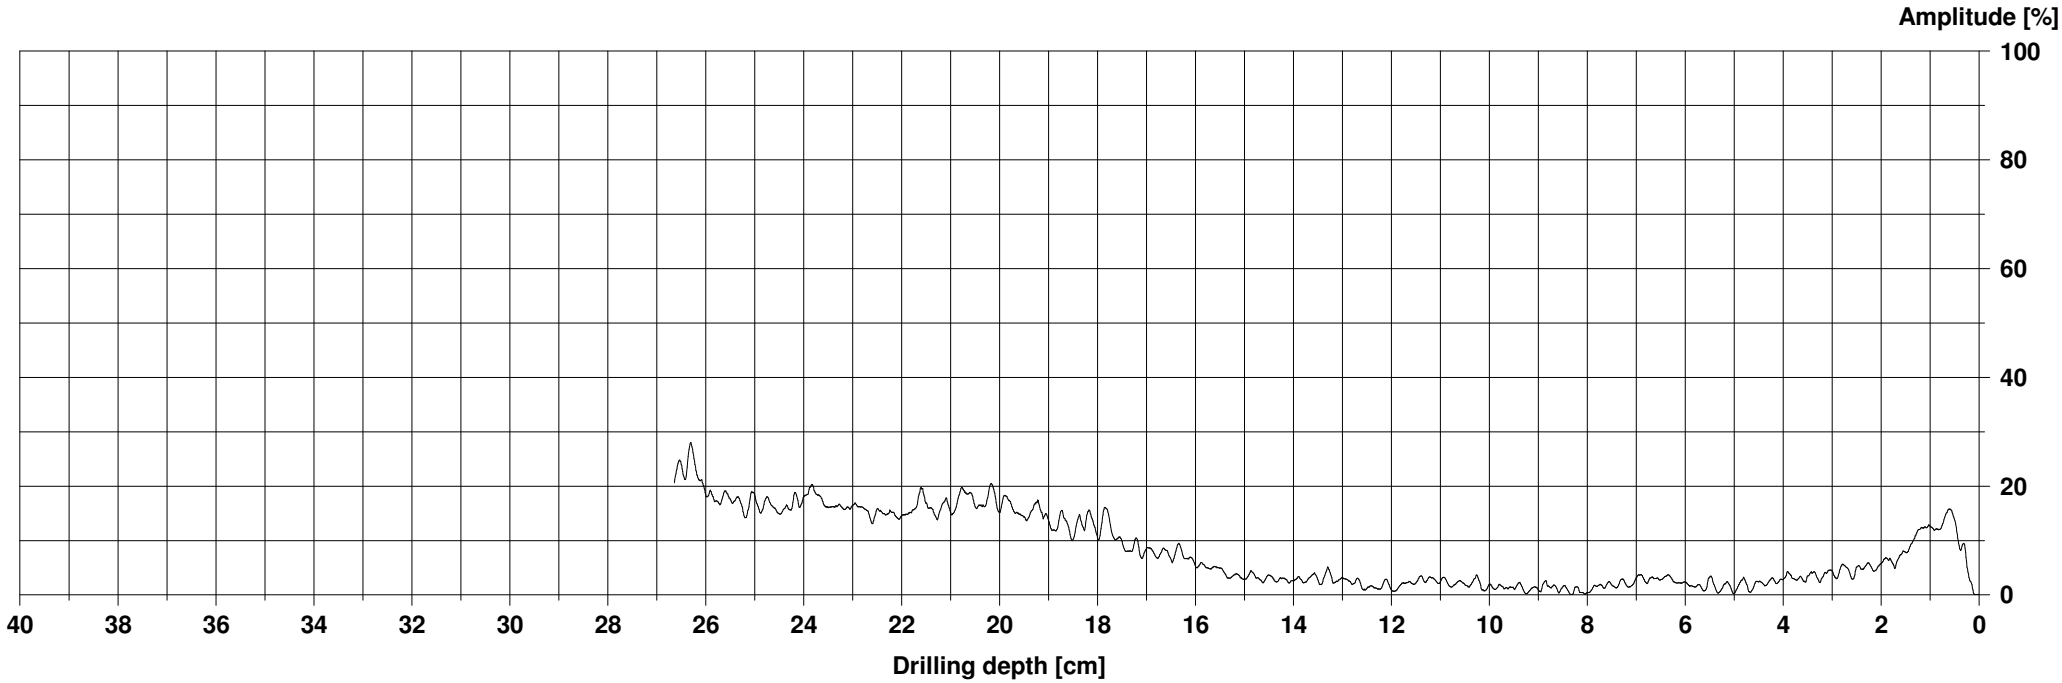


Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	6	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	:	**Needle state:**	---	**Level**	:
Drilling depth	: 21,50 cm	**Tilt**	: +5°	**Direction:**	
Date	: 17.08.2026	**Offset**	: 91 / 334	**Species**	:
Time	: 15:57:44	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	:
Feed	: 100 cm/min			**Name**	:

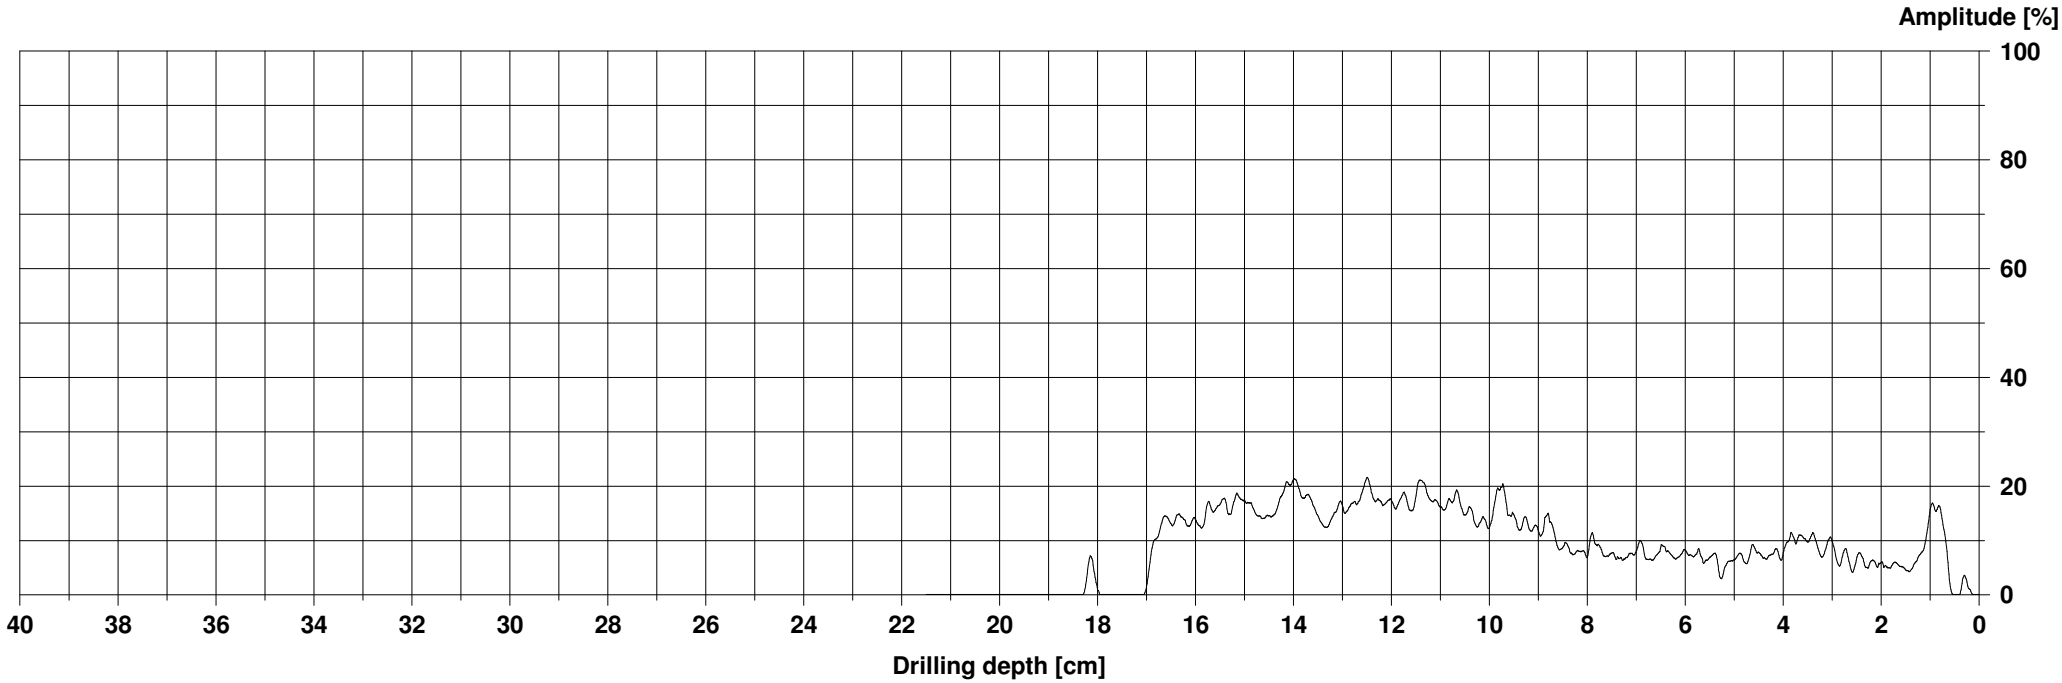

Assessment

Comment



Conota
Camera for work
17.08.2026 15:57


Conota
Camera for work
17.08.2026 15:57







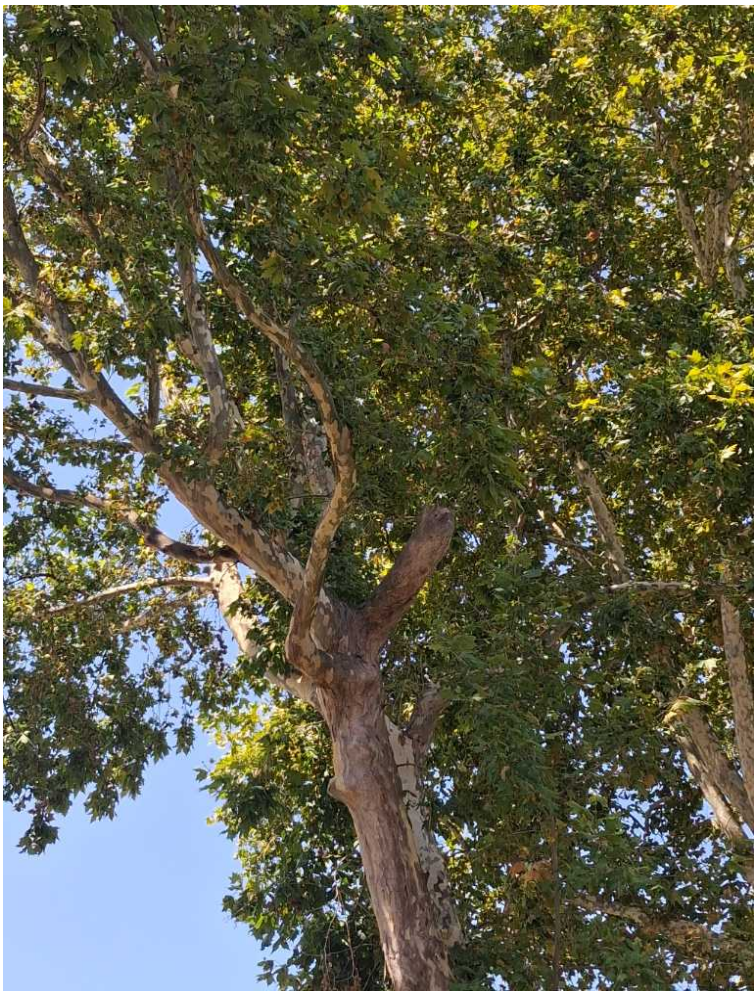



ArcGIS Web Map



11/09/2026, 12:49:34

1:390

0 0,00325 0,0065 0,013 mi

0 0,005 0,01 0,02 km

PADOVA URBS PICTA I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Al Quartiere n. 4 Sud - Est
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di una pianta in via Giosuè Carducci (n. 20 dell'inventario delle alberature comunali)

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 1 esemplare di Prunus cerasifera *'Pissardii'* presente in via Giosuè Carducci.

L'esemplare di *Prunus cerasifera 'Pissardii'* presenta ad oggi un quadro di grave compromissione strutturale e fitosanitaria. Alla base del fusto sono presenti estesi fenomeni di carie del colletto e diffuse essudazioni lungo l'intero tronco, sintomi riconducibili a processi degenerativi in atto nei tessuti legnosi. Il fusto presenta inoltre uno sviluppo tortuoso che contribuisce ad alterare l'equilibrio biomeccanico della pianta.

In chioma sono stati rilevati carpofori afferenti alla specie fungina *Phellinus pomaceus*, associati a fenomeni di degradazione del legno; sono poi presenti diffuse carie a carico delle branche, ma anche cretti e monconi necrotizzanti oltre a numerose porzioni disseccate in chioma. In particolare, risultano completamente secche due branche primarie.

L'indagine strumentale eseguita mediante dendrodensimetro sul fusto ha riscontrato, in corrispondenza del sondaggio, che solo i primi 6 cm di legno mantengono ad oggi resistenza meccanica su un diametro totale di 30 cm, indicando una marcata riduzione della sezione resistente residua e delle capacità meccaniche dell'esemplare.

Tale condizione di grave alterazione delle condizioni strutturali dell'albero e gli avanzati processi degradativi risultano incompatibili con il mantenimento in sicurezza dell'alberatura e giustificano l'attribuzione della Classe di Propensione al Cedimento D, rendendo necessario l'abbattimento dell'esemplare a tutela della pubblica incolumità.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
20	*Prunus cerasifera 'Pissardii'*	Esito VTA e indagini strumentali: classe CPC D	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegati: scheda rilevamento dati, dati strumentali, foto, planimetria con indicata l'ubicazione del


CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026 15:02:51
GMT+01:00

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana

Scheda pianta 4.16302 - Via Carducci Giosue' **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	20	**Cartellino**	
Coordinate	724.927,30 / 5.030.720,63		
Proprietà	Area di proprietà		



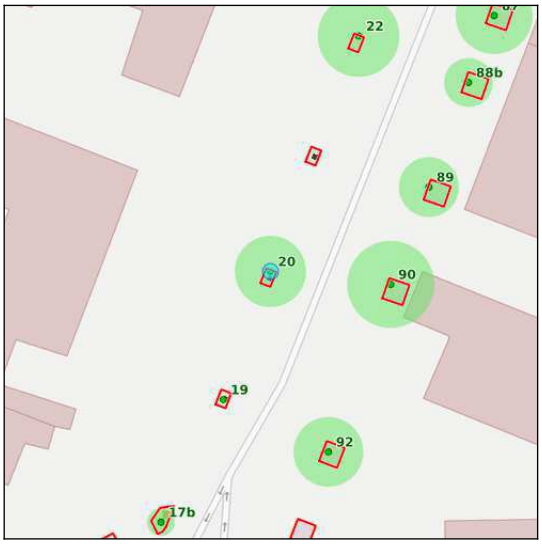

Tassonomia	Prunus cerasifera 'Pissardii' (Mirabolano var. 'Pissardii')		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	8,86 m	**Ø chioma**	6,69 m
Altezza castello	2,33 m		
Circ. tronco	94 cm	**Ø tronco**	30,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	28
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	23
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Irrigazione	
[X] Pavimentazione filtrante		[X] Protezione urti	
Note			

VSA - Data: 05/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Luca Fantini
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Banchina
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente
Altezza	8,86 m
Ø chioma	6,69 m
Altezza castello	2,33 m
Ø tronco	30,00 cm
Circ. tronco	94 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note Presenza di diffuse essudazioni su tutto il fusto. Chioma sofferente con almeno due branche primarie secche, di cui una profondamente fessurata con diffuse fruttificazioni di Phellinus pomaceus. Al colletto si rileva intenso decadimento legnoso affiorante, confermato anche strumentalmente.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Sottoservizi, reti tecnologiche (2)
Colletto	Carie (3)
Fusto	Inclusione corpi estranei (1), Fusto inclinato (1), Torsione (2), Essudati - batteriosi (2)
Castello	Ferite da taglio aperte (2)
Branche	Branche compromesse (3), Branche secche (3), Monconi necrotizzati (2), Cretti - fessurazioni (3), Carie (3), Carpofori (3)
Chioma	Dissecamento (2)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
49	05/08/2026	Colletto	300	0,00				

Lavori proposti


Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		21/08/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	05/08/2026 14:13:07	Luca Fantini	In lavorazione
2	07/09/2026 20:05:30	Luca Fantini	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 20:05:30	Luca Fantini	Validata

Measuring / object data

Measurement no.:	49	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	:	**Needle state:**	---	**Level**	:
Drilling depth	: 21,84 cm	**Tilt**	: -10°	**Direction:**	
Date	: 05.08.2026	**Offset**	: 78 / 368	**Species**	:
Time	: 14:07:41	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	:
Feed	: 100 cm/min			**Name**	:

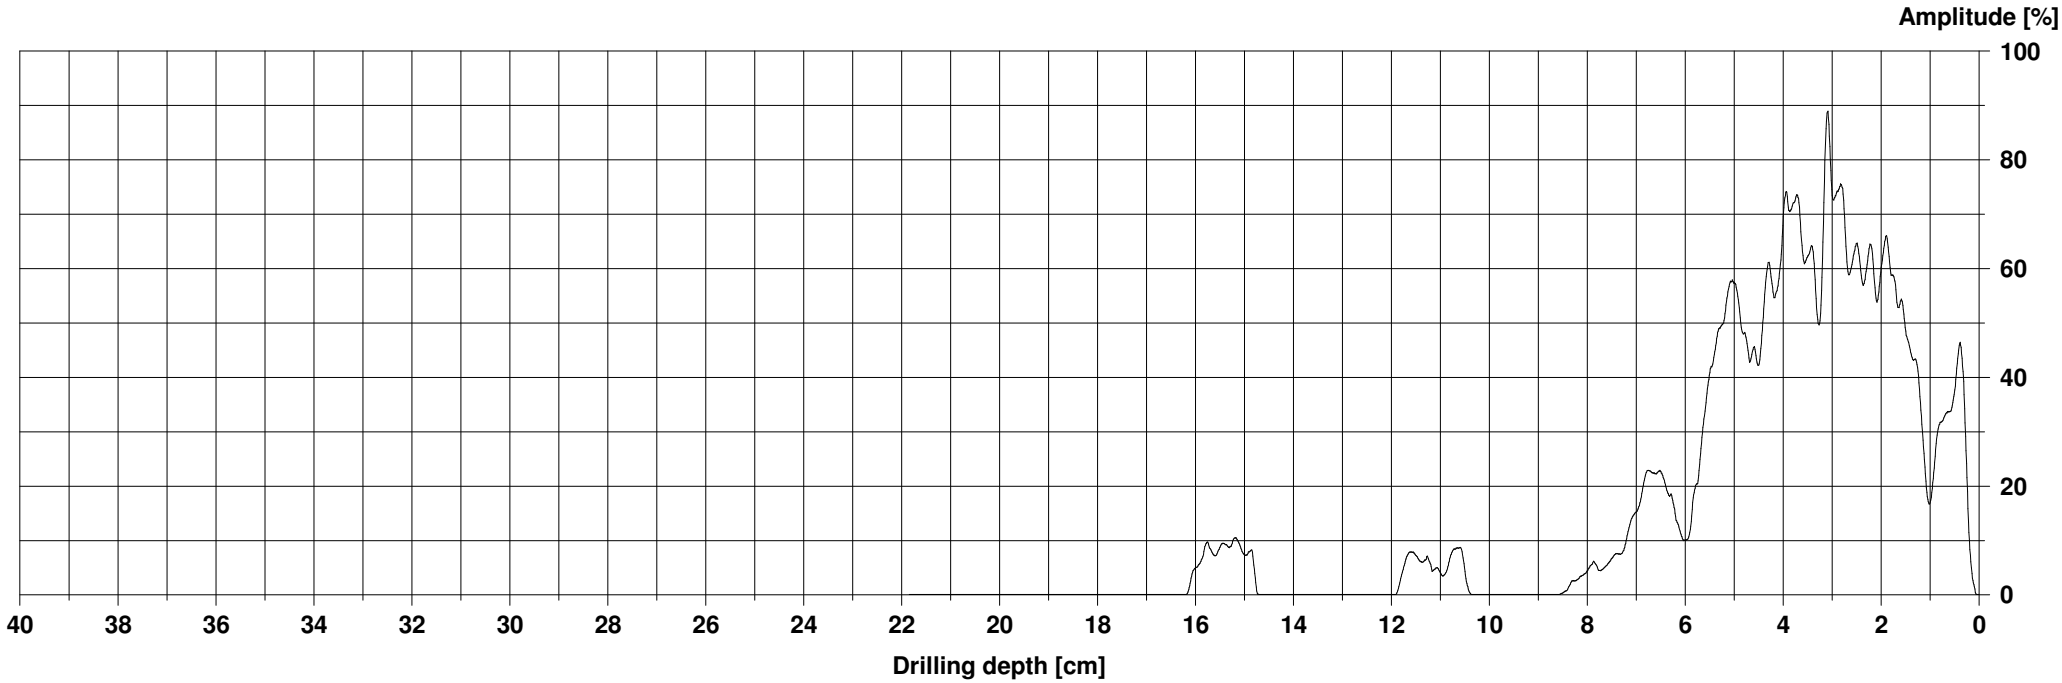

Assessment

Comment











ArcGIS Web Map



11/09/2026, 12:16:07

1:535

0 0,0045 0,009 0,018 mi

0 0,005 0,01 0,02 km

Web AppBuilder for ArcGIS

PADOVA URBS PICTA

I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Al Quartiere n. 3 Est
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di una pianta in via Guglielmo Ongarello (n. 2 dell'inventario delle alberature comunali)

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 1 esemplare di *Pinus pinea* presente in via Guglielmo Ongarello.

L'esemplare di *Pinus pinea* presenta una compromissione progressiva dell'apparato radicale e della stabilità complessiva dell'ancoraggio, documentata da un percorso diagnostico sviluppato tra il 2025 e il 2026. Le indagini iniziali avevano escluso significativi fenomeni di decadimento del legno alla base del fusto, orientando la valutazione verso una problematica prevalentemente radicale, coerente con le limitazioni del sito di crescita, la presenza di radici affioranti, il sollevamento delle pavimentazioni e la conformazione inclinata del soggetto.

La successiva prova di trazione controllata ha confermato la ridotta efficienza biomeccanica dell'apparato di ancoraggio, evidenziando valori di sicurezza prossimi o inferiori alla soglia minima di accettabilità in più direzioni di carico.

La convergenza tra sintomi morfologici, limitazioni radicali documentate e risultati della prova di trazione consente di ritenere compromessa la stabilità residua del soggetto e di confermare la fondatezza delle conclusioni espresse dal professionista incaricato.

In considerazione della natura irreversibile delle criticità riscontrate e dell'impossibilità di ripristinare le funzionalità meccaniche dell'apparato radicale, l'abbattimento risulta tecnicamente motivato e coerente con i principi di prudente gestione del rischio arboreo.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
2	*Pinus pinea*	Esito VTA e indagini strumentali: classe CPC D	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegati: scheda rilevamento dati, foto, indagini strumentali, planimetria con indicata l'ubicazion

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026
15:02:51
GMT+01:00

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana

Scheda pianta 3.55853 - Via Ongarello Guglielmo **3 - Quartiere 3**

Nr. albero	2	**Cartellino**
Coordinate	726.905,97 / 5.030.866,26	
Proprietà	Area di proprietà	



Tassonomia	Pinus pinea (Pino domestico)	
Sito di crescita	Marciapiede	
		Fase fisiologica adulto
Accessibilità		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
Altezza	13,00 m	**Ø chioma** 11,00 m
Altezza castello	4,00 m	
Circ. tronco	182 cm	**Ø tronco** 58,00 cm
Stato pianta	Pianta viva	
Modalità età	non rilevato	**Età pianta calcolata**
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**
[X] Albero stradale		
Note		

VSA - Data: 17/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Luca Fantini
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Marciapiede
Stato vegetativo	1 normale
Altezza	13,00 m
Ø chioma	11,00 m
Altezza castello	4,00 m
Ø tronco	58,00 cm
Circ. tronco	182 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note Pianta isolata facente parte probabilmente in origine di un filare. Severe limitazioni al corretto sviluppo radicale e pavimentazioni sollevate sul lato a trazione della zolla radicale. Sondaggio basale nella norma (2025). La prova a trazione controllata (2026) rileva però importanti deficit in termini di tenuta dell'ancoraggio radicale, con valori al di sotto del fattore di sicurezza minimo (valore 1) su due dei quattro quadranti analizzati (sensori verde e rosso, entrambi sull'asse di rotazione rispetto alla linea di tiro). Si rietiene quindi che propensione al cedimento per rottura ipogea e conseguente ribaltamento di zolla sia ormai da considerarsi già ad oggi "estrema".

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Radici	Spazio radicale sottodimensionato (2), Radici affioranti (2), Sollevamento pavimentazione-cordolo (1), Sollevamento zolla (3)
Fusto	Lesioni cicatrizzate (1), Fusto inclinato (2)
Castello	Lesioni cicatrizzate (1)
Branche	Seccumi (1)
Chioma	Asimmetrica (1), Clorosi (1), Microfillia (1), Dissecamento (1)
Interferenze	Edifici - muri (2)

T - Prova di trazione

Nr.	Data rilievo	Esito	Note
2	17/08/2026		

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		02/09/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	17/08/2026 18:39:47	Luca Fantini	In lavorazione
2	07/09/2026 20:05:31	Luca Fantini	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 20:05:31	Luca Fantini	Validata

Wind Load Analysis

Tree Number	**2**
Arbotag	**2**

Project

Project Name	pulling test
Project Number	30
Test Date	17/08/2026

Site

3.55853-via ongarello guglielmo

,

Altitude a. sea level 10 m

Tree Data

Tree Species	pino domestico		
Stem circumference		182	cm
Stem Diameter	||	58	cm
in 1m height	_|_	58	cm
Bark Thickness		3	cm
Tree Height		**13**	**m**

Applied Material Properties

as for	Pinus pinea	
Source	Stuttgart	
Compressive Strength	18	MPa
Modulus of Elasticity	8500	MPa
Limit of Elasticity	0,21	%
Green Density	0,8	g/cm³

Crown Outline



Load Direction nord-nord-ovest

Surface Area Analysis

Crown Base	5,3	m
Effective Height	9,9	m
Total Surface Area	74	m²
Crown Eccentricity	2,11	m

Applied Structural Parameters

Drag Factor	0,2	
Natural Frequency	0,91	Hz
Damping Decrement	0,43	
Form Factor for Dead Weight	0,8	

Applied Site Parameters

Windzone	D 2	
Speed of Applied		
Design Wind Speed	25	m/s
Air Density	1,29	kg/m³
Roughness Catagory	Stadt	
Exponent for Wind Profile	0,3	
Proximity Factor for Effects in Near Ground Wind Flow	1,3	
Factor for Crown Exposure	1,00	

Results

Wind Load Analysis

Mean Wind Pressure	4,1	kN
Gust Reaction Factor	3,31	
Load Centre	8,8	m
Torsion Moment	29	kNm
Design Wind Load	**121**	**kNm**

Tree Static Analysis

Dead Weight Tree	1,8	t
Critical Degree of Hollowness	79	%
Critical Residual Wall Thickness	6	cm
Assuming an Uncompromised Residual Wall		
Basic Safety Factor	**2**	

General

Comments

© ArboSafe

Calculated Tipping Stability according to Pull Test


Tree Data

Project	pulling test	**Tree Number**	**2**
Tree Species	pino domestico	Date	17/08/2026

Setup Pulling Test

Height of the Stem Anchor	4 m	**Measurement No.**	**1**
Rope Angle	11,1 °	Load Direction	nord-nord-ovest

Graphic Display (test data and best fit to tipping curve)

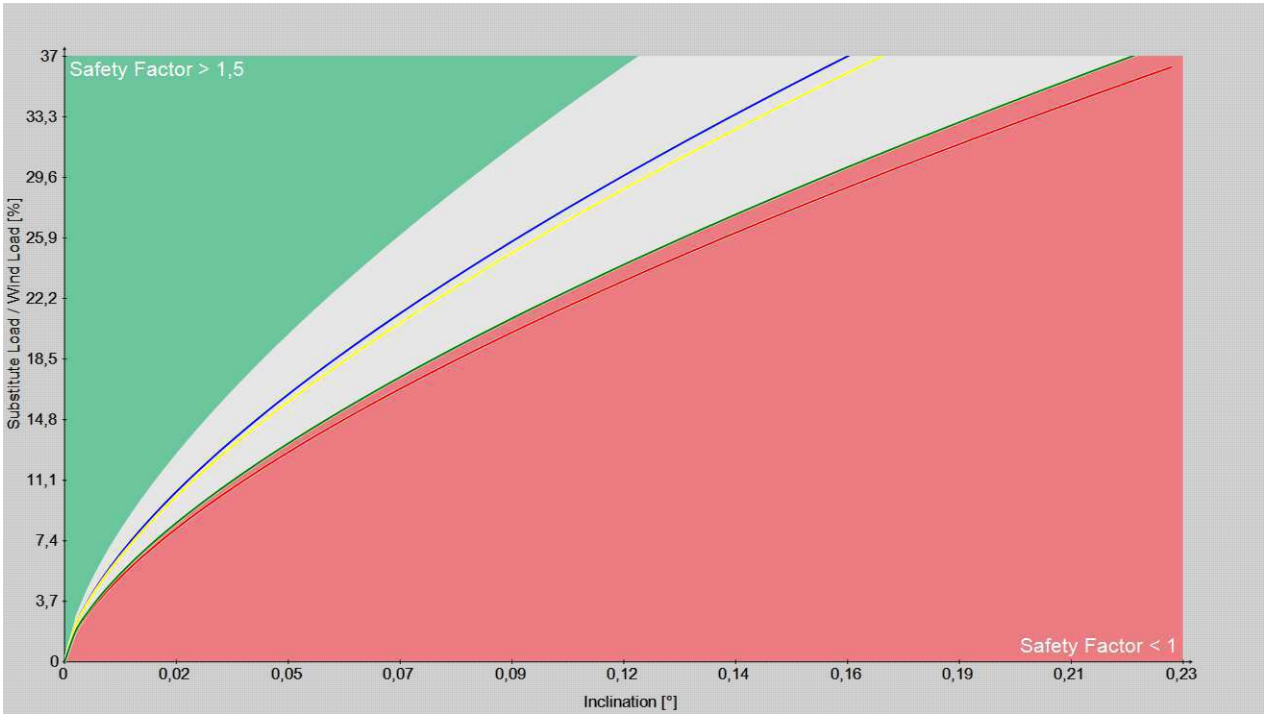

Inclinometer Measurement		80	81	82	83
Position		comp y	traz y	perp x	perp x
Tipping Stability (based on Generalized Tipping Curve)					
Safety Factor		**1,22**	**1,19**	**0,96**	**1**
Control Value	in				
Standard Deviation	%	2,37	1,56	2,25	5,04
Substitute Load	%	36,7	36,7	36,7	36,7
Load Direction at Inclinometer		y-Axis	y-Axis	x-Axis	x-Axis

General for Pull Test

Consultant	SV
Witness / Assistant	-

Measurement Comments

© ArboSafe







Comune di Padova

GREEN SPACES
designed by R3GIS



© Padova

Scala 1:1058 Data: 11/9/2026

GreenSpaces

PADOVA URBS PICTA I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Al Servizio Fitosanitario Regionale
viale dell'Agricoltura, 1/A
loc. Bovalino
37060 Buttapietra (VR)
pec :fitosanitari@pec.regione.veneto.it

Al Quartiere n. 4 Sud – Est
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di due piante in via Guizza (n. 85,96 dell'inventario delle alberature comunali):

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*Ceratocystis platani*) Dlgs 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 2012. Comunicazione di intervento su piante di *Platanus x hispanica*.

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 2 esemplari di *Platanus x hispanica* presenti in Via Guizza n. 4. Le verifiche condotte hanno evidenziato condizioni di estrema criticità che rendono necessario l'abbattimento degli esemplari a tutela della pubblica incolumità.

L'esemplare di *Platanus × hispanica* inventariato con numero 85 presenta un quadro fitostatico gravemente compromesso, caratterizzato da diffusi fenomeni di deperimento della chioma, con vegetazione rada, presenza di numerosi seccumi e abbondante emissione di ricacci lungo il fusto, indicativi di una persistente condizione di sofferenza vegetativa. La valutazione visiva di stabilità (VTA) eseguita nel 2024 aveva evidenziato una chioma deperente, rada e con diffusi disseccamenti, situazione che ha manifestato una progressiva evoluzione peggiorativa nel corso degli anni successivi. La valutazione visiva di stabilità (VTA) eseguita nel 2026 con ispezione strumentale in quota: ha rilevato ampie aree necrotizzate a carico delle branche primarie disseccate, delle branche ancora vitali e del castello, monconi in fase di necrotizzazione, branche compromesse dal punto di vista strutturale, estese aree di carie e necrosi associate alla presenza di carpofori fungini attribuibili a *Fomitiporia punctata*, indicativi di avanzati processi di degradazione dei tessuti legnosi. I sondaggi strumentali eseguiti mediante dendrodensimetro sulle branche principali hanno evidenziato una gravissima compromissione delle proprietà meccaniche del legno: solo pochi centimetri di tessuto residuo hanno manifestano ancora capacità meccaniche. Tali condizioni risultano incompatibili con il mantenimento dell'alberatura in condizioni di sicurezza e giustificano l'attribuzione della Classe di Propensione al Cedimento D, rendendo necessario l'abbattimento dell'esemplare a tutela della pubblica incolumità.

L'esemplare di *Platanus × hispanica* inventariato con numero 96 presenta una grave compromissione delle strutture di sostegno dell'albero, concentrata in corrispondenza del colletto e dell'apparato radicale. Sul lato nord-est del colletto è presente un'ampia lesione aperta, verosimilmente riconducibile a un pregresso danno da urto, associata a fenomeni di carie affiorante. Sono stati inoltre rilevati tagli radicali e gravi danneggiamenti dell'apparato radicale, con conseguente riduzione della capacità di ancoraggio dell'esemplare al terreno. In corrispondenza della porzione basale del fusto sono presenti estesi fenomeni di degradazione del legno e una cavità interna, successivamente confermata dalle indagini strumentali: i quattro sondaggi penetrometrici eseguiti alla base del tronco hanno evidenziato un intenso processo di carie centrale diffuso lungo gran parte della circonferenza. Su circa tre quarti del perimetro basale lo spessore del legno residuo integro risulta inferiore ai valori statistici di sicurezza alla rottura. In considerazione della natura irreversibile delle criticità riscontrate e dell'impossibilità di ripristinare le funzionalità meccaniche dell'apparato radicale, l'abbattimento risulta tecnicamente motivato e coerente con i principi di prudente gestione del rischio arboreo.

Al Servizio Fitosanitario Regionale si comunica che il materiale di risulta ottenuto sarà smaltito all'interno della zona di contenimento (province di Verona, Vicenza, Venezia, Treviso, Padova e Rovigo) come previsto dall'art. 7 del DM 29 febbraio 2012. Verranno comunicate la destinazione e le modalità di smaltimento del legname infetto utilizzando il Modulo A2.
Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
85,96	*Platanus × hispanica*	Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano D.lgs 214/2005; D.D. SFR n. 24 del 11.06.2012	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegati: scheda rilevamento dati, dati strumentali, planimetria con indicata l'ubicazione della pi

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026
15:02:51
GMT+01:00

Scheda pianta 4.39701 - Via Guizza **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	85	**Cartellino**	
Coordinate	724.815,16 / 5.026.988,18		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Platanus × hispanica (Platano comune)		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	15,23 m	**Ø chioma**	12,04 m
Altezza castello	6,81 m		
Circ. tronco	217 cm	**Ø tronco**	69,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	61
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	56
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 17/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Luca Fantini
Tipo	In quota
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Banchina
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente
Altezza	15,23 m
Ø chioma	12,04 m
Altezza castello	6,81 m
Ø tronco	69,00 cm
Circ. tronco	217 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note Porzione di chioma deperente, rada e con seccumi. L'analisi in quota ha evidenziato la presenza di ampie aree necrotizzate, sia sulle branche primarie disseccate, sia su quelle ancora vitali, sia al castello, con fruttificazioni del fungo patogeno Fomitiporia punctata. Entrambi i sondaggi eseguiti al castello confermano quindi la presenza di un intenso processo di carie del cilindro corticale.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Radici	Sollevamento pavimentazione-cordolo (1), Sottoservizi, reti tecnologiche (2)
Colletto	Ricacci basali (1), Ipertrofie - iperplasie (1)
Fusto	Ricacci diffusi - riscoppi (2), Ipertrofie - iperplasie (1), Lesioni cicatrizzate (1)
Castello	Codominanza (2), Carpofori (3), Fessurazioni (2), Necrosi (3), Carie (3)
Branche	Seccumi (3), Branche capitozzate (3), Ferite rimarginate (1), Monconi necrotizzati (3), Carie (3), Carpofori (3), Branche compromesse (3), Ferite da taglio marcescenti (1), Branche secche (2)
Chioma	Posizione asimmetria Ovest (1), Clorosi (1), Dissecamento (2)
Agenti patogeni	Fomitiporia punctata (3)
Interferenze	Fognature - cavidotti interrati (1)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	17/08/2026	Castello	20	800,00				
2	17/08/2026	Castello	180	850,00				

Lavori proposti


Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		02/09/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	17/08/2026 18:39:47	Luca Fantini	In lavorazione
2	07/09/2026 20:06:05	Luca Fantini	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 20:06:05	Luca Fantini	Validata

Measuring / object data

Measurement no.:	1	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	:	**Needle state:**	---	**Level**	:
Drilling depth	: 40,21 cm	**Tilt**	: +14°	**Direction:**	
Date	: 17.08.2026	**Offset**	: 90 / 335	**Species**	:
Time	: 12:00:46	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	:
Feed	: 100 cm/min			**Name**	:

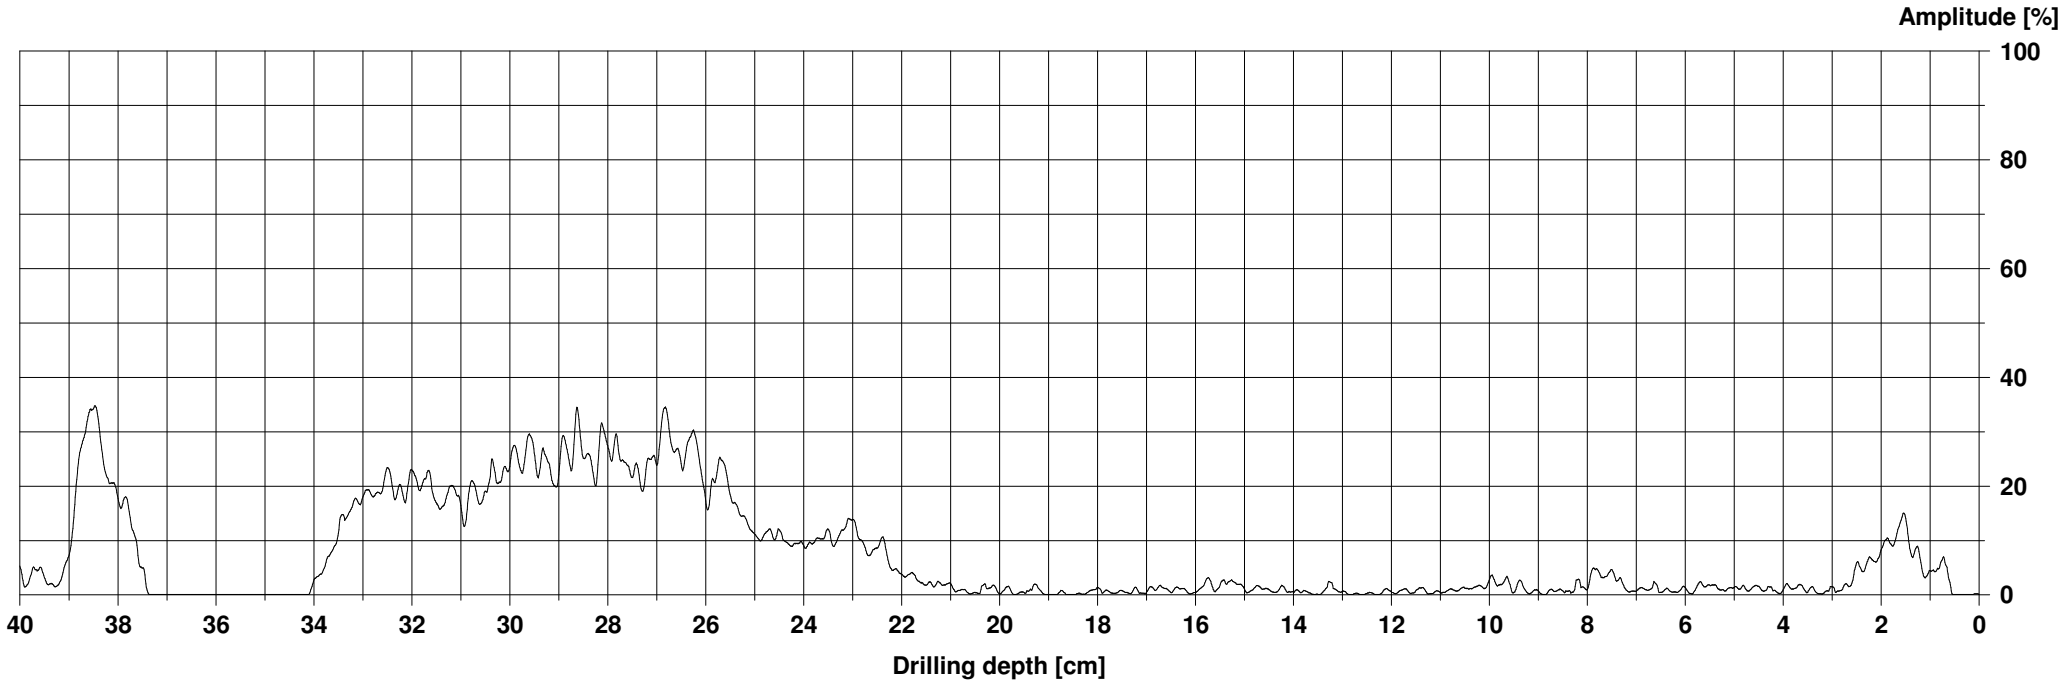


Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	2	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	:	**Needle state:**	---	**Level**	:
Drilling depth	: 40,20 cm	**Tilt**	: +10°	**Direction:**	
Date	: 17.08.2026	**Offset**	: 90 / 329	**Species**	:
Time	: 12:01:26	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	:
Feed	: 100 cm/min			**Name**	:

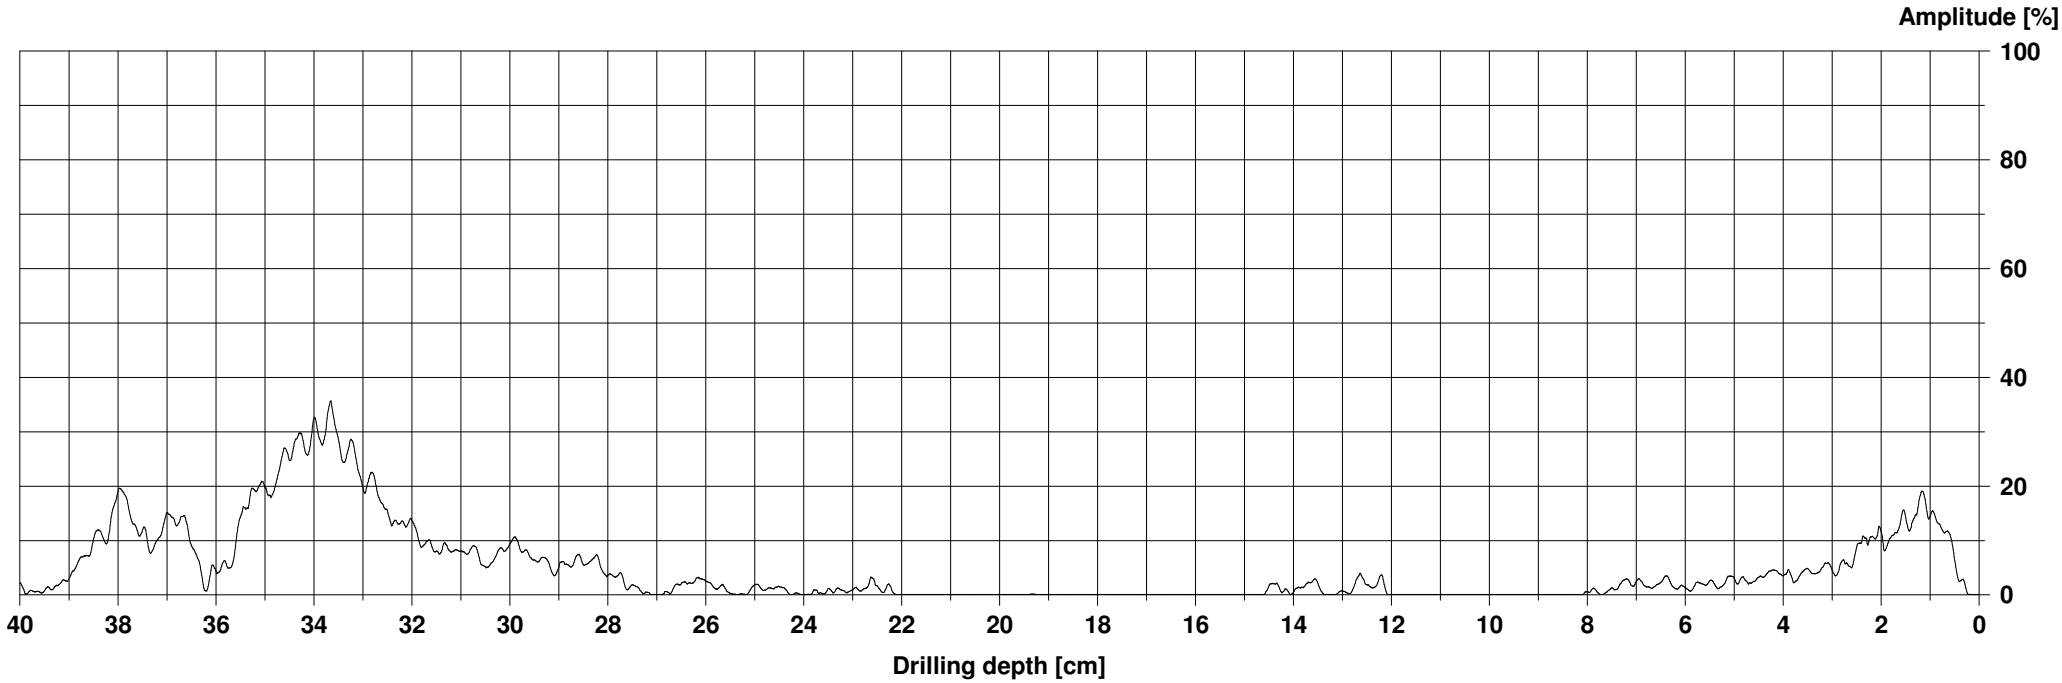

Assessment

Comment














ArcGIS Web Map

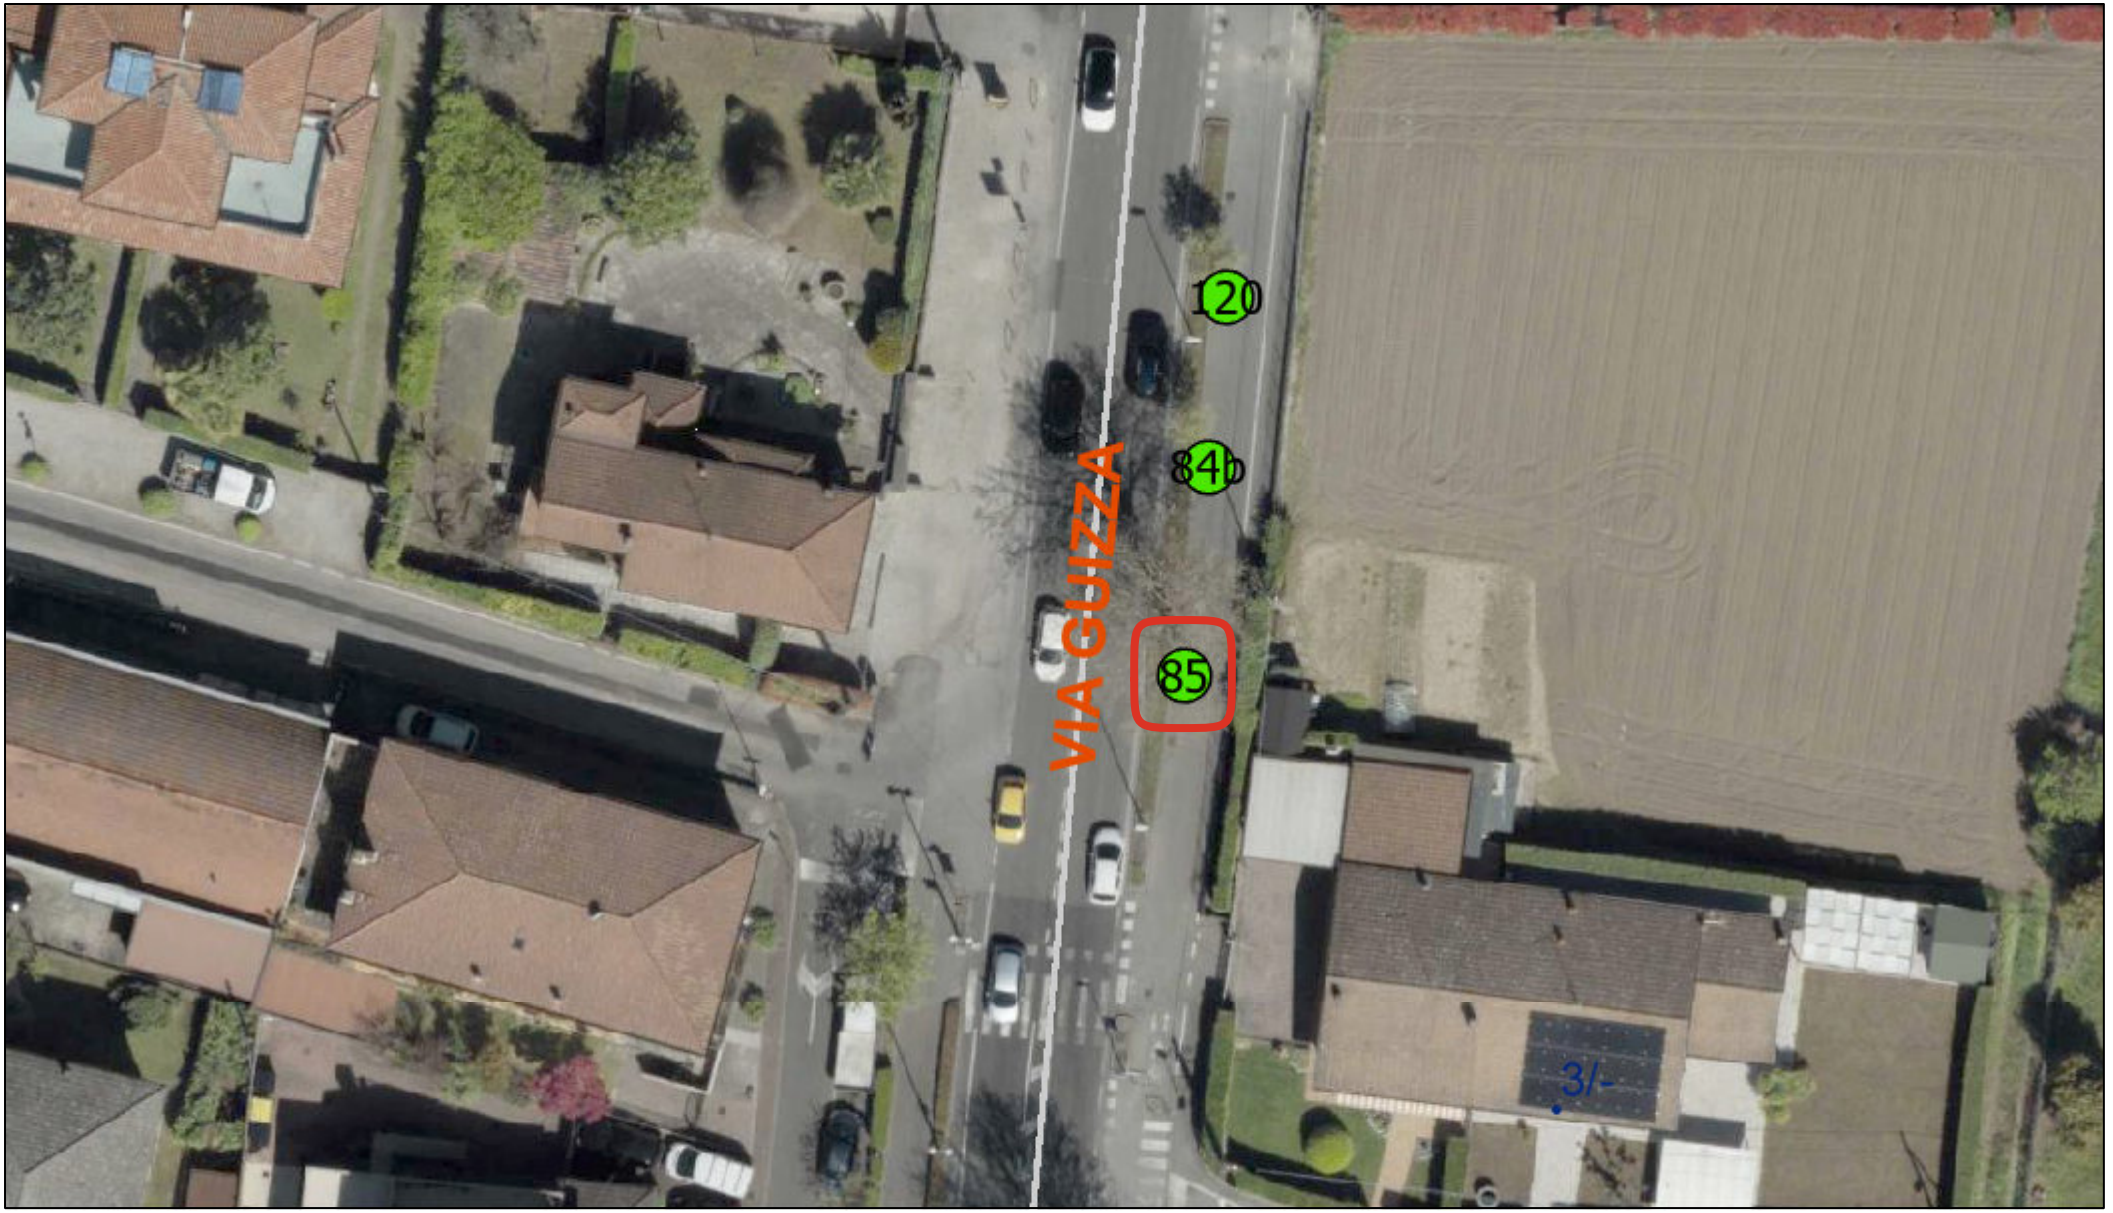

11/09/2026, 12:46:14

1:403

0 0,00325 0,0065 0,013 mi

0 0,005 0,01 0,02 km

Scheda pianta 4.39701 - Via Guizza **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	96	**Cartellino**	
Coordinate	724.796,38 / 5.026.791,19		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Platanus × hispanica (Platano comune)		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio			
Altezza	15,19 m	**Ø chioma**	7,86 m
Altezza castello	5,10 m		
Circ. tronco	242 cm	**Ø tronco**	77,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	61
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	56
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

Generata il 09/09/2026

VSA - Data: 04/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Luca Fantini
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Banchina
Stato vegetativo	1 normale
Altezza	15,19 m
Ø chioma	7,86 m
Altezza castello	5,10 m
Ø tronco	77,00 cm
Circ. tronco	242 cm



Note Pianta esposta, residuale di precedente filare, sita in area parcheggio. Lesione aperta al colletto per probabile danno da urto, con carie affiorante, lato nord-est. I quattro sondaggi penetrometrici rilevano tutti un intenso processo di carie centrale con spessore di legno residuo integro esterno ormai al di sotto dei valori statistici di sicurezza alla rottura su tre quarti della circonferenza basale. Anche lo spessore di legno residuo integro medio è quindi al di sotto dei valori statistici (t/R medio=0,20).

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Radici	Radici affioranti (2), Taglio radicale (3), Sottoservizi, reti tecnologiche (2), Presenza gravi danni (3)
Colletto	Allargato (2), Carie (3), Cavità individuata strumentalmente (3), Ricacci basali (2)
Fusto	Fusto inclinato (1)
Branche	Branche capitozzate (2)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
20	04/08/2026	Colletto	0	0,00		140,00	10,00	0,14
21	04/08/2026	Colletto	180	5,00		140,00	25,00	0,36
22	04/08/2026	Colletto	90	0,00		150,00	8,00	0,11
23	04/08/2026	Colletto	270	0,00		150,00	14,00	0,19

Lavori proposti


Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		20/08/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	04/08/2026 12:18:46	Luca Fantini	In lavorazione
2	07/09/2026 20:06:00	Luca Fantini	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 20:06:00	Luca Fantini	Validata

Measuring / object data

Measurement no.:	20	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	:	**Needle state:**	---	**Level**	:
Drilling depth	: 27,13 cm	**Tilt**	: -23°	**Direction:**	
Date	: 04.08.2026	**Offset**	: 86 / 277	**Species**	:
Time	: 08:32:54	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	:
Feed	: 100 cm/min			**Name**	:

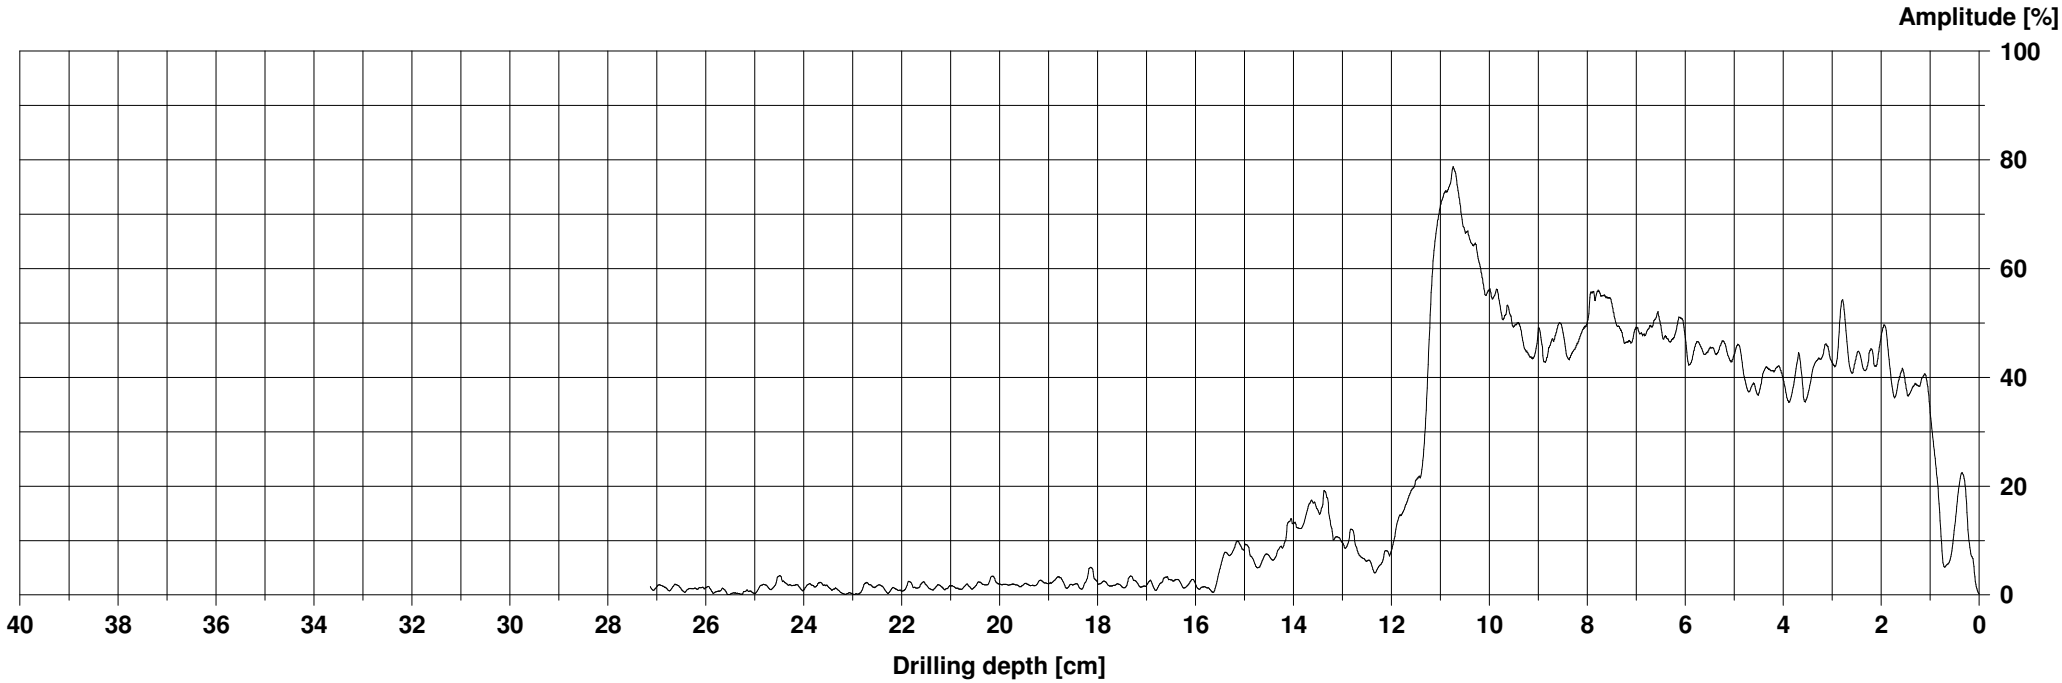


Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	21	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	:	**Needle state:**	---	**Level**	:
Drilling depth	: 31,65 cm	**Tilt**	: -26°	**Direction:**	
Date	: 04.08.2026	**Offset**	: 95 / 289	**Species**	:
Time	: 08:34:03	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	:
Feed	: 100 cm/min			**Name**	:

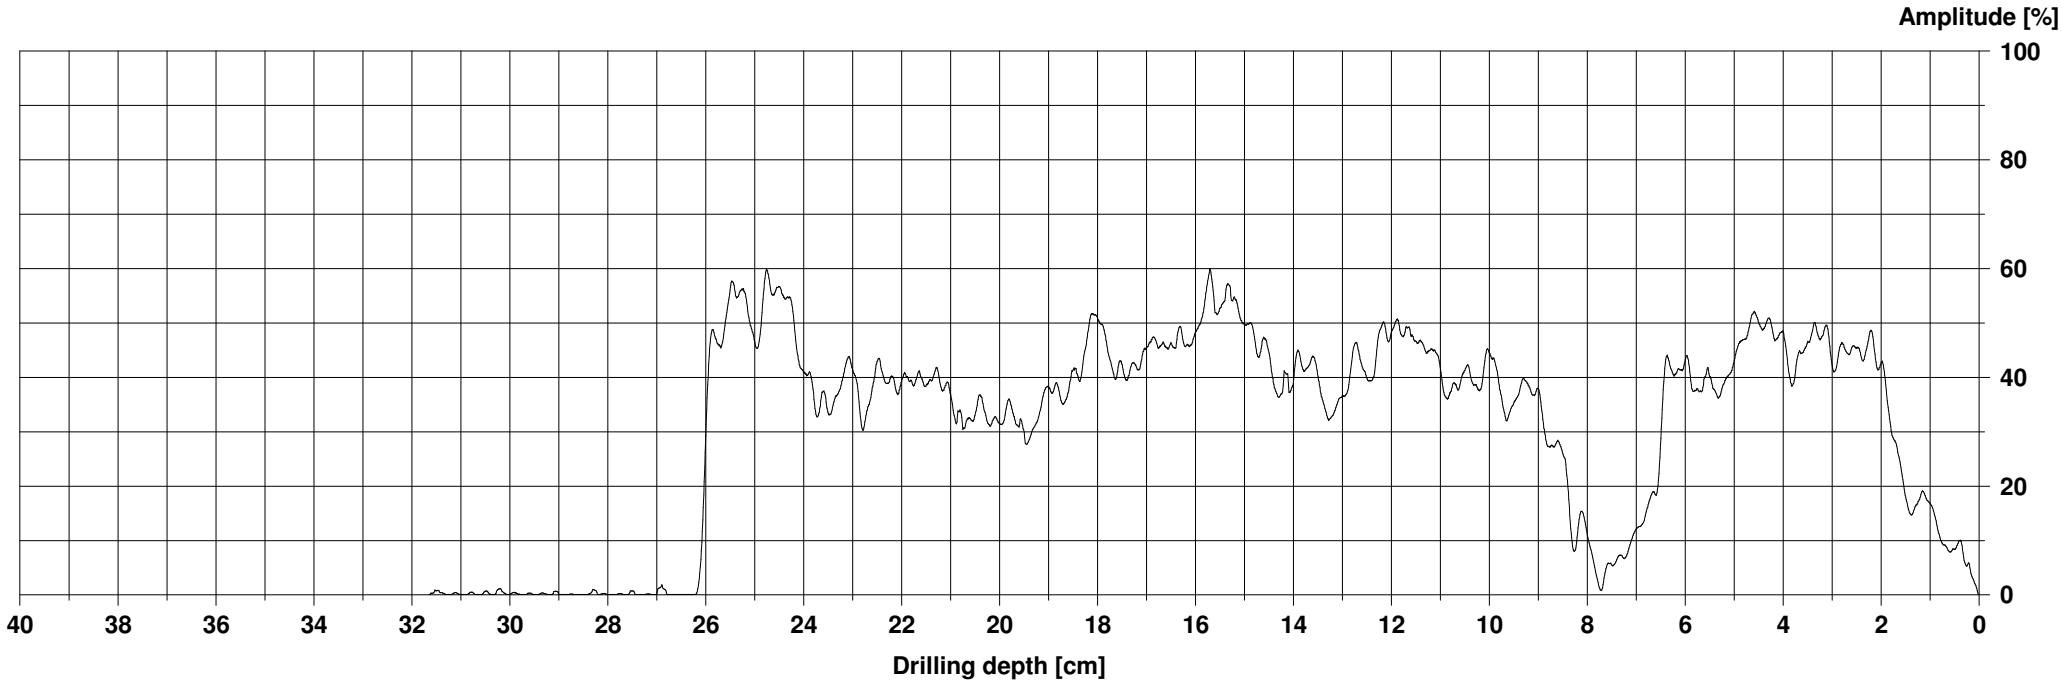


Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	22	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	:	**Needle state:**	---	**Level**	:
Drilling depth	: 22,45 cm	**Tilt**	: -24°	**Direction:**	
Date	: 04.08.2026	**Offset**	: 75 / 284	**Species**	:
Time	: 08:34:40	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	:
Feed	: 100 cm/min			**Name**	:

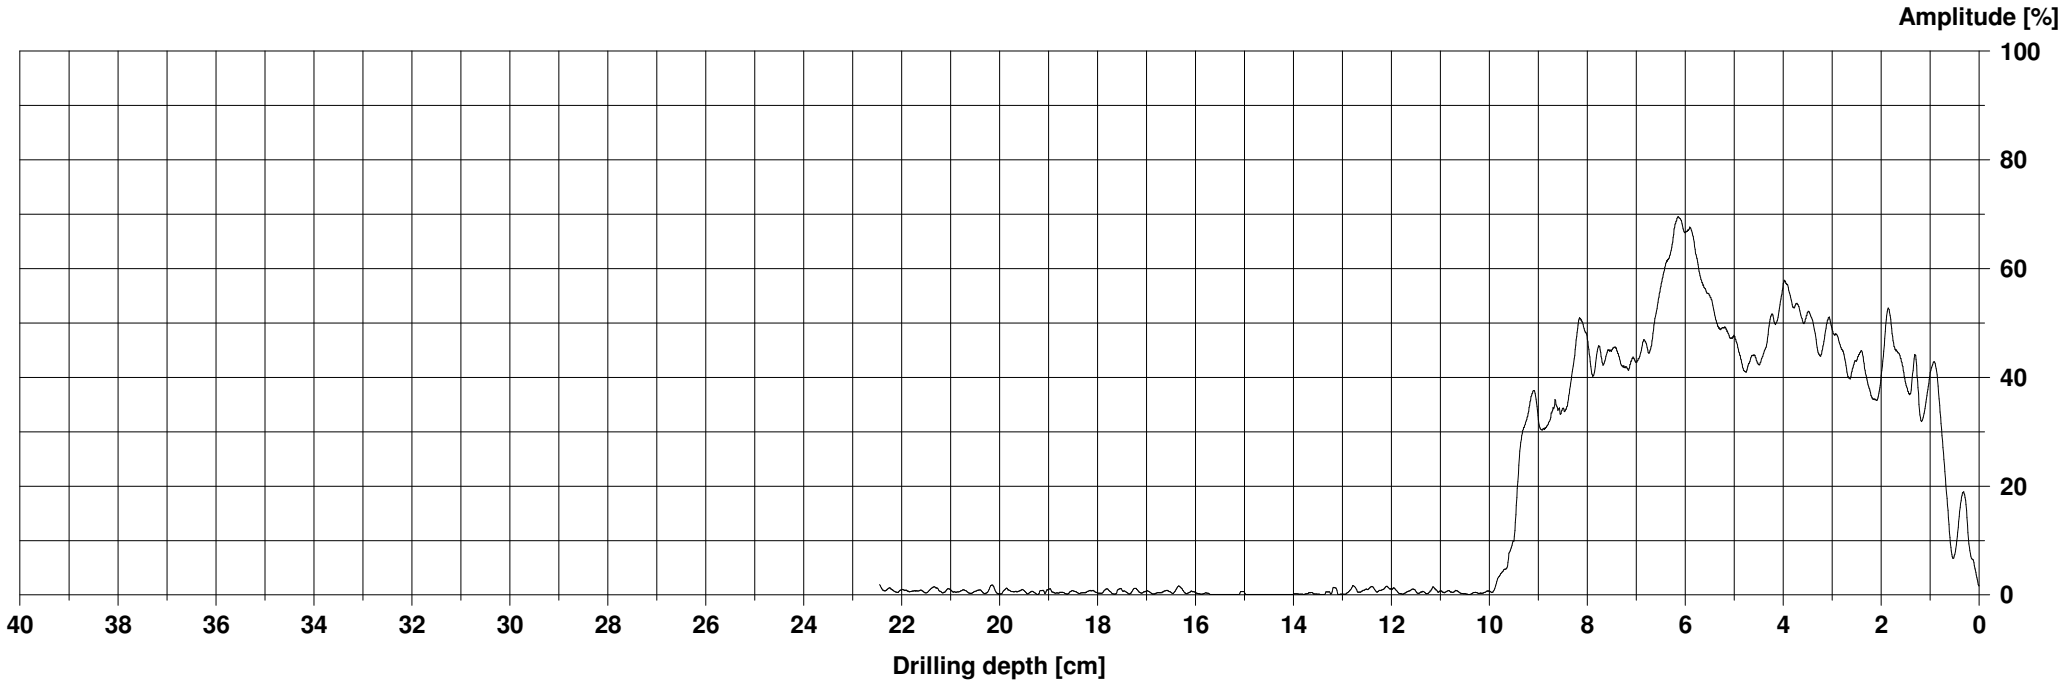


Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	23	**Speed**	: 2500 r/min	**Diameter:**	
ID number	:	**Needle state:**	---	**Level**	:
Drilling depth	: 40,21 cm	**Tilt**	: -22°	**Direction:**	
Date	: 04.08.2026	**Offset**	: 72 / 302	**Species**	:
Time	: 08:35:27	**Avg. curve**	: off / off	**Location**	:
Feed	: 100 cm/min			**Name**	:

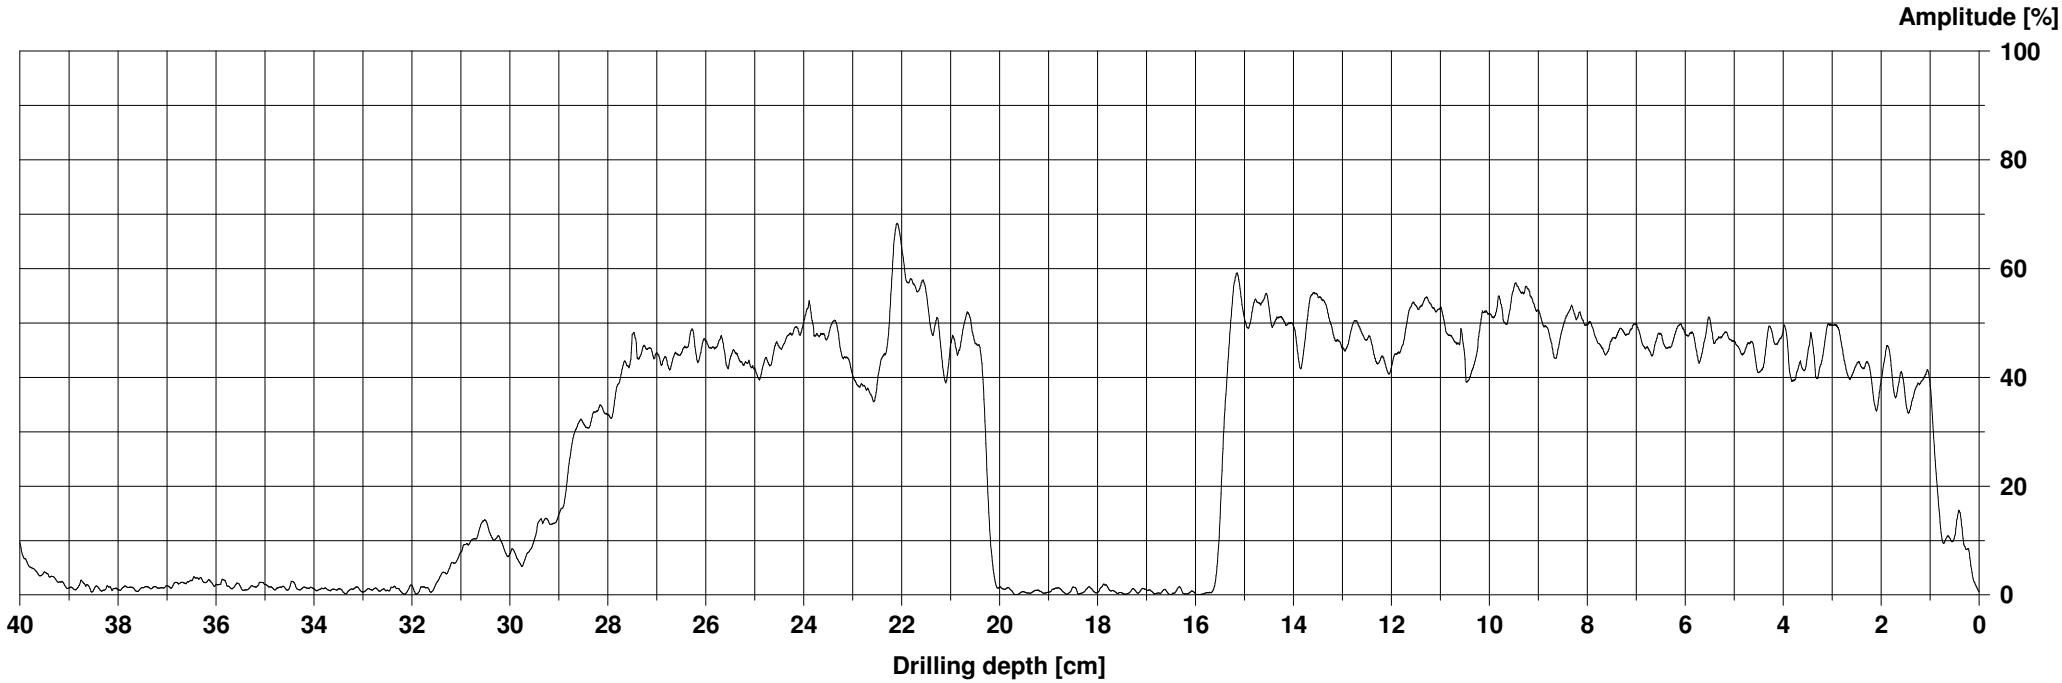

Assessment

Comment









ArcGIS Web Map



11/09/2026, 12:47:22

1:403

0 0,00325 0,0065 0,013 mi

0 0,005 0,01 0,02 km

PADOVA URBS PICTA I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Al Quartiere n. 4 Sud - Est
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di una pianta in via Guizza (n. 136 dell'inventario delle alberature comunali)

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 1 esemplare di *Cercis siliquastrum* presente in via Guizza.

L'esemplare di *Cercis siliquastrum* presenta significativi difetti strutturali e danni riconducibili a pregressi danni da urto. Il fusto presenta una marcata inclinazione anomala associata e una spiombatura della chioma, con conseguente alterazione dell'equilibrio biomeccanico dell'esemplare. In corrispondenza del colletto sono state rilevate lesioni aperte e un crack da trazione, rappresentando un elemento di particolare criticità per la stabilità dell'albero. Il tronco risulta inoltre parzialmente decorticato e presenta evidenti segni di danneggiamento meccanico, con conseguente riduzione della capacità di compartimentazione e della resistenza dei tessuti interessati.

Il quadro complessivo evidenzia una compromissione strutturale concentrata nella porzione basale dell'esemplare, tali condizioni determinano un significativo incremento del rischio di cedimento, rendendo incompatibile il mantenimento dell'alberatura in condizioni di sicurezza.

Pertanto, in considerazione delle risultanze della valutazione VTA e della classificazione in Classe di Propensione al Cedimento D, si ritiene necessario procedere all'abbattimento dell'esemplare a tutela della pubblica incolumità.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
136	*Cercis siliquastrum*	Esito VTA: classe CPC D	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegati: scheda rilevamento dati, foto, planimetria con indicata l'ubicazione della pianta.

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026
15:02:51
GMT+01:00

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana

Scheda pianta 4.39701 - Via Guizza **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	136	**Cartellino**	
Coordinate	724.877,10 / 5.027.394,67		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Cercis siliquastrum (Albero di Giuda)		
Sito di crescita	Parterre		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio			
Altezza	4,17 m	**Ø chioma**	4,46 m
Altezza castello	1,82 m		
Circ. tronco	41 cm	**Ø tronco**	13,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Preciso	**Età pianta calcolata**	14
Data impianto	01/01/2012	**Età all'impianto**	0
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Irrigazione	
[X] Palo tutore		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

Generata il 09/09/2026

VSA - Data: 04/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Luca Fantini
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Parterre
Stato vegetativo	1 normale
Altezza	4,17 m
Ø chioma	4,46 m
Altezza castello	1,82 m
Ø tronco	13,00 cm
Circ. tronco	41 cm



Note Pianta di dimensioni contenute, ma con inclinazione anomala del fusto e crack a trazione al colletto. Probabile conseguenza di un danno da urto.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Colletto	Orifizi - fessure - lesioni aperte (3)
Fusto	Fusto inclinato (3), Decorticazione - danni alla corteccia (2)
Chioma	Asimmetrica (1), Spiombatura fuori asse (3)

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		20/08/2026

Iter


#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	04/08/2026 12:18:48	Luca Fantini	In lavorazione
2	07/09/2026 20:05:25	Luca Fantini	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 20:05:25	Luca Fantini	Validata







ArcGIS Web Map

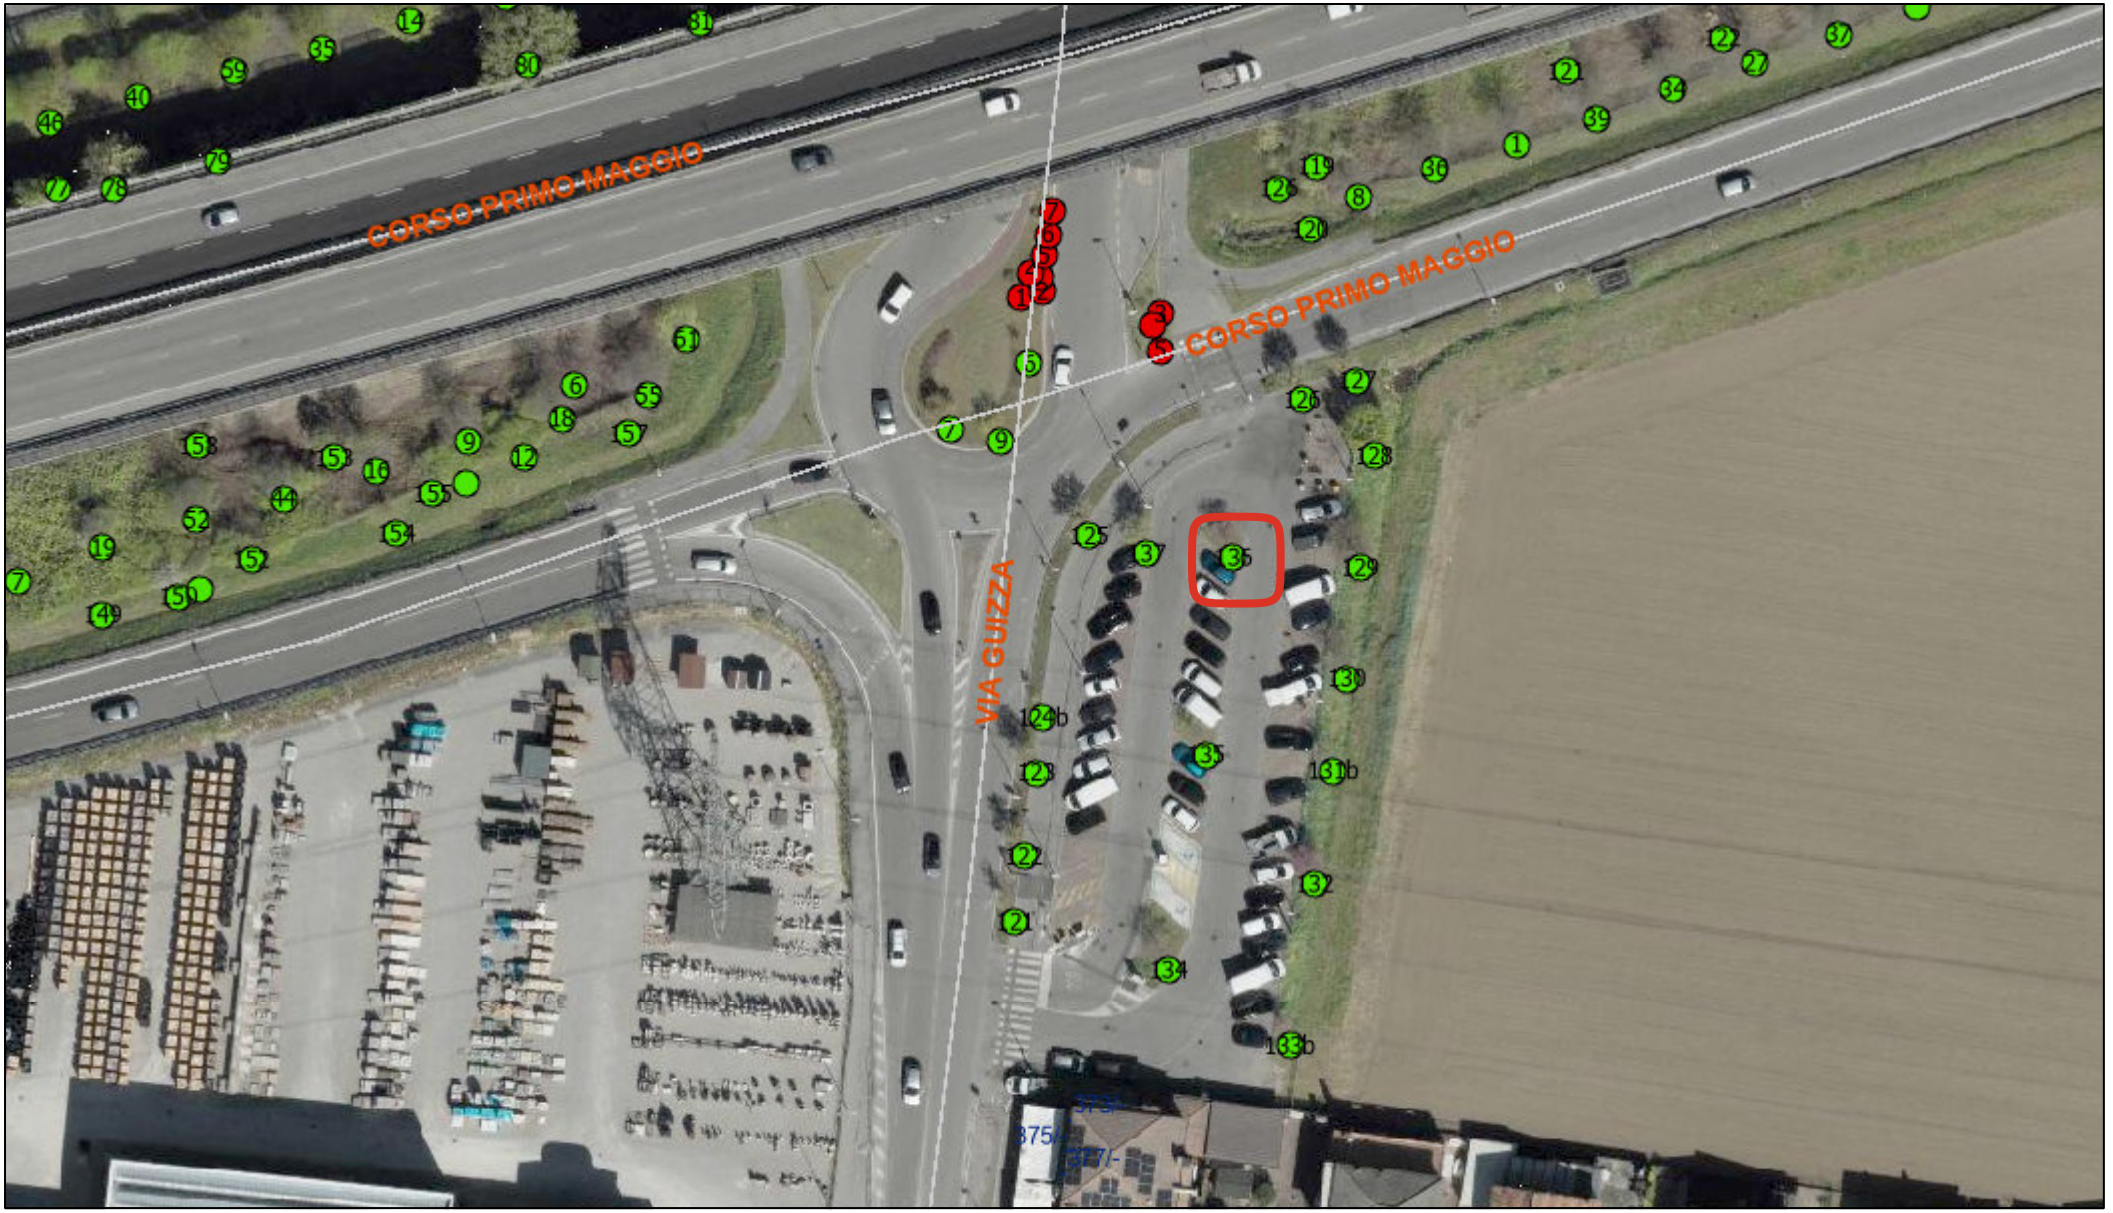

11/09/2026, 12:38:25

1:806

0 0,005 0,01 0,02 mi

0 0,01 0,02 0,04 km

Grafo Vie

Numeri Civici

Alberi

Albero,Ceppaia

Albero,Pianta morta

Albero,Pianta non gestita

Albero,Pianta viva

Albero,Posto libero

Cespuglio,Viva

Pianta in vaso/fioriera,Viva

Web AppBuilder for ArcGIS

PADOVA URBS PICTA

I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Al Quartiere n. 1 Centro
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di una pianta in via Michele Sanmicheli (n. 28 dell'inventario delle alberature comunali)

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 1 esemplare di *Tilia × europaea* presente in via Michele Sanmicheli.

L'esemplare di *Tilia × europaea* monitorato, presenta una grave alterazione strutturale localizzata al colletto e alla porzione basale del fusto, documentata sia dall'ispezione visiva sia dalle indagini dendrodensitometriche eseguite nel 2026. La valutazione evidenzia una significativa perdita di continuità e funzionalità del legno strutturale nella zona di trasmissione dei carichi tra apparato radicale e fusto.

Particolarmente rilevante risulta la progressione del fenomeno degradativo rispetto alle valutazioni precedenti: la carie basale, già rilevata nel 2024 in forma discontinua e con residua efficienza strutturale ritenuta sufficiente, risulta nel 2026 significativamente evoluta, interessando una porzione sostanziale della sezione basale.

La concordanza tra i rilievi visivi e i risultati strumentali, unitamente alla presenza di cavità basale, lesioni dei contrafforti e alterazioni del colletto, depone per una compromissione strutturale avanzata della porzione dell'albero maggiormente sollecitata dalle azioni meccaniche derivanti dal peso della chioma e dal vento.

Considerata la natura evolutiva del decadimento, la localizzazione del difetto in un settore strategico per la stabilità dell'albero e la presenza di bersagli potenzialmente esposti lungo la viabilità, si ritiene che il rischio residuo associato al mantenimento dell'esemplare non sia adeguatamente mitigabile mediante ordinari interventi arboricolturali, rendendo necessario l'abbattimento dell'esemplare a tutela della pubblica incolumità.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
28	*Tilia x europaea*	Esito VTA e indagini strumentali: classe CPC D	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegati: scheda rilevamento dati, foto, indagini strumentali, planimetria con indicata l'ubicazione

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026
15:02:51
GMT+01:00

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana

Scheda pianta 1.72959 - Via Sanmicheli Michele **1 - Quartiere 1**

Nr. albero	28	**Cartellino**	
Coordinate	725.634,18 / 5.031.212,34		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Tilia × europaea		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	21,13 m	**Ø chioma**	11,23 m
Altezza castello	5,23 m		
Circ. tronco	223 cm	**Ø tronco**	71,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	71
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	66
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 03/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Mattia Morello
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Banchina
Stato vegetativo	1 normale
Altezza	21,13 m
Ø chioma	11,23 m
Altezza castello	5,23 m
Ø tronco	71,00 cm
Circ. tronco	223 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note 2024: Rilevata la presenza di carie basale discontinua, con spessore comunque di legno residuo integro esterno ancora sufficiente. 2026: grave avanzamento della carie basale, con parete residua gravemente insufficiente in entrambi i sondaggi densitometrici eseguiti. Elevata propensione alla rottura basale e al ribaltamento della zolla radicale.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Radici affioranti (1), Taglio radicale (2)
Colletto	Contrafforte lesionato (2), Cavità individuata strumentalmente (3), Orifizi - fessure - lesioni aperte (2), Azzampatura (1)
Fusto	Ricacci diffusi - riscoppi (1), Rigonfiamento unilaterale (1)
Castello	Corteccia inclusa (2), Codominanza (2)
Branche	Seccumi (1)
Chioma	Asimmetrica (1), Capitozzo (2)
Interferenze	Fognature - cavidotti interrati (1)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
24	03/08/2026	Colletto	90	2,00		106,00	8,50	0,16
25	03/08/2026	Colletto	350	2,00		104,00	7,50	0,14

Lavori proposti


Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		19/08/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	03/08/2026 17:33:16	Mattia Morello	In lavorazione
2	07/09/2026 21:45:05	Mattia Morello	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 21:45:05	Mattia Morello	Validata

Measuring / object data

Measurement no.:	24	**Speed** :	3500 r/min	**Diameter:**	
ID number :		**Needle state:**	ok	**Level** :	
Drilling depth :	25,99 cm	**Tilt** :	-27°	**Direction:**	
Date :	03.08.2026	**Offset** :	64 / 262	**Species** :	
Time :	16:48:39	**Avg. curve** :	off / off	**Location** :	
Feed :	150 cm/min			**Name** :	

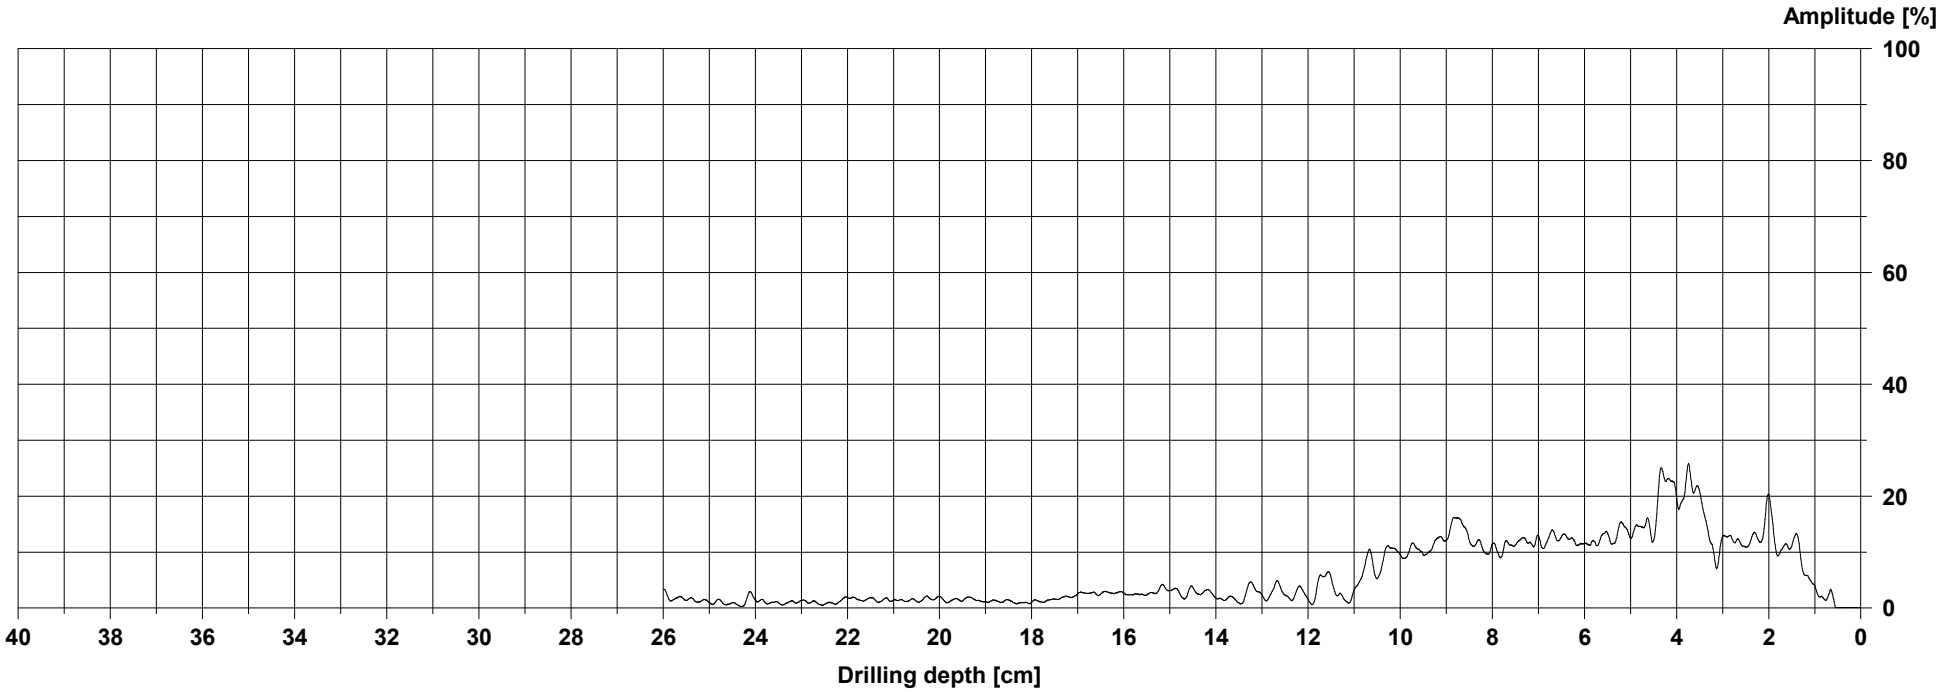


Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	25	**Speed** :	3500 r/min	**Diameter:**	
ID number :		**Needle state:**	ok	**Level** :	
Drilling depth :	24,40 cm	**Tilt** :	-21°	**Direction:**	
Date :	03.08.2026	**Offset** :	65 / 268	**Species** :	
Time :	16:50:42	**Avg. curve** :	off / off	**Location** :	
Feed :	150 cm/min			**Name** :	

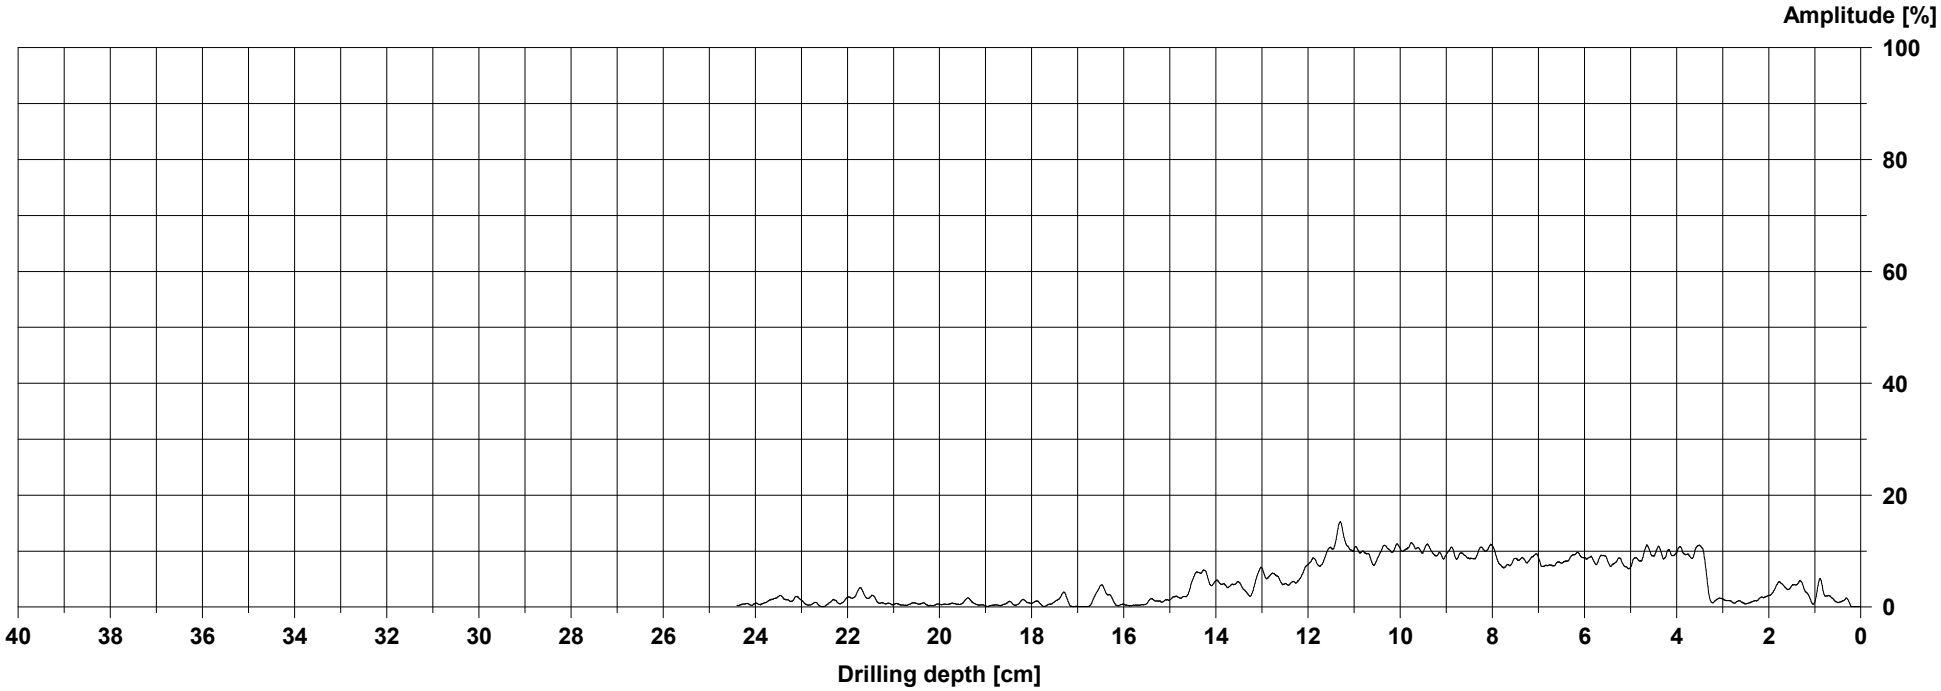

Assessment

Comment









ArcGIS Web Map



11/09/2026, 13:19:11

1:347

0 0,00275 0,0055 0,011 mi

0 0,0045 0,009 0,018 km

Web AppBuilder for ArcGIS

PADOVA URBS PICTA I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Al Quartiere n. 4 Sud - Est
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di una pianta in via Pietro Bembo (n. 147 dell'inventario delle alberature comunali)

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 1 esemplare di *Robinia pseudoacacia 'Monophylla'* presente in via Pietro Bembo.

L'esemplare di *Robinia pseudoacacia 'Monophylla'* presenta un quadro di grave compromissione delle strutture di ancoraggio, dovuto a estesi fenomeni di decadimento a carico dell'apparato radicale e della porzione basale del fusto. La pianta presenta un decadimento affiorante sul lato nord del colletto, esteso a circa il 40% della superficie basale, indicativo di un avanzato processo di alterazione dei tessuti legnosi. Le indagini strumentali hanno confermato la natura e l'entità del decadimento rilevato visivamente in quanto hanno riscontrato la presenza di carie nei primi centimetri di profondità del fusto.

Il decadimento interessa pertanto le principali strutture di ancoraggio dell'esemplare, con una significativa riduzione dell'integrità meccanica delle radici portanti e della porzione basale del fusto. La presenza di carie radicale associata a decadimento superficiale del colletto configura una condizione di particolare criticità.

Tali condizioni risultano incompatibili con il mantenimento dell'alberatura in condizioni di sicurezza e giustificano l'attribuzione della Classe di Propensione al Cedimento D, rendendo necessario procedere all'abbattimento dell'esemplare a tutela della pubblica incolumità.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
147	*Robinia pseudoacacia 'Monophylla'*	Esito VTA e indagini strumentali: classe CPC D	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti


Allegati: scheda rilevamento dati, dati strumentali, foto, planimetria con indicata l'ubicazione del

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026 15:02:51
GMT+01:00

Scheda pianta 4.7502 - Via Bembo Pietro **4 - Quartiere 4**

Nr. albero	147	**Cartellino**	
Coordinate	726.993,68 / 5.026.036,28		
Proprietà	Area di proprietà		



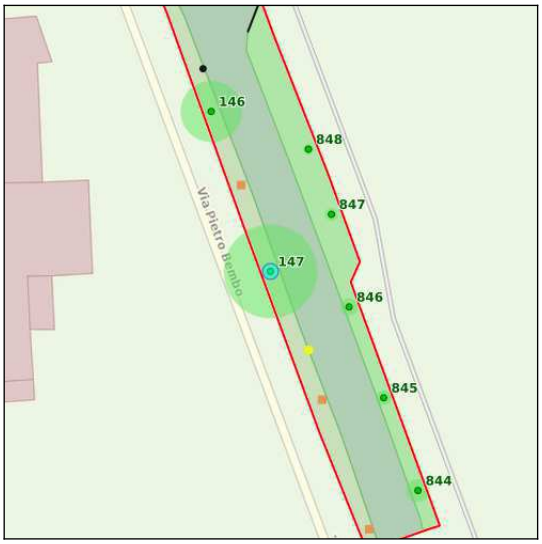

Tassonomia	Robinia pseudoacacia 'Monophylla' (Robinia var. 'Monofilla')		
Sito di crescita	Banchina		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	13,88 m	**Ø chioma**	8,78 m
Altezza castello	3,56 m		
Circ. tronco	116 cm	**Ø tronco**	37,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Preciso	**Età pianta calcolata**	17
Data impianto	01/01/2009	**Età all'impianto**	0
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Irrigazione	
[X] Pavimentazione filtrante			
Note			

VSA - Data: 04/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Pecollo Daniele
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Banchina
Stato vegetativo	1 normale
Altezza	13,88 m
Ø chioma	8,78 m
Altezza castello	3,56 m
Ø tronco	37,00 cm
Circ. tronco	116 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note Lato nord decadimento affiorante sul 40% della superficie basale R1 conferma decadimento dal cm 7 al cm 10 R2 conferma carie sui primi 8 cm: il decadimento rilevato deriva quindi da processo di marciume alle radici. Estrema propensione al cedimento per rottura sotto il piano di campagna.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Carie (3), Sottoservizi, reti tecnologiche (1)
Colletto	Decadimento superficiale (3)
Fusto	Ricacci diffusi - riscoppi (1), Lesioni cicatrizzate (1)
Branche	Seccumi (1), Ferite rimarginate (1)
Interferenze	Cavi elettrici - telefonici (1)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
15	04/08/2026	Colletto	140	0,00		40,00		
Note	Carie dal cm 7 al cm 10							
16	04/08/2026	Colletto	270	0,00		40,00		
Note	Carie sottocorticale nei primi 8 cm							

Lavori proposti


Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		20/08/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	04/08/2026 14:42:36	Pecollo Daniele	In lavorazione
2	07/09/2026 20:48:41	Pecollo Daniele	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 20:48:41	Pecollo Daniele	Validata

Measuring / object data

Measurement no.:	15	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	---	Level	:
Drilling depth	: 20,48 cm	Tilt	: -38é	Direction:	
Date	: 04.08.2026	Offset	: 54 / 295	Species	:
Time	: 08:48:21	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 50 cm/min			Name	:

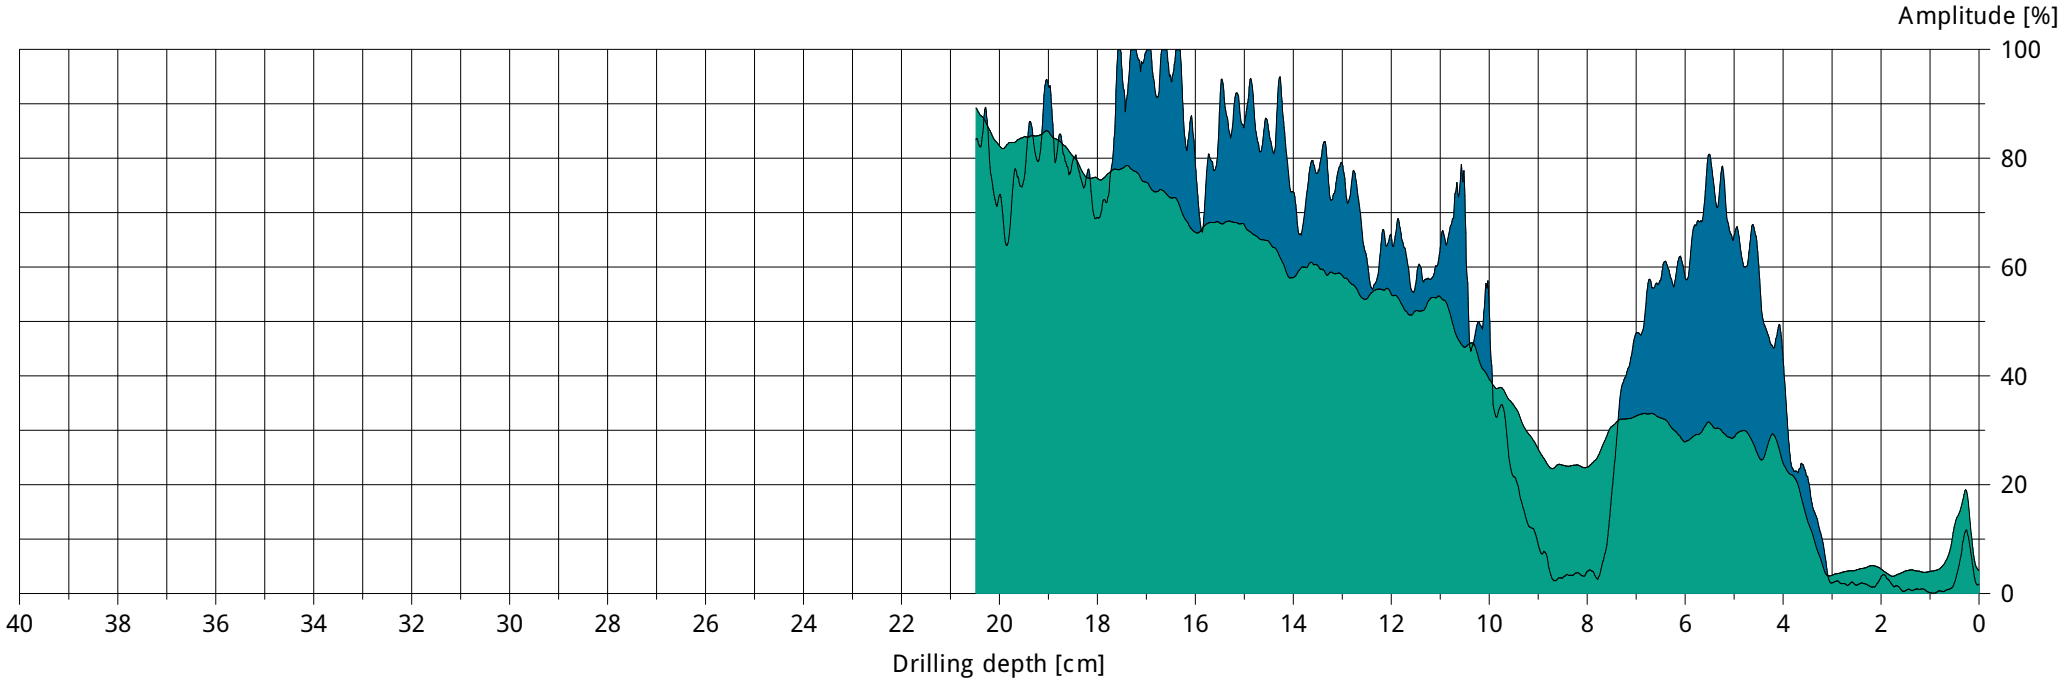


Assessment

Comment

Measuring / object data

Measurement no.:	16	Speed	: 2500 r/min	Diameter:	
ID number	:	Needle state:	---	Level	:
Drilling depth	: 14,91 cm	Tilt	: -48é	Direction:	
Date	: 04.08.2026	Offset	: 43 / 285	Species	:
Time	: 08:50:00	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 50 cm/min			Name	:

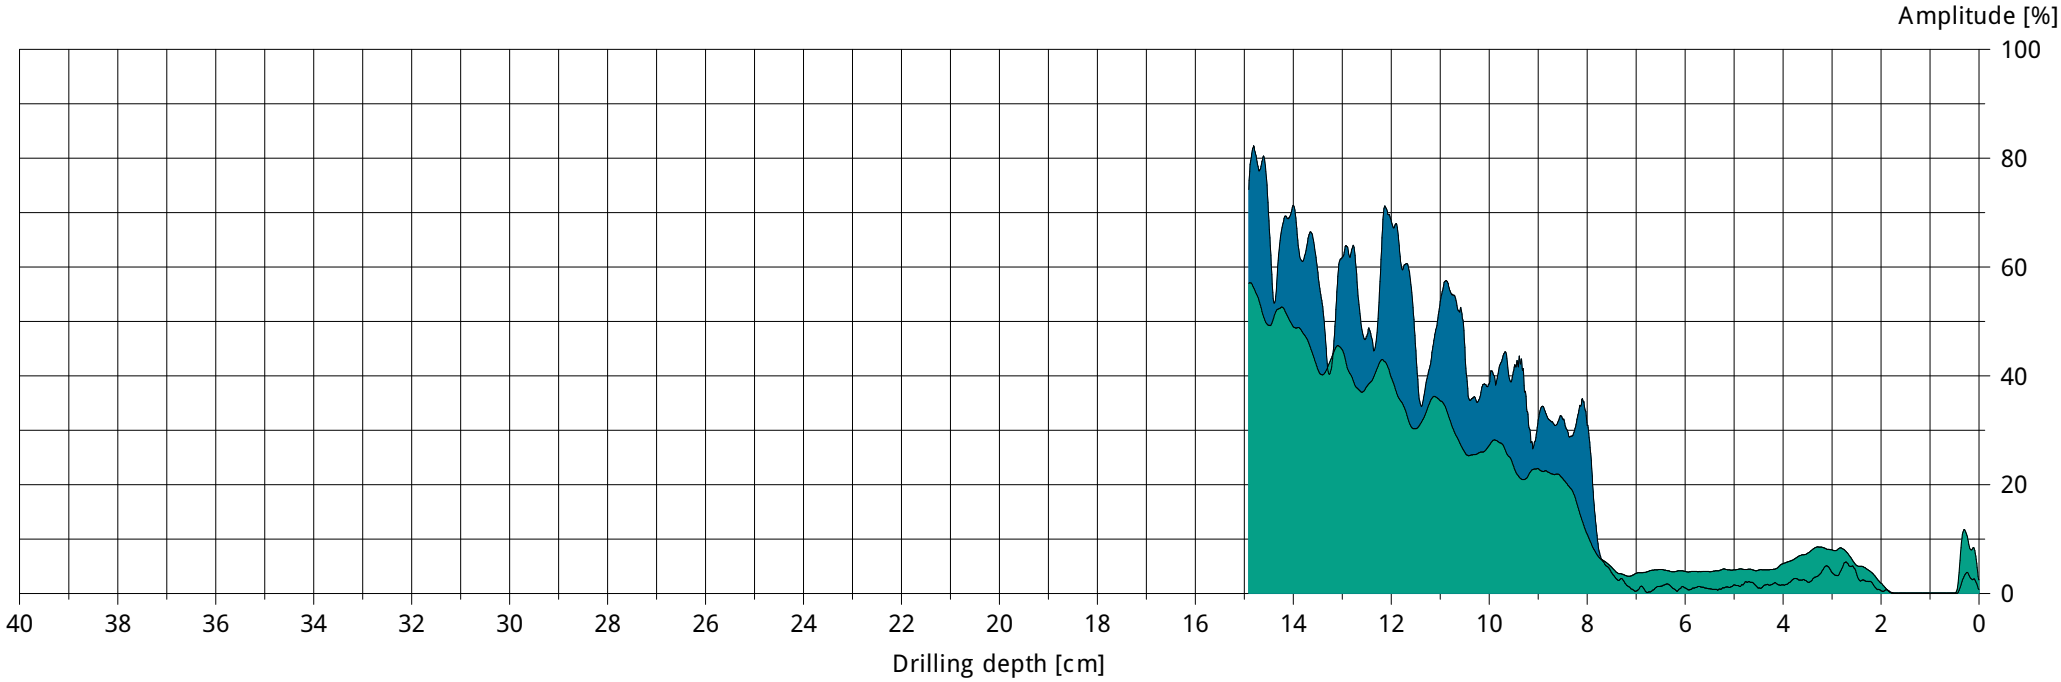

Assessment

Comment










ArcGIS Web Map

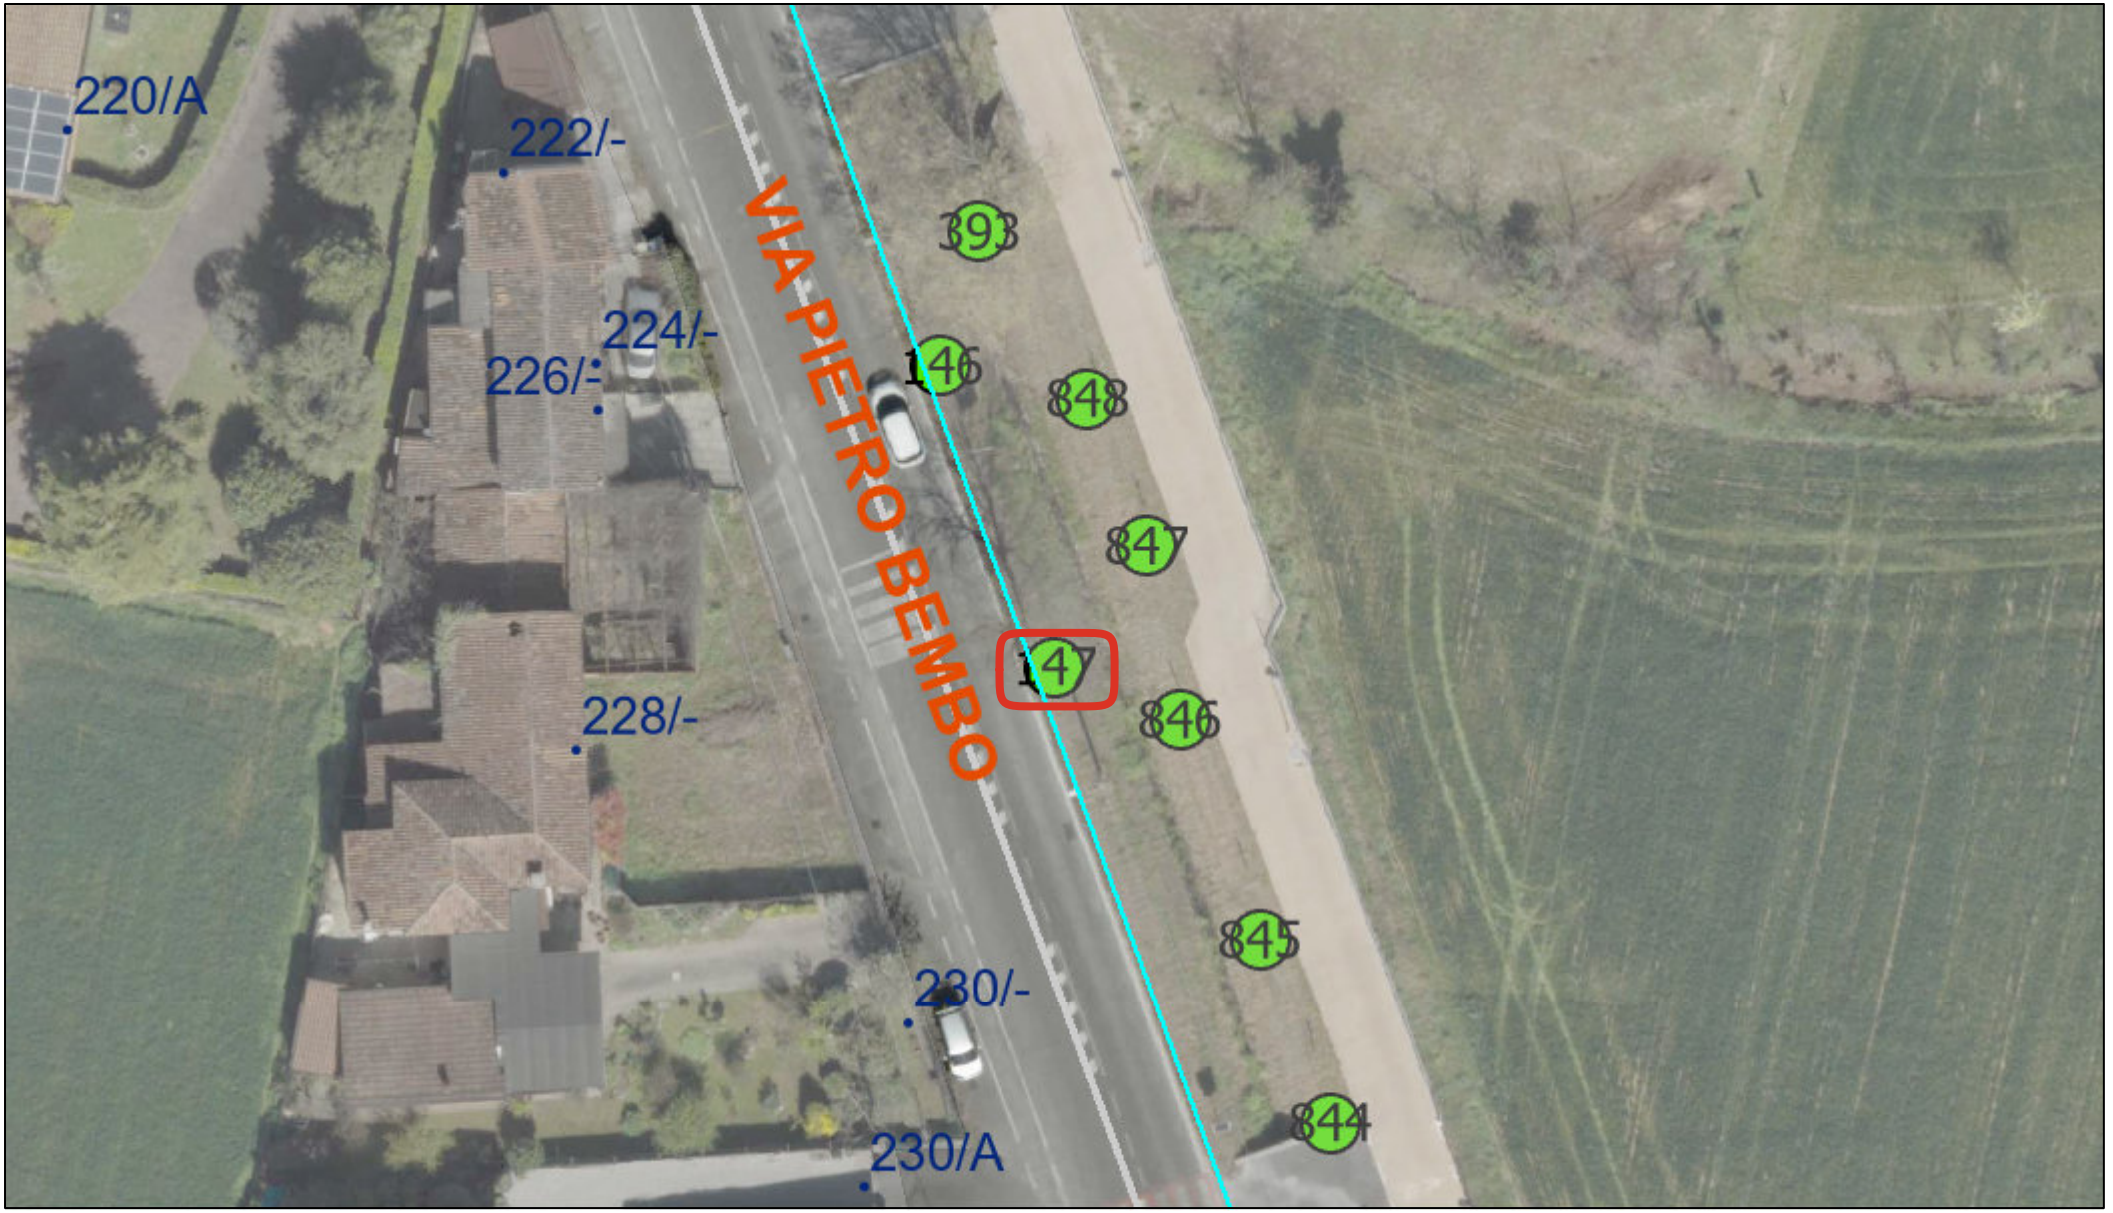

11/09/2026, 12:13:30

1:362

0 0,003 0,006 0,012 mi

0 0,00475 0,0095 0,019 km

PADOVA URBS PICTA

I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Al Quartiere n. 5 Sud - Ovest
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di due piante in via Sorio (n. 104, 121 dell'inventario delle alberature comunali)

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 2 esemplari di *Prunus serrulata 'Accolade'* presenti in via Sorio.

L'esemplare di Prunus serrulata 'Accolade' inventariato con numero 104 evidenzia un quadro fitosanitario e strutturale compromesso, caratterizzato da estese lesioni del fusto riconducibili a fenomeni di scottatura corticale e da diffusi processi di carie a carico del fusto e del castello, associati alla presenza di resti di carpofori fungini. Lo stato vegetativo deperiente conferma una ridotta capacità di reazione ai danni e una progressiva perdita di funzionalità dell'esemplare. In considerazione della localizzazione dei difetti, della loro natura evolutiva e della suscettibilità della specie ai fenomeni di decadimento conseguenti alle lesioni corticali, si ritiene che il mantenimento del soggetto non risulti proporzionato rispetto al valore ornamentale residuo dell'albero, oggi significativamente ridotto dalle alterazioni riscontrate. Trattandosi di un esemplare di limitate dimensioni, relativamente giovane e facilmente sostituibile, l'intervento di abbattimento e reimpianto appare tecnicamente più conveniente rispetto all'adozione di ulteriori misure conservative, consentendo il ripristino in tempi contenuti della funzione paesaggistica e ornamentale dell'alberata.

L'esemplare di Prunus serrulata 'Accolade' inventariato con numero 121 presenta un marcato stato di deperimento vegetativo, manifestato da una crescita stentata e da una ridotta vigoria complessiva. La chioma risulta per gran parte disseccata con conseguente compromissione delle capacità vegetative dell'albero. In corrispondenza della porzione basale del fusto è stata rilevata un'ampia cavità cariata localizzata sul lato sud-est, indice di un avanzato processo di degradazione dei tessuti legnosi. Tale alterazione interessa una zona strategica per la stabilità dell'esemplare, determinando una sensibile riduzione della capacità portante e della resistenza meccanica residua. Il quadro complessivo evidenzia la concomitante presenza di gravi alterazioni fisiologiche e strutturali, caratterizzate da estesi fenomeni di disseccamento della chioma e da una significativa carie basale. Le condizioni riscontrate attestano uno stato di compromissione non reversibile dell'alberatura e una marcata riduzione delle sue capacità biomeccaniche. Pertanto, in considerazione delle risultanze dell'indagine di valutazione visiva di stabilità dell'albero e della classificazione in Classe di Propensione al Cedimento D, si ritiene necessario procedere all'abbattimento dell'esemplare a tutela della pubblica incolumità.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
104, 121	*Prunus serrulata 'Accolade'*	Esito VTA e indagini strumentali: classe CPC D	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegati: scheda rilevamento dati, foto, indagini strumentali, planimetria con indicata l'ubicazio

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026
15:02:51
GMT+01:00

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana

Scheda pianta 5.78807 - Via Sorio **5 - Quartiere 5**

Nr. albero	104	**Cartellino**	
Coordinate	723.693,81 / 5.031.526,60		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Prunus serrulata accolade (Ciliegio accolade)		
Sito di crescita	Marciapiede		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	5,31 m	**Ø chioma**	4,18 m
Altezza castello	2,09 m		
Circ. tronco	47 cm	**Ø tronco**	15,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Preciso	**Età pianta calcolata**	12
Data impianto	01/01/2014	**Età all'impianto**	0
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Irrigazione	
[X] Pavimentazione filtrante			
Note			

VSA - Data: 03/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Luca Fantini
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Marciapiede
Stato vegetativo	2 deperiente
Altezza	5,31 m
Ø chioma	4,18 m
Altezza castello	2,09 m
Ø tronco	15,00 cm
Circ. tronco	47 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note Danni da scottature sul fusto lato ovest, con intensa cari fibrosa e resti di carpofori al castello, non meglio identificabili.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Sottoservizi, reti tecnologiche (2)
Fusto	Carie (3)
Castello	Carie (3), Carpofori (3)
Chioma	Dissecamento (1)

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		19/08/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	03/08/2026 17:22:00	Luca Fantini	In lavorazione
2	07/09/2026 20:06:25	Luca Fantini	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 20:06:25	Luca Fantini	Validata









ArcGIS Web Map



11/09/2026, 13:29:24

1:462

0 0,00375 0,0075 0,015 mi


0 0,005 0,01 0,02 km

Web AppBuilder for ArcGIS

Scheda pianta 5.78807 - Via Sorio **5 - Quartiere 5**

Nr. albero	121	**Cartellino**	
Coordinate	723.967,83 / 5.031.733,37		
Proprietà	Area di proprietà		



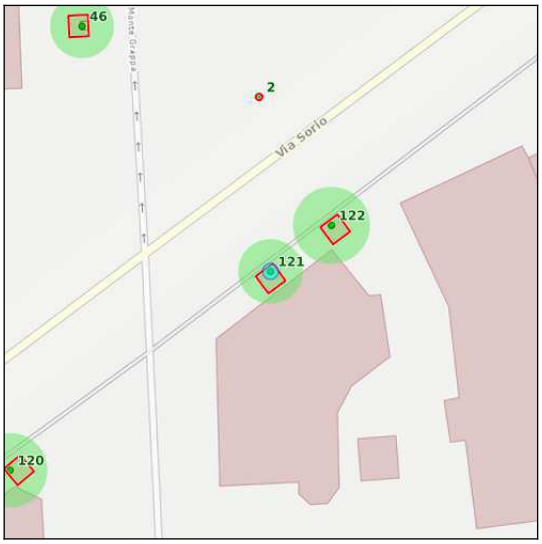

Tassonomia	Prunus serrulata accolade (Ciliegio accolade)		
Sito di crescita	Marciapiede		
		Fase fisiologica	nuovo impianto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata		
Altezza	5,55 m	**Ø chioma**	6,06 m
Altezza castello	2,04 m		
Circ. tronco	91 cm	**Ø tronco**	29,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Preciso	**Età pianta calcolata**	26
Data impianto	01/01/2000	**Età all'impianto**	0
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Irrigazione	
[X] Pavimentazione filtrante			
Note			

VSA - Data: 03/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Luca Fantini
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	nuovo impianto
Sito di crescita	Marciapiede
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente
Altezza	5,55 m
Ø chioma	6,06 m
Altezza castello	2,04 m
Ø tronco	29,00 cm
Circ. tronco	91 cm
Bersaglio	Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata



Note pianta stentata, con ampia carie basale lato sud-est.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Sottoservizi, reti tecnologiche (1)
Colletto	Carie (3)
Chioma	Asimmetrica (2), Dissecamento (2)

Lavori proposti

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		19/08/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	03/08/2026 17:22:02	Luca Fantini	In lavorazione
2	07/09/2026 20:06:22	Luca Fantini	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 20:06:22	Luca Fantini	Validata


PADOVA





ArcGIS Web Map



11/09/2026, 13:32:00

1:462

0 0,00375 0,0075 0,015 mi

0 0,005 0,01 0,02 km

Web AppBuilder for ArcGIS

PADOVA URBS PICTA I CICLI AFFRESCATI DEL XIV SECOLO DI PADOVA

Comune di Padova

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Via N. Tommaseo, 60 - 35131 - Padova
tel. 049.8204475
Codice Fiscale 00644060287

Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Padova, Treviso e Belluno
Palazzo Folco, via Aquileia, 7
35139 Padova
pec : sabap-pd-tv-bl@pec.cultura.gov.it

Al Quartiere n. 1 Centro
Sede

Oggetto: comunicazione di abbattimento di una pianta in via Trieste (n. 15 dell'inventario delle alberature comunali)

In accordo con il piano di monitoraggio delle alberature comunali sono state eseguite indagini fitosanitarie e di valutazione della stabilità su n. 1 esemplare di *Acer platanoides* presente in via Trieste.

L'esemplare di *Acer platanoides* sottoposto ad analisi presenta un quadro di compromissione strutturale e fisiologica supportato dalla concomitante presenza di estese lesioni del fusto e del colletto, attribuibili in parte a fenomeni di scottatura corticale e in parte a traumi meccanici, ma anche da uno stato vegetativo gravemente deperiente e dal rinvenimento di carpofori di *Inonotus hispidus*.

L'indagine dendrodensitometrica ha inoltre confermato la presenza di alterazioni interne del legno in corrispondenza del castello, compatibili con un avanzato processo di decadimento.

Considerata la localizzazione dell'albero in un'area caratterizzata da elevata presenza di persone, se ne prescrive l'abbattimento secondo il principio di precauzione nella gestione del rischio arboreo.

Al Quartiere si comunica ai sensi della delibera di C.C. n. 42 del 05/06/06.

N. INV.	SPECIE	MOTIVAZIONE	SOSTITUZIONE	NOTE
15	*Acer platanoides*	Esito VTA e indagini strumentali: classe CPC D	prevista	

I fogli notizie relativi verranno collocati entro due giorni dall'intervento.

Distinti saluti.

il Capo Settore
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Dott. Ciro Degl'Innocenti

Allegati: scheda rilevamento dati, foto, indagini strumentali, planimetria con indicata l'ubicazione dell

CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
17.09.2026 15:02:51
GMT+01:00

Struttura Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana Dirigente Dott. Ciro Degl'Innocenti
Sede via Tommaseo n.60 - 35131 Padova **Tel.** 0498204475 – *Unità Operativa Patrimonio Arboreo Pubblico Alberi Stradali*
email: verdepubblico@comune.padova.it – PEC: verde@pec.comune.padova.it
https://www.padovanet.it/ambiente-territorio-e-verde/verde-e-agricoltura-urbana

Scheda pianta 1.83858 - Via Trieste **1 - Quartiere 1**

Nr. albero	15	**Cartellino**	
Coordinate	725.874,24 / 5.032.697,08		
Proprietà	Area di proprietà		





Tassonomia	Acer platanoides (Acero riccio)		
Sito di crescita	Marciapiede		
		Fase fisiologica	adulto
Accessibilità	Accessibile		
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco		
Altezza	6,91 m	**Ø chioma**	5,73 m
Altezza castello	1,86 m		
Circ. tronco	69 cm	**Ø tronco**	22,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Stimato	**Età pianta calcolata**	35
Data stima	01/01/2021	**Età stimata**	30
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
[X] Albero stradale		[X] Pavimentazione filtrante	
Note			

VSA - Data: 04/08/2026	**CPC: D - Gravità estrema**
Stato cartellino	Cartellino da aggiungere
Rilevatore	Mattia Morello
Tipo	Ricontrollo
Fase fisiologica	adulto
Sito di crescita	Marciapiede
Stato vegetativo	3 gravemente deperiente
Altezza	6,91 m
Ø chioma	5,73 m
Altezza castello	1,86 m
Ø tronco	22,00 cm
Circ. tronco	69 cm
Bersaglio	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco



Note Estese lesioni (in parte da scottatura, in parte probabilmente da urto) su colletto e fusto. Carporofo di Inonotis hispidus in chioma. Il sondaggio densitometrico rileva tessuto molto cariato in quota. Elevata propensione a rottura del fusto.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave	
Radici	Radici affioranti decorticate (1), Radice strozzante (2), Sollevamento pavimentazione-cordolo (1), Sottoservizi, reti tecnologiche (1)
Colletto	Orifizi - fessure - lesioni aperte (2)
Fusto	Fusto inclinato (1), Decorticazione - danni alla corteccia (2), Orifizi - fessure - lesioni aperte (2)
Branche	Carpofori (3)
Agenti patogeni	Inonotus hispidus (3)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
52	04/08/2026	Castello	20	230,00		21,00	2,50	0,24

Lavori proposti


Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		20/08/2026

Iter

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	04/08/2026 15:28:55	Mattia Morello	In lavorazione
2	07/09/2026 21:45:11	Mattia Morello	Richiesta validazione (Applicativo)
3	07/09/2026 21:45:11	Mattia Morello	Validata

Measuring / object data

Measurement no.	52	Speed	3500 r/min	Diameter	
ID number		Needle state	ok	Level	
Drilling depth	11,51 cm	Tilt	+9°	Direction	
Date	04.08.2026	Offset	73 / 276	Species	
Time	15:17:45	Avg. curve	off / off	Location	
Feed	150 cm/min			Name	

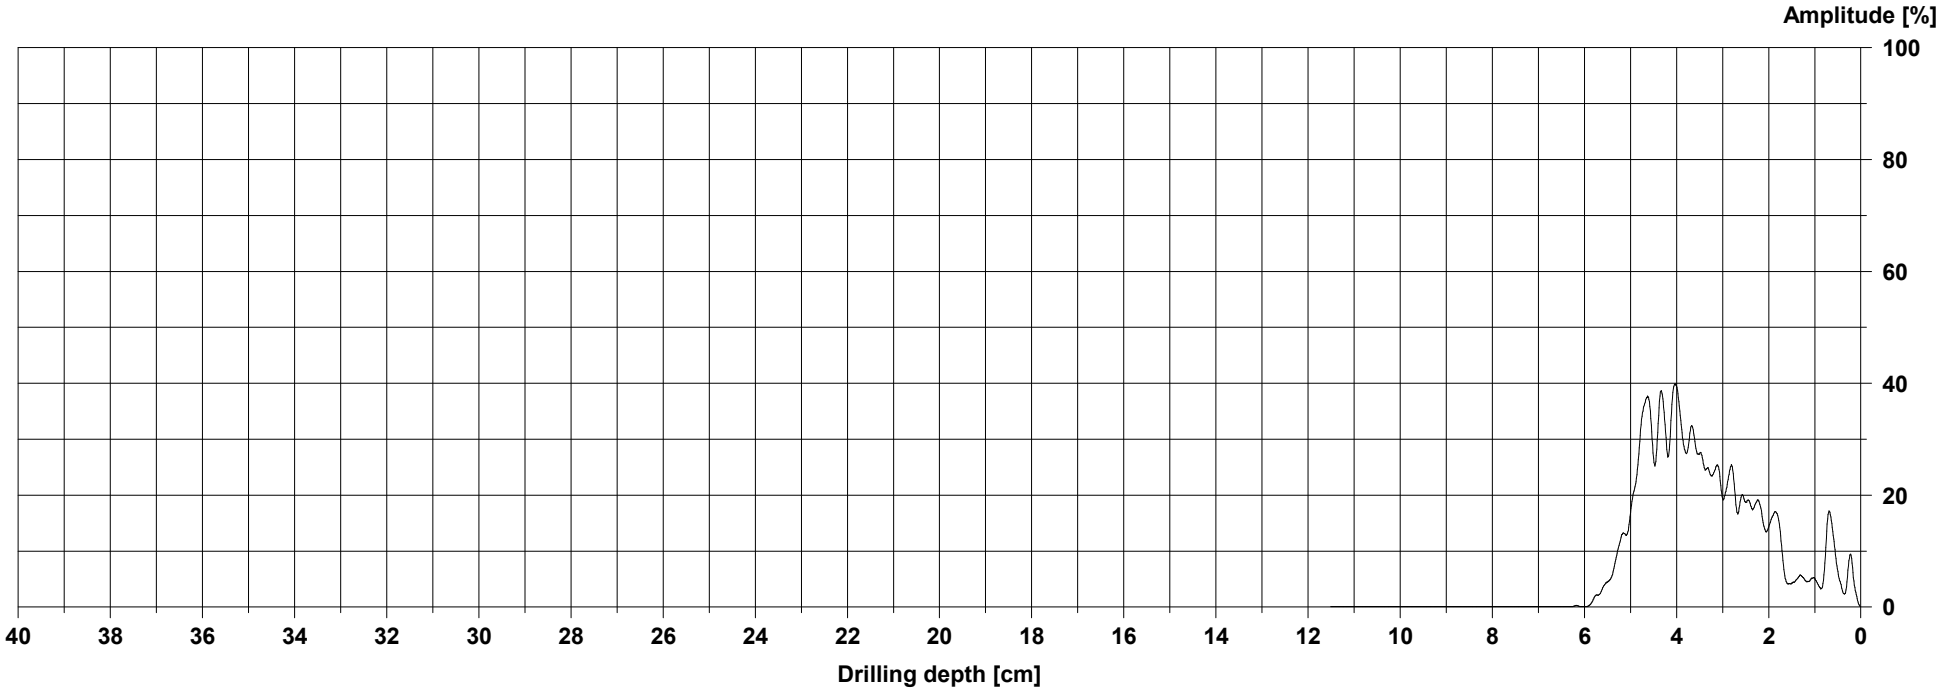

Assessment


Comment







ArcGIS Web Map

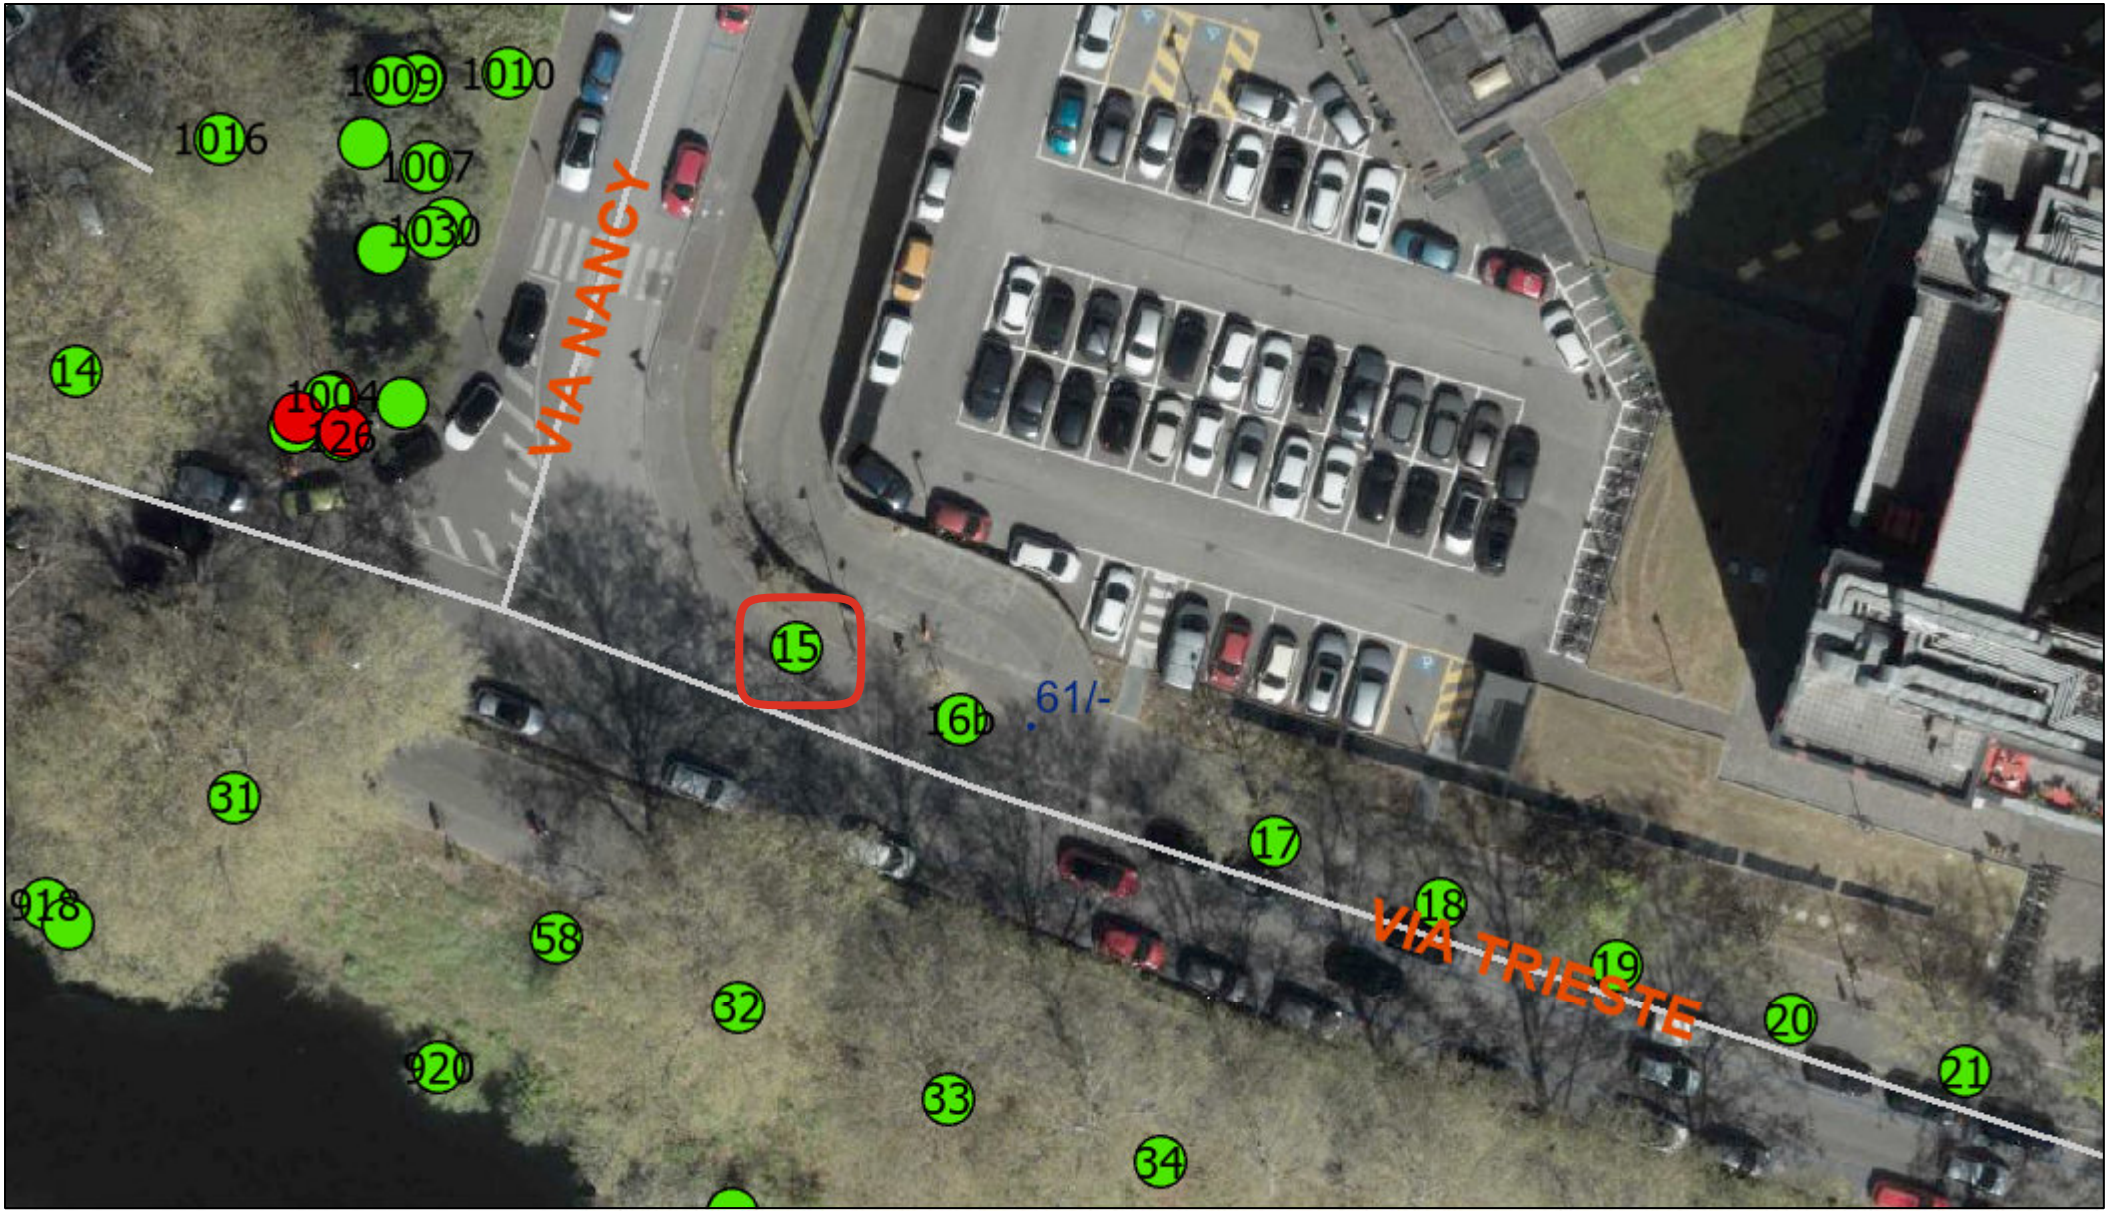

11/09/2026, 13:35:50

1:424

0 0,0035 0,007 0,014 mi

0 0,005 0,01 0,02 km

Web AppBuilder for ArcGIS
