**Scheda pianta 2.151 - Monumento Ai Caduti - Via Curzola** **2 - Quartiere 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nr. albero** | 3 | **Cartellino** | 9990228/3 |
| **Coordinate** | 724.994,43 / 5.034.081,75 | | |
| **Proprietà** | Area di proprietà | | |






| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tassonomia** | Pinus pinea (Pino domestico) | | |
| **Sito di crescita** | Prato o giardini | | |
| | | **Fase fisiologica** | adulto |
| **Accessibilità** | | | |
| **Bersaglio** | Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata | | |
| **Altezza** | 14,00 m | **Ø chioma** | 4,00 m |
| **Altezza castello** | 3,00 m | | |
| **Circ. tronco** | 97 cm | **Ø tronco** | 31,00 cm |
| **Stato pianta** | Pianta morta | | |
| **Modalità età** | non rilevato | **Età pianta calcolata** | |
| **Data abbattimento** | | **Data rimozione ceppaia** | |
| **Note** | Presenza di branche spezzate e pendenti; pianta a rischio di improvvisi cedimenti strutturali. L'abbattimento si rende necessario per eliminare il pericolo imminente per l'incolumità pubblica e privata, salvaguardando le infrastrutture e le vie di transito adiacenti alla pianta stessa. | | |

**Scheda pianta 2.168 - Via Bramante - Buonarroti** **2 - Quartiere 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nr. albero** | 1004 | **Cartellino** | |
| **Coordinate** | 725.280,95 / 5.034.833,08 | | |
| **Proprietà** | Area di proprietà | | |






| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tassonomia** | Malus × floribunda (Melo giapponese da fiore) | | |
| **Sito di crescita** | Prato o giardini | | |
| | | **Fase fisiologica** | giovane |
| **Accessibilità** | | | |
| **Bersaglio** | Area di passaggio con frequentazione limitata a certe ore della giornata. Panchina in piazza non frequentata | | |
| **Altezza** | 4,00 m | **Ø chioma** | 2,50 m |
| **Altezza castello** | 2,00 m | | |
| **Circ. tronco** | 19 cm | **Ø tronco** | 6,00 cm |
| **Stato pianta** | Pianta morta | | |
| **Modalità età** | non rilevato | **Età pianta calcolata** | |
| **Data abbattimento** | | **Data rimozione ceppaia** | |
| **Note** | | | |

**Scheda pianta 1.117 - Parco Treves de Bonfili** **1 - Quartiere 1**

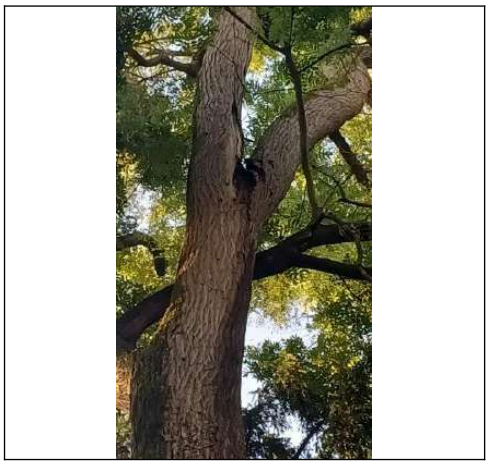
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nr. albero** | 11 | **Cartellino** | 9991589/11 |
| **Coordinate** | 725.826,95 / 5.031.710,61 | | |
| **Proprietà** | Area di proprietà | | |






| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tassonomia** | Styphnolobium japonicum (Sofora del Giappone) | | |
| **Sito di crescita** | Prato o giardini | | |
| | | **Fase fisiologica** | adulto |
| **Accessibilità** | Limitazioni da recinzioni | | |
| **Bersaglio** | Punti di ritrovo e di aggregazione occasionali | | |
| **Altezza** | 30,00 m | **Ø chioma** | 15,00 m |
| **Altezza castello** | 8,00 m | | |
| **Circ. tronco** | 283 cm | **Ø tronco** | 90,00 cm |
| **Stato pianta** | Pianta viva | | |
| **Modalità età** | non rilevato | **Età pianta calcolata** | |
| **Data abbattimento** | | **Data rimozione ceppaia** | |
| **Note** | Rottura del ramo causa evento meteo ottobre 2024<br><br>Riscontrata scosciatura in aumento (04/09/2026), in seguito agli eventi meteo accaduti la settimana precedente | | |

Generata il 10/09/2026

| **VSA - Data: 10/09/2026** | | **CPC: D - Gravità estrema** |
|---|---|---|
| **Cartellino** | 9991589/11 | **Stato cartellino** Cartellino presente |
| **Rilevatore** | Giulia Breda |  |
| **Tipo** | Ricontrollo | |
| **Fase fisiologica** | adulto | |
| **Sito di crescita** | Prato o giardini | |
| **Altezza** | 30,00 m | |
| **Ø chioma** | 15,00 m | |
| **Altezza castello** | 8,00 m | |
| **Ø tronco** | 90,00 cm | |
| **Circ. tronco** | 283 cm | |
| **Bersaglio** | Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco | |

**Note** Soggetto posto a margine di ripida scarpata, già interessato da sbrancature, presenta in corrispondenza di grosse sezioni, fori di picchio e carpofori di Inonotus. Aumento del cretto in conseguenza evento meteo, rischio non più sostenibile. Target cavallerizza area di sosta frequente.

**Anomalie**: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

| | |
|---|---|
| **Radici** | Radici affioranti decorticate (3) |
| **Colletto** | Depressioni e concavità (3), Contrafforte lesionato (3) |
| **Fusto** | Fusto inclinato (3), Fusto arcuato - sciabolato (2) |
| **Castello** | Cavità esposta (3), Carie (2) |
| **Branche** | Cavitá (3), Rottura (3) |
| **Chioma** | Dissecamento (2), Asimmetria per competizione laterale (2), Posizione asimmetria Ovest (2), Limitata da concorrenza (2), Asimmetrica (2) |
| **Agenti patogeni** | Inonotus hispidus (2) |
| **Interferenze** | Ostacoli per competizione con altre piante (1) |

**Lavori proposti**

| Tipo lavoro | Impresa | Data fine prevista |
|---|---|---|
| ABB - Abbattimento pianta | | 26/09/2026 |

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
10.09.2026 15:29:57
GMT+01:00
